



SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Reportes Gerenciales al 30 de Noviembre

Sistema Integral de Gestión por Resultados

Contenido

REPORTES GERENCIALES	1
1. Resumen General Estado GADT	5
1.1 Ejecución Financiera 2018 – Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija	5
1.1.1 Ejecución Presupuestaria de la GADT Vs. Ejecución Presupuestaria de Proyectos de Inversión	6
1.1.2 Ejecución Presupuestaria por principales ingresos al 2018 – Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija	6
2. Órganos del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija	7
2.1 Ejecución Financiera según Órganos del Gobierno Autónomo de Tarija	7
2.2 Ejecución Financiera	7
3. Ejecución por Tipo de Operación al 30 de Noviembre de 2018	8
3.1 Ejecución Física	8
3.1.1 Programas No Recurrentes	8
3.1.2 Programas Recurrentes	9
3.1.3 Operaciones de Funcionamiento	10
3.2 Ejecución Financiera	10
3.2.1 Programas No Recurrentes	10
3.2.2 Programas Recurrentes	11
3.2.3 Operaciones de Funcionamiento	12
4. Ejecución de Proyectos de Inversión Pública – Acumulada	13
4.1 Ejecución Física de Proyectos de Inversión	13
4.2 Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión	14
4.3 Ejecución Física acumulada de Proyectos de Inversión Directa	14
4.4 Ejecución Financiera acumulada de Proyectos de Inversión Directa	15
4.5 Ejecución Física Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada	16
4.6 Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada	17
5. Análisis de Desempeño por Dirección Administrativa	19
5.1 Análisis de Ejecución Financiera por Dirección Administrativa	19
6 Cumplimiento de modelo de Gestión – Agenda del Bienestar	22
6.1 Cumplimiento de modelo de Gestión – Agenda del Bienestar y áreas de intervención	23
7.- Ejecución financiera por Sectores de Inversión	25
7.2 Ejecución Presupuestaria por sectores de Inversión publica	25

REPORTES GERENCIALES

La Gobernación del Departamento de Tarija implementó el Sistema Integrado de Gestión por Resultados (SIGRE), que permite la administración y toma de decisión oportuna a partir de la información fiable que brinda el nivel operativo de la ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual ejecutado por las unidades organizacionales del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, esto con la finalidad de promover una nueva cultura institucional orientada a resultados, y la transparencia institucional.

El presente Reporte Gerencial cuenta con información de las 25 Direcciones Administrativas registradas en el SIGEP correspondiente a proyectos, programas y operaciones de funcionamiento del POA 2018 de la Gobernación del Departamento de Tarija; contando el SIGRE hasta el 30 de Noviembre del 2018 con el siguiente registro:

Operación	Cantidad
Proyectos de Inversión	196
Programas	107
Operaciones de Funcionamiento	23
TOTAL	326

A partir de estos datos se presenta Reportes de Ejecución física y financiera de gestión; como así también acumulada en el caso de proyectos de inversión directa y delegada al 30 de Noviembre del 2018.

De acuerdo a los Reporte Generales se puede observar la siguiente información para la toma de decisiones:

1. En el **gráfico N°1 y 2** observamos: La Gobernación del Departamento de Tarija al 30 de Noviembre del 2018 cuenta con una ejecución financiera de **57,41%** con un presupuesto vigente de Bs. 1.875.847.062,28 y una ejecución de Bs. 1.076.692.351,91. Mientras que el **grafico N° 3** muestra la relación entre la ejecución presupuestaria de la GADT de Bs. 1.076.692.351,91 con la ejecución financiera de inversión pública que asciende a Bs. 408.931.450,22 representando el 37,98% de participación de la ejecución financiera.
2. En el **gráfico N°4** se presenta la ejecución presupuestaria por principales ingresos: Regalías Hidrocarburíferas con un porcentaje de desembolso del

91,83%, IDH 77.97%, IEHD 107,87%, ORE 139.16% y otras transferencia TGN 42,61%. Esto significa que del presupuesto total programado de Bs. 1.875.487.062 la gobernación hasta el 30 de Noviembre ha percibido Bs. 1.267.384.550,00 haciendo un porcentaje del 67.58% de los ingresos efectivamente percibidos.

3. En el **Gráfico N° 5**, muestra la ejecución Financiera de los órganos del Gobierno Autónomo donde observamos que el Órgano Ejecutivo tiene un porcentaje de ejecución del 57,14%, el Órgano Legislativo del 74,41%, haciendo un total del 57,41% de ejecución financiera en la GADT.
4. En el **gráfico N°6**, con respecto a la Ejecución Presupuestaria de las unidades ejecutoras del órgano ejecutivo los porcentajes son los siguientes: Administración Central representada por las 13 Secretarías Departamentales tienen una ejecución financiera del 48,18%, las Unidades Desconcentradas un 55,33% y las Sub Gobernaciones un 58,93%.
5. En el **gráfico N°7 y 8**, advertimos que de 42 Programas No Recurrentes inscritos, 12 se encuentran en el rango de ejecución física de 0 a 25% representando un 28,57%, 8 en el rango de 26 a 50% con un 19,05%, 13 programas de 51 a 75% con un porcentaje de 30,95% y 9 programa en el rango 76 a 100% con el 21,43%.
6. En el **gráfico 9 y 10**, muestra los 65 programas recurrentes con los siguientes datos respecto a la ejecución física: 20 programas se encuentran situados en el rango 0 a 25% representando el 31%, 4 en el rango 26 a 50% con el 6%, 14 programas en el rango 51 a 75% con un porcentaje del 22% y 27 en el rango 76 a 100% con un porcentaje del 42%.
7. El **grafico N° 11** nos presenta la ejecución física de las operaciones de funcionamiento donde 1 se encuentra en el rango de 0 a 25%, 2 tienen una ejecución física en el rango de 25 a 50%, 13 en el rango de 51 a 75% y 7 en el rango de 76 a 100%.
8. Los **gráficos 12 y 13** muestran las ejecuciones presupuestarias de los 42 Programas No Recurrentes donde 18 programas se encuentra con muy baja ejecución financiera situada en el rango de 0 a 25 % representando el 42,9%, 7 programas se localiza con una ejecución baja en el rango 26 a 50% con el 16,7% y 10 programas en el rango de 51 a 75% con un porcentaje del 23,8% y 7 programa en el rango del 76 a 100% con un porcentaje de 16,7%.
9. Los **gráficos 14 y 15** muestran las ejecuciones presupuestarias de los 65 Programas Recurrentes donde 22 programas se encuentra con muy baja

ejecución financiera situada en el rango de 0 a 25 % con el 33,8%, 6 programas se localiza con una ejecución baja en el rango 26 a 50 % con un porcentaje del 9,2%, 15 programa en el rango de 51 a 75% en mediana ejecución con el 23,1% y 22 programa con ejecución a tiempo (76 a 100%) con el 33,8%.

10. Los **gráficos 16 y 17** muestran las ejecuciones presupuestarias de las 23 Operaciones de Funcionamiento donde 2 Direcciones Administrativas se encuentran con muy baja ejecución financiera situada en el rango de 0 a 25% y 3 con ejecución baja en el rango 26 a 50% y 15 se ubican en el rango de 51 a 75% y 3 operación de funcionamiento en el rango 76 a 100%.
11. El **gráfico N° 18** presenta las ejecución físicas acumulada de los 196 proyectos inscritos de inversión pública, donde 48 proyectos que representa el 24,49% se encuentran con muy baja ejecución, 29 proyectos con un 14,80% con baja ejecución, 35 proyectos con el 17,86% con mediana ejecución y 84 proyectos con el 42,86% se encuentran con alta ejecución física.
12. El **gráfico 19:** Con respecto a la ejecución financiera acumulada de los 196 proyectos de inversión pública, 53 proyectos con el 27,04% tienen una muy baja ejecución, 51 proyectos con el 26,02% se encuentran en el rango de ejecución baja, mientras que 47 proyectos con el 23,98% tienen una ejecución mediana y solo 45 proyectos con el 22,96% tienen una alta ejecución.
13. El **grafico N° 20 y 21** nos muestra la ejecución física de los 60 proyectos de inversión directa, observando que 11 proyectos se encuentran con muy baja ejecución (rango de 0% a 25%) con el 18,33%, 16 proyectos con baja ejecución (rango 26% a 50%) representando el 26,67%, 10 proyectos con mediana ejecución (rango 51% a 75%) con el 16,67%, 23 proyectos con alta ejecución (rango 76% a 100%) con el 38,33%.
14. El **grafico N° 22 y 23** representa la ejecución financiera acumulada de los 60 proyectos de inversión directa donde 11 proyectos tienen muy baja ejecución representando el 18,33%, 27 proyectos con baja ejecución con el 45%, 14 proyectos con mediana ejecución con el 23,33% y 8 proyectos con alta ejecución representando el 13,33%.
15. En el **gráfico N° 24 y 25**, muestra la ejecución física de los 136 proyectos de inversión delegada: 37 proyectos se encuentran con muy baja ejecución con el 27,21%, 13 proyectos con baja ejecución representando el 9,56%, 25 proyectos se encuentran con mediana ejecución con el 18,38% y 61 proyectos tiene una ejecución alta con el 44,85%. En el **gráfico 27** se

observa la ejecución financiera donde 42 proyectos tienen muy baja ejecución financiera con el 30,9%, 24 proyectos se sitúan en el rango de baja ejecución con el 17,6%, 33 proyectos en mediana ejecución con el 24,3% y solo 37 proyectos cuentan con una ejecución alta representando el 27,2%.

16. En el **gráfico N°28**, con respecto a la Ejecución financiera de las Direcciones Administrativas, se puede observar que la Asamblea Departamental tiene la mayor ejecución con el 74,41, Servicio Departamental de Salud con el 74,16% y la Sub Gobernación de Uriondo con el 69,68% . Mientras el **gráfico N° 28.1** muestra la ejecución financiera de los proyectos de inversión con los siguientes porcentajes: la Sub Gobernación de Uriondo con el 70,74%, le sigue la Sub Gobernación de O'Connor con el 63,62 y el SEDAG con el 63,28%. El **Grafico N° 28.2** muestra la ejecución financiera de los programas donde la Sub Gobernación de Padcaya tiene el mayor porcentaje con 85,46 %, la Sub Gobernación de Yunchará con el 82,44%.el Servicio Departamental de Salud con el 74,24%.
17. En el **gráfico N° 29**, presentamos una evaluación de la Agenda del Bienestar con respecto a la ejecución presupuestaria, donde se observa que el Plan Vida cuenta con el 64,23%, Plan Oportunidad el 54,44%, el Plan Transparencia con el 58,93%, y el Plan Alegría con 51,77% y el Plan Dignidad con un 24,72%.
18. En el **gráfico N° 31**, muestra la ejecución física acumulada de la Agenda del Bienestar donde los datos nos muestran los siguientes resultados: Plan Vida con un porcentaje de ejecución del 59,47%, el Plan Dignidad con el 51,58%, Plan Oportunidad con el 57,38%, Plan Alegría el 57,39% y el Plan Transparencia con un 57,61%.
19. El **grafico N° 32** muestra el comportamiento de los sectores económicos con respecto a la ejecución presupuestaria de inversión pública, donde se puede observar que los sectores con mayor movimiento presupuestario son: el Sector Transporte tiene un presupuesto vigente de Bs. 319.438.247,15 y una ejecución de Bs. 201.197.547,87, seguido del Sector Agropecuario con un presupuesto de Bs. 139.964.960,34 con una ejecución de Bs. 68.540.199,24 y el Sector Salud con un presupuesto de Bs. 99.698.442,90 y una ejecución de Bs. 48.625.221,14.

1. Resumen General Estado GADT

1.1 Ejecución Financiera 2018 – Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija

Gráfico 1: Ejecución del Presupuesto al 30 de Noviembre GADT



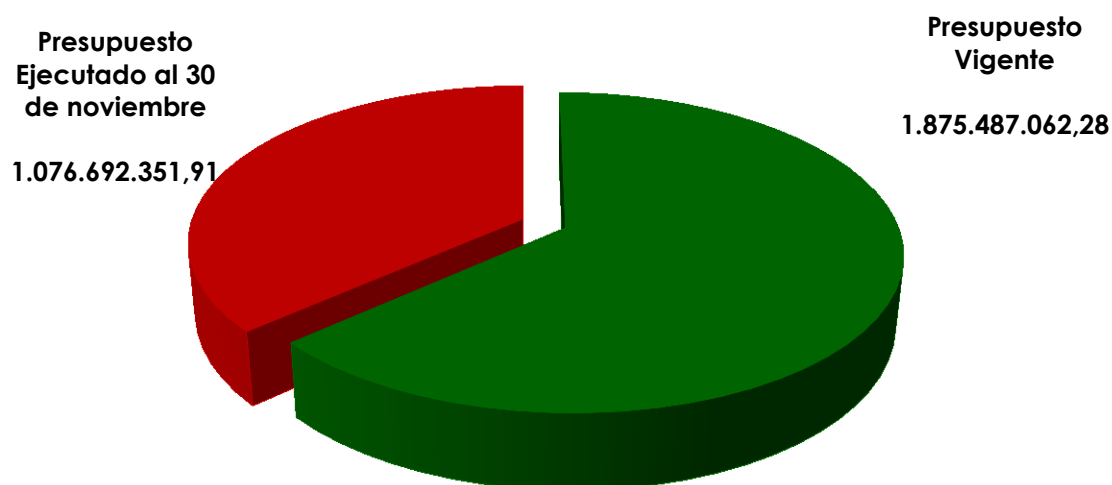


Gráfico 2 Ejecución del Presupuesto al 30 de Noviembre GADT

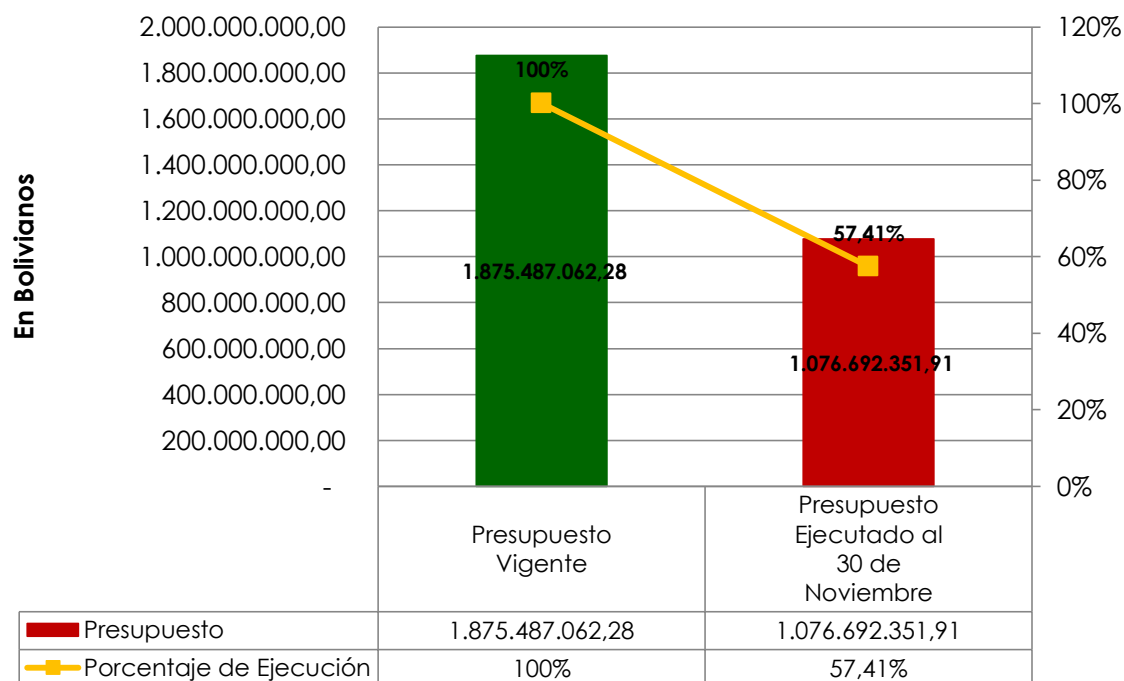


1.1.1 Ejecución Presupuestaria de la GADT Vs. Ejecución Presupuestaria de Proyectos de Inversión

Gráfico 3 Ejecución del Presupuesto al 30 de Noviembre GADT

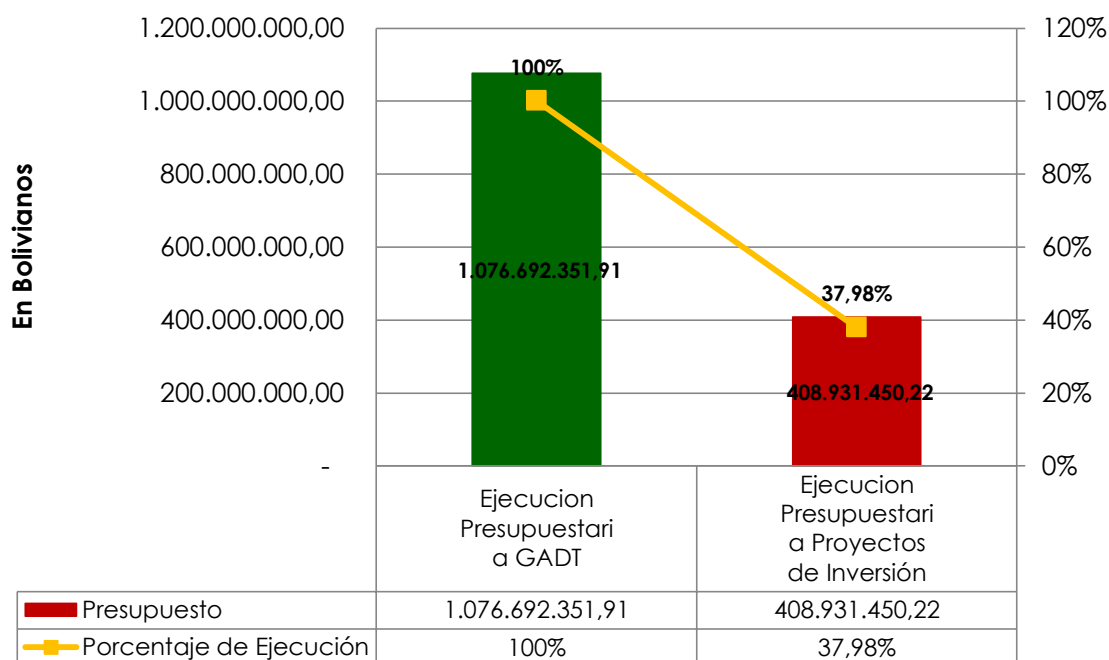

1.1.2 Ejecución Presupuestaria por principales ingresos al 2018 – Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija


Gráfico 4: Ejecución Presupuestaria por Principales Ingresos al 30 de Noviembre de 2018

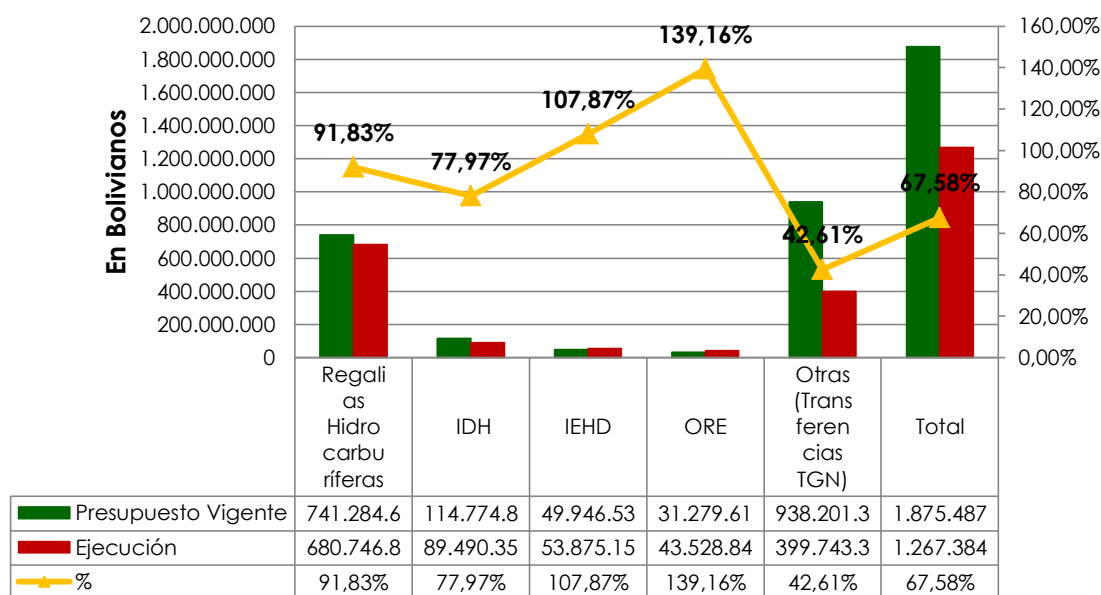

2. Órganos del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija


2.1 Ejecución Financiera según Órganos del Gobierno Autónomo de Tarija

Gráfico 5: Ejecución Financiera Según Órganos del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija

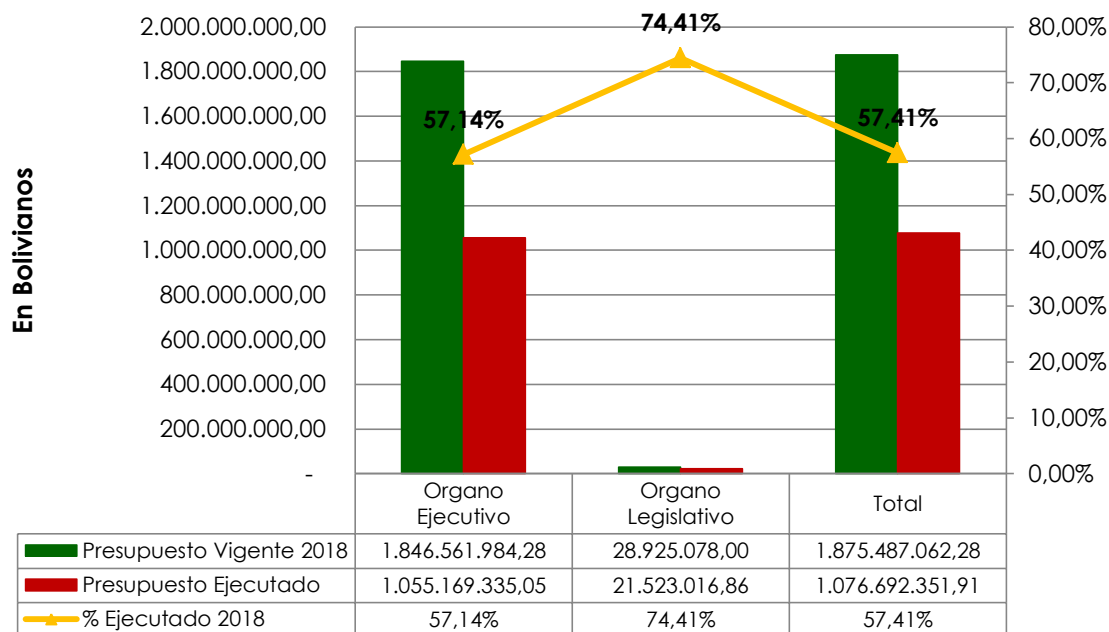

2.2 Ejecución Financiera

Gráfico 6: Ejecución Financiera según Unidad Ejecutora del Órgano Ejecutivo Gobierno Autónomo Departamental de Tarija

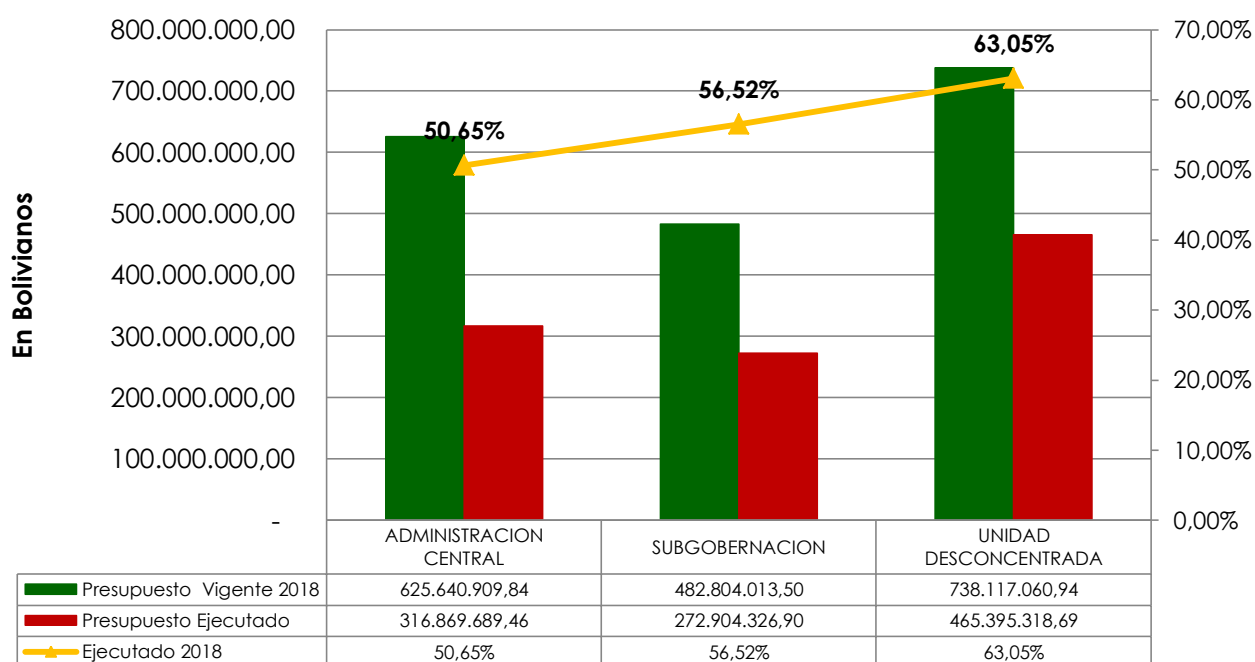

3. Ejecución por Tipo de Operación al 30 de Noviembre de 2018

3.1 Ejecución Física

3.1.1 Programas No Recurrentes

Gráfico 7: Ejecución Física de Programas No Recurrentes al 30 de Noviembre 2018


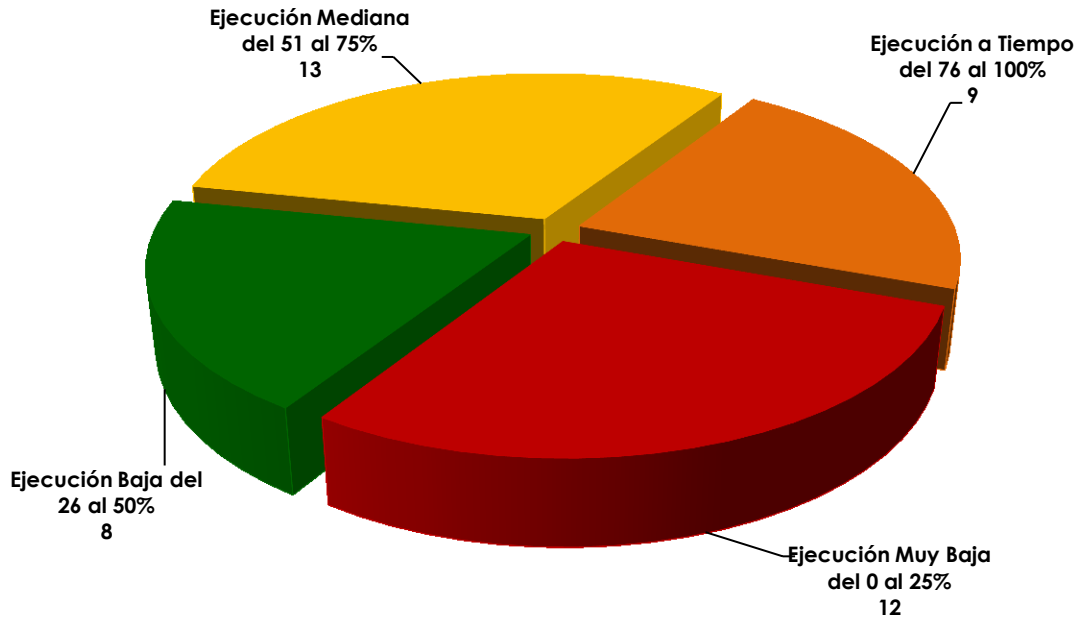


Gráfico 8: Ejecución Física de Programas No Recurrentes al 30 de Noviembre 2018

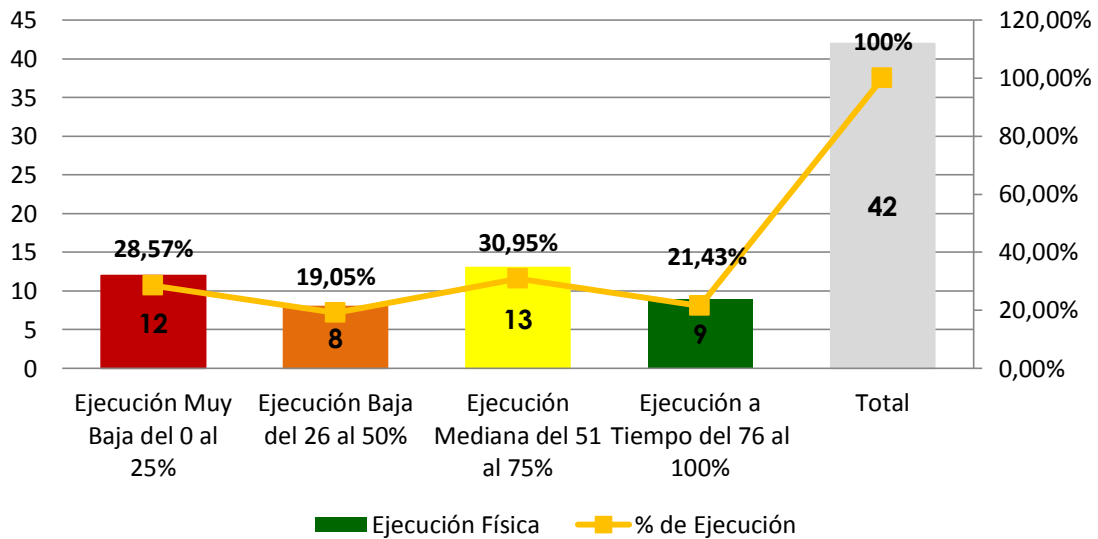

[*Ver anexo1*](#)

3.1.2 Programas Recurrentes

Gráfico 9: Ejecución Física de Programas Recurrentes al 30 de Noviembre de 2018


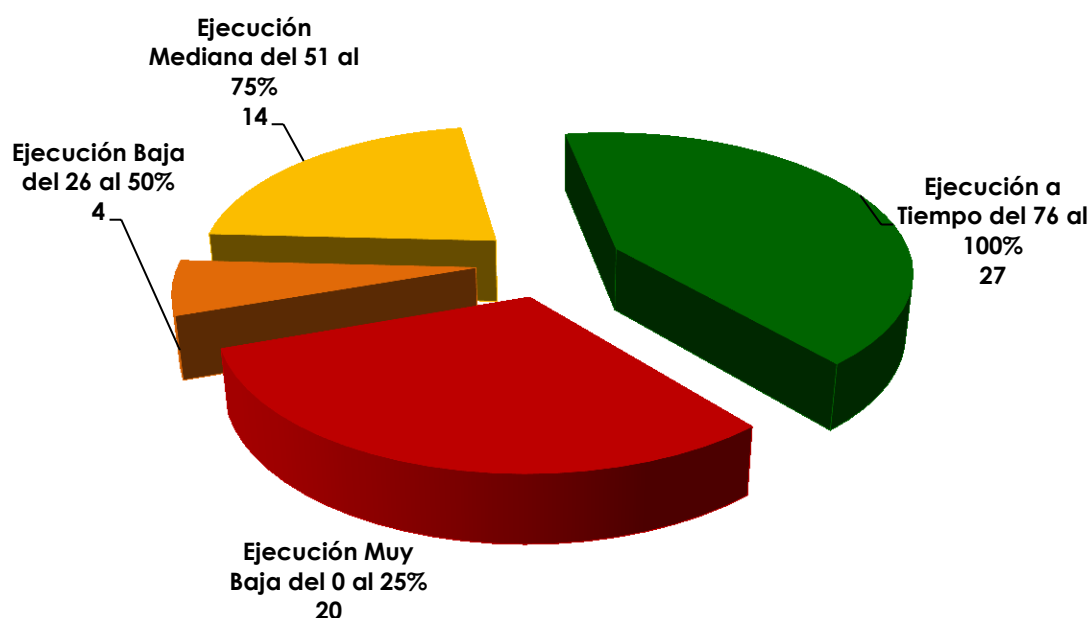



Gráfico 10: Ejecución Física de Programas Recurrentes al 30 de Noviembre 2018

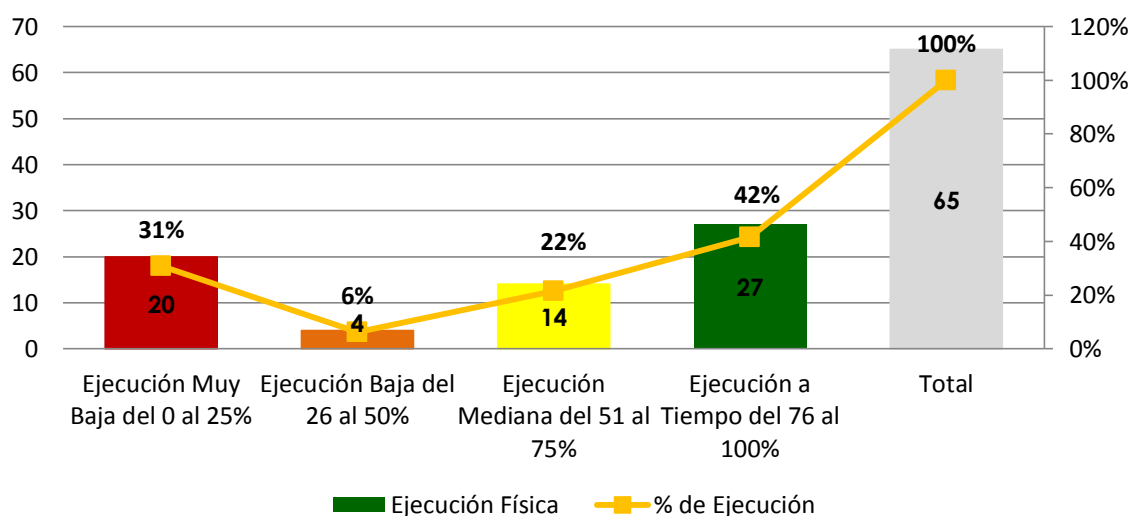

[*Ver Anexo2*](#)

3.1.3 Operaciones de Funcionamiento

Gráfico 11: Ejecución Física de Operaciones de Funcionamiento al 30 de Noviembre 2018

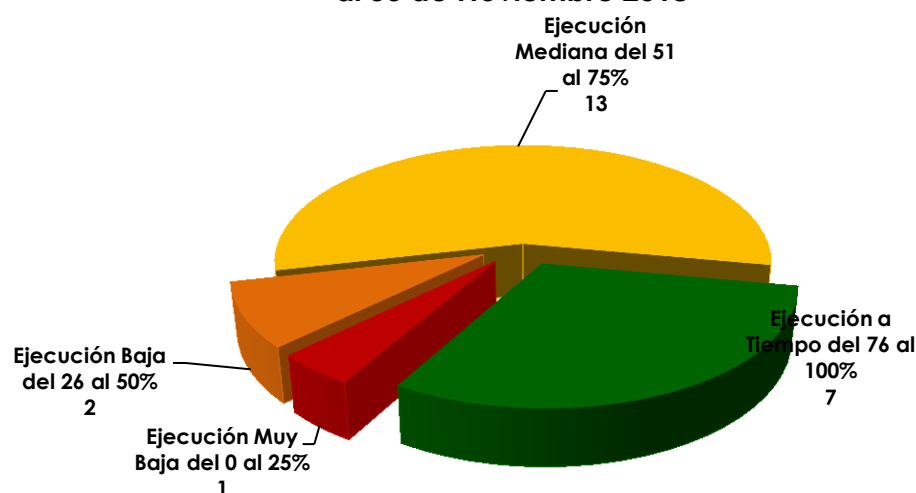


[*Ver Anexo3*](#)


3.2 Ejecución Financiera

3.2.1 Programas No Recurrentes

Gráfico 12: Ejecución Financiera de Programas No Recurrentes al 30 de Noviembre de 2018

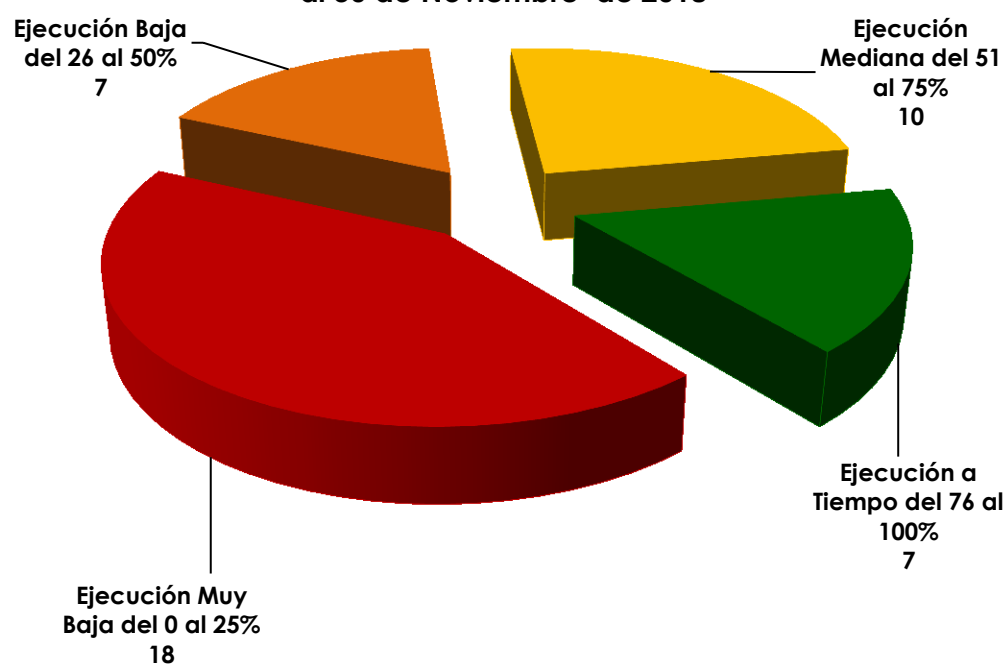

**Gráfico 13: Ejecución Financiera de Programas No Recurrentes
al 30 de Noviembre 2018**

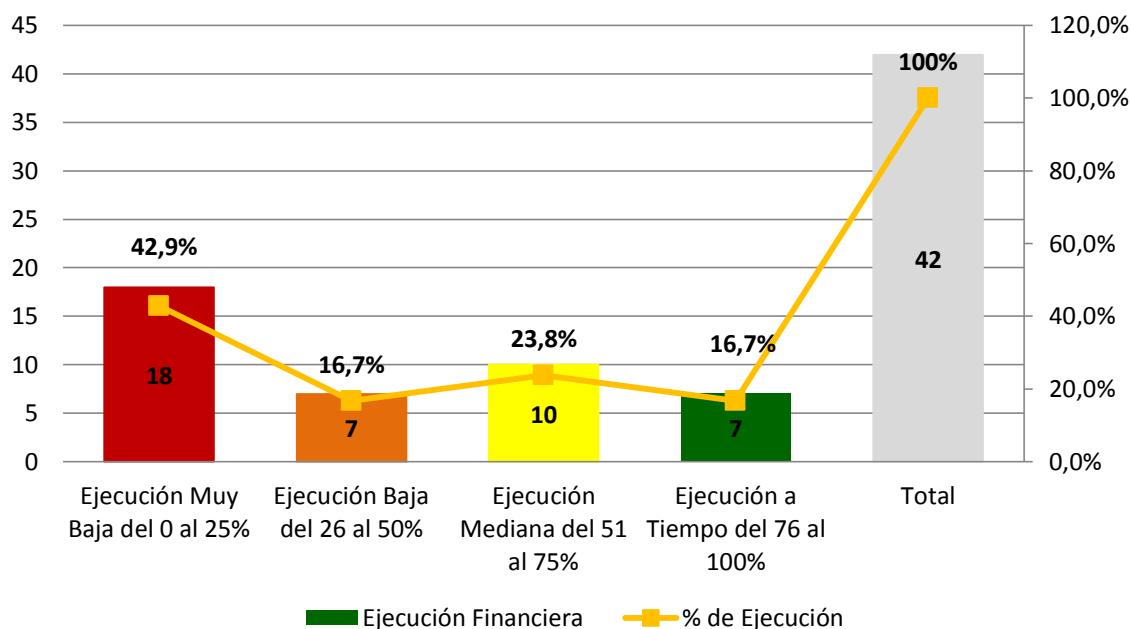

[*Ver Anexo4*](#)

3.2.2 Programas Recurrentes

**Gráfico 14: Ejecución Financiera de Programas Recurrentes
al 30 de Noviembre 2018**


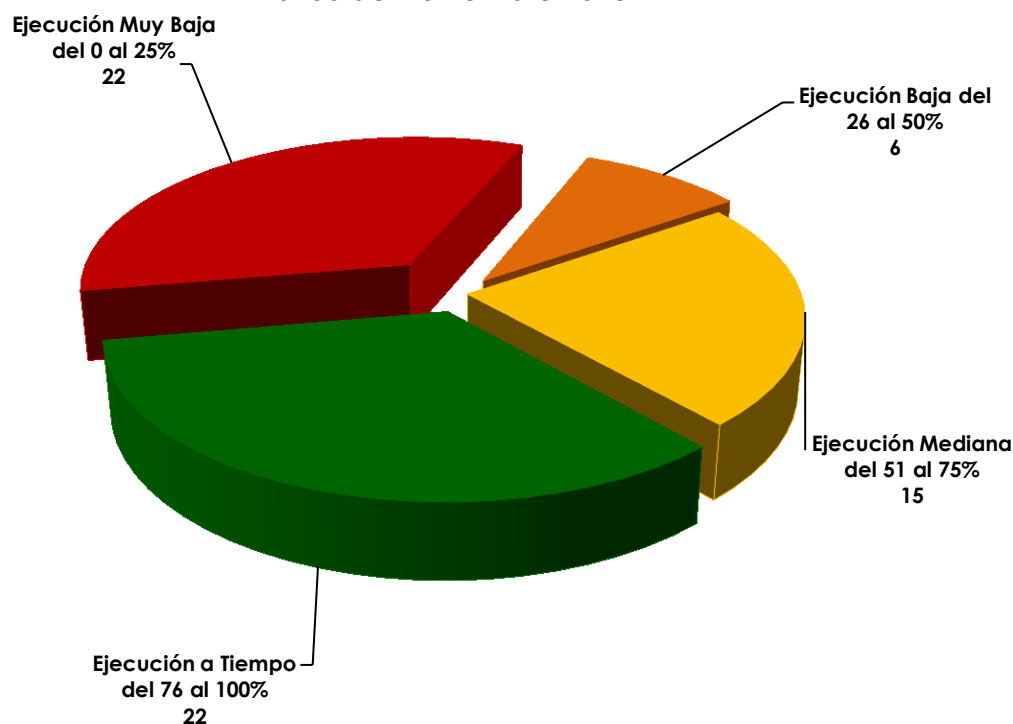


Gráfico 15: Ejecución Financiera de Programas Recurrentes al 30 de Septiembre de 2018

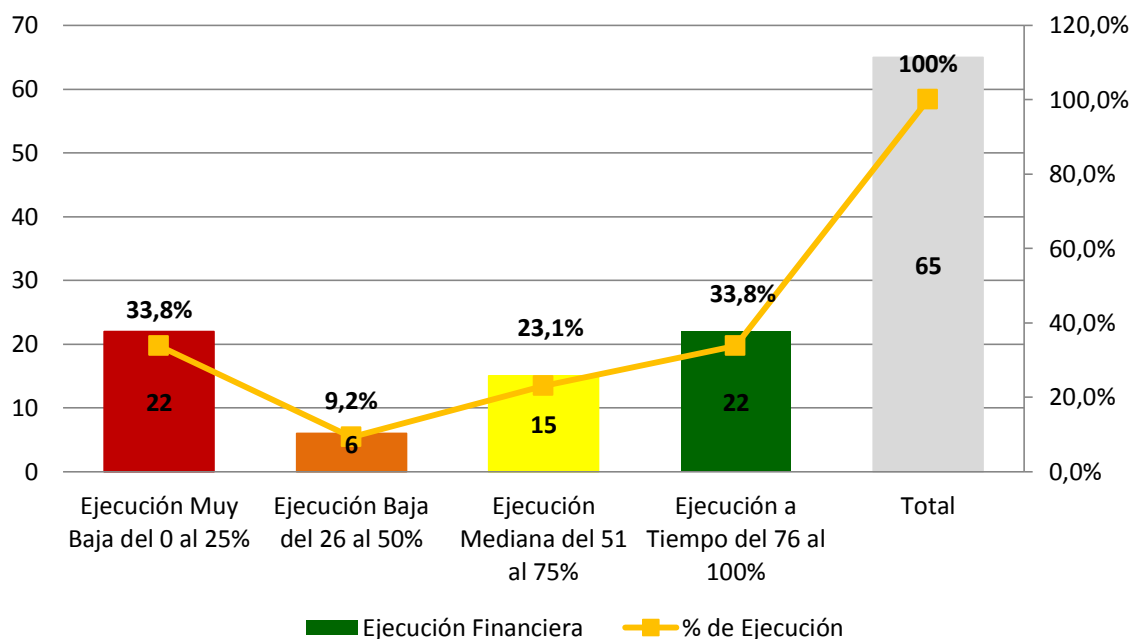

[*Ver Anexo5*](#)

3.2.3 Operaciones de Funcionamiento

Gráfico 16: Ejecución Financiera de Operaciones de Funcionamiento al 30 de Noviembre de 2018


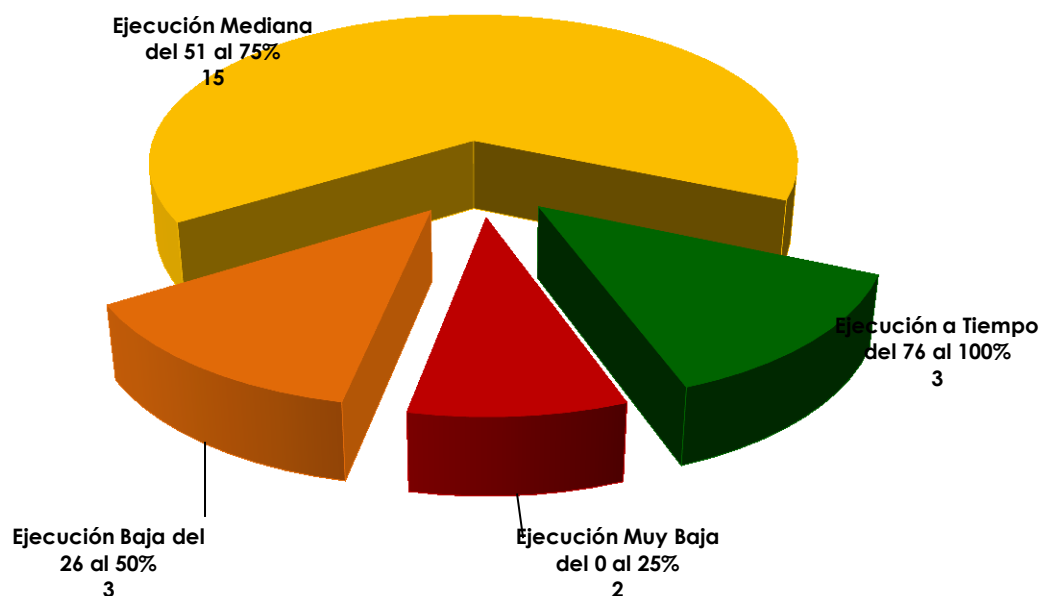


Gráfico 17: Ejecución Financiera de Operaciones de Funcionamiento al 30 de Noviembre de 2018

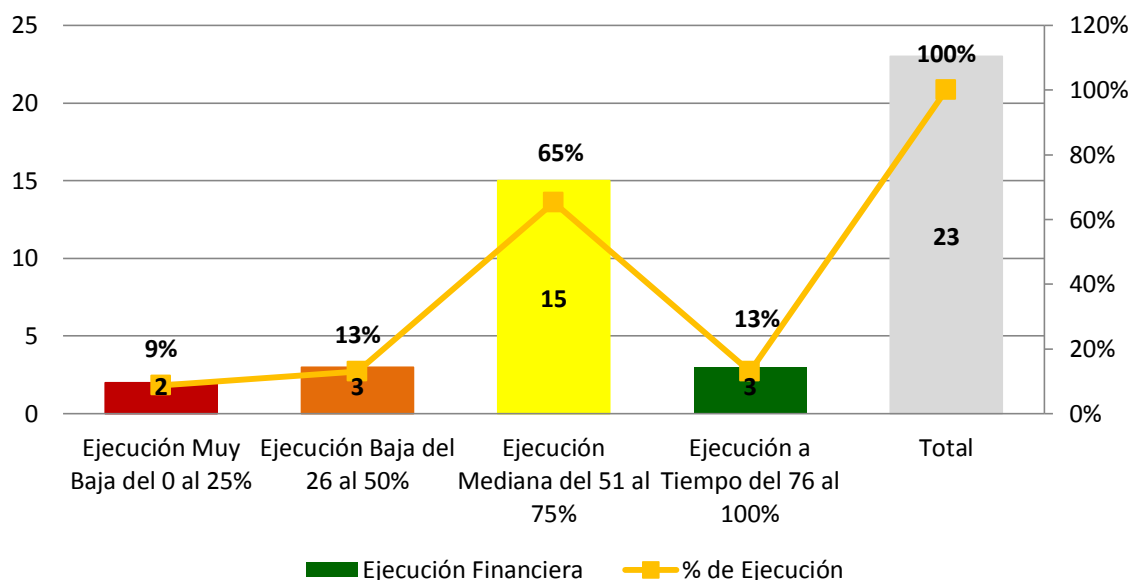


[*Ver Anexo6*](#)

4. Ejecución de Proyectos de Inversión Pública – Acumulada


4.1 Ejecución Física de Proyectos de Inversión

Gráfico 18: Ejecución Física Acumulada de Proyectos de Inversión al 30 de Noviembre de 2018

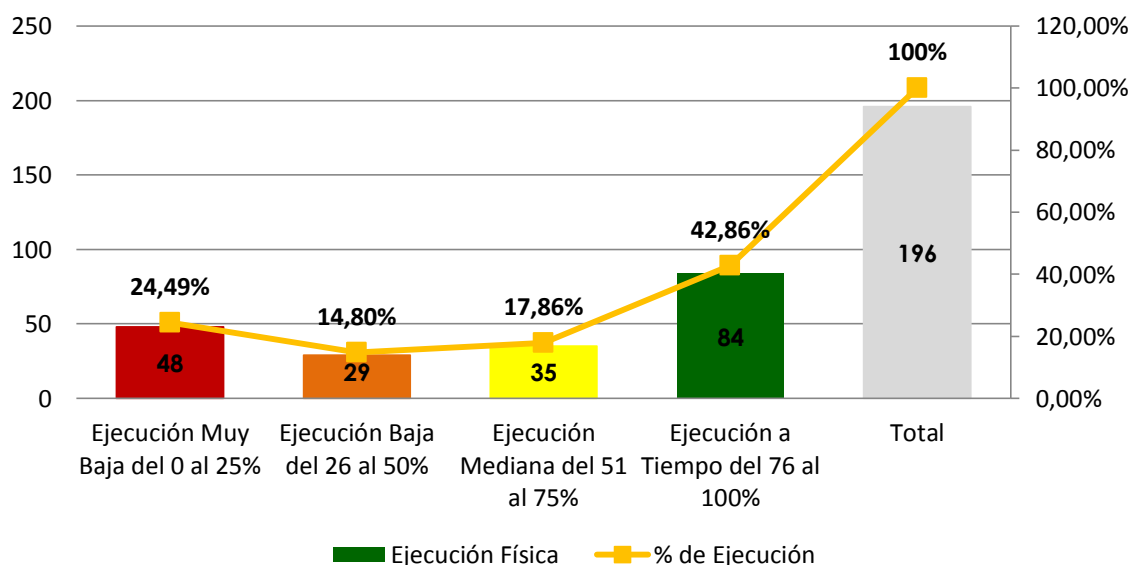

4.2 Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión

Gráfico 19: Ejecución Financiera de Proyectos de Inversión

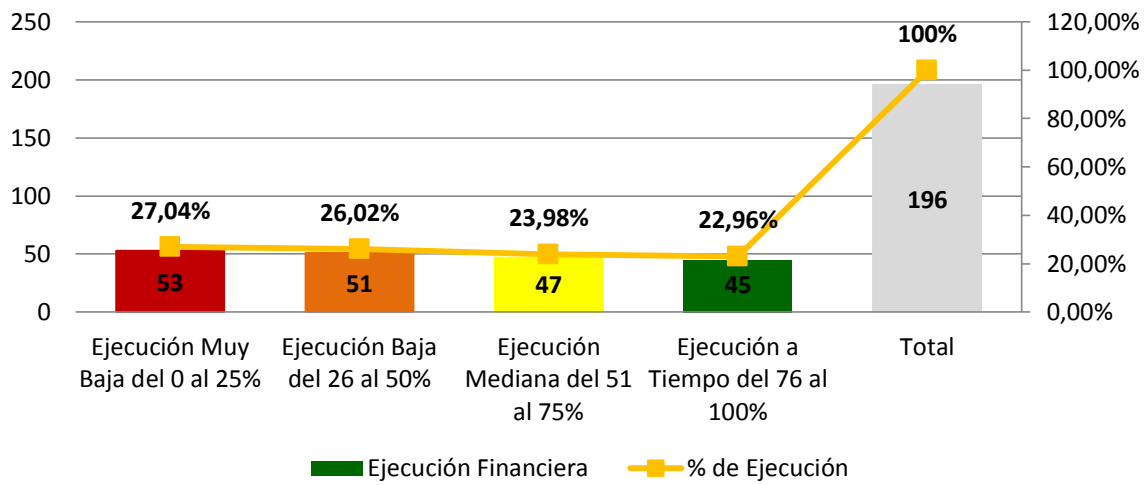

4.3 Ejecución Física acumulada de Proyectos de Inversión Directa

Gráfico 20: Ejecución Física Acumulada de Proyectos De Inversión Directa al 30 de Noviembre 2018


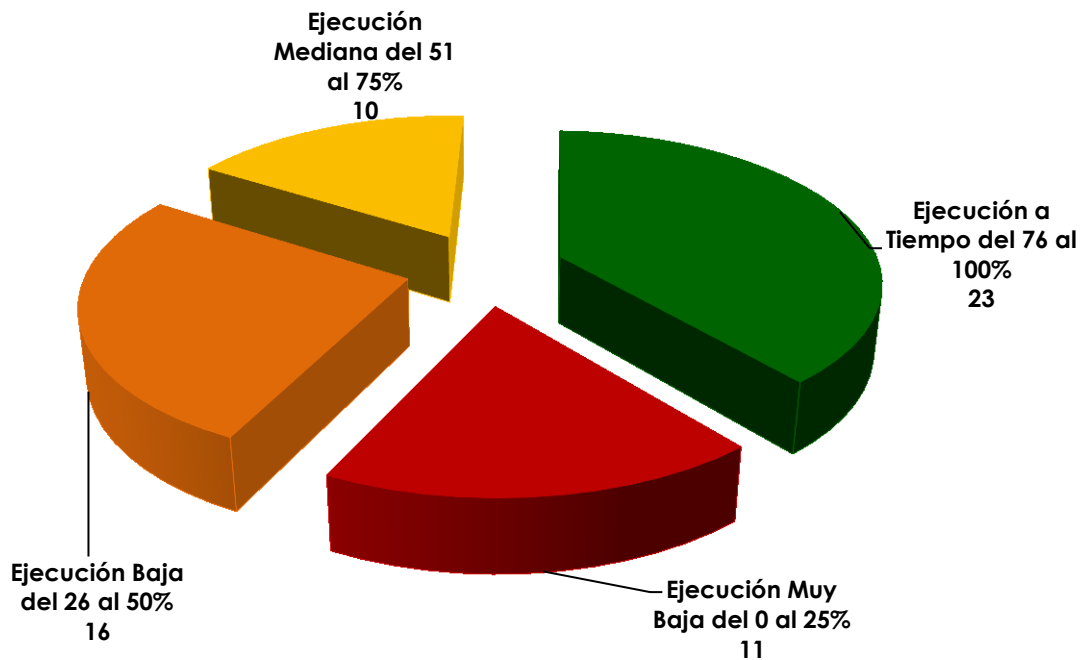


Gráfico 21: Ejecución Física acumulada de Proyectos de Inversión Directa

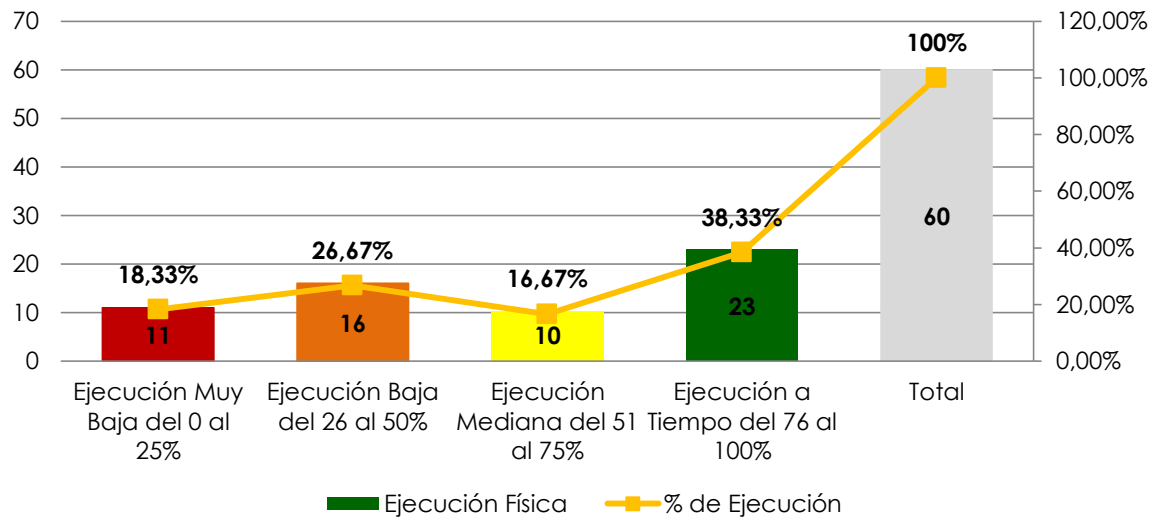

[*Ver Anexo7*](#)

4.4 Ejecución Financiera acumulada de Proyectos de Inversión Directa

Gráfico 22: Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos De Inversión Directa al 30 de Noviembre 2018


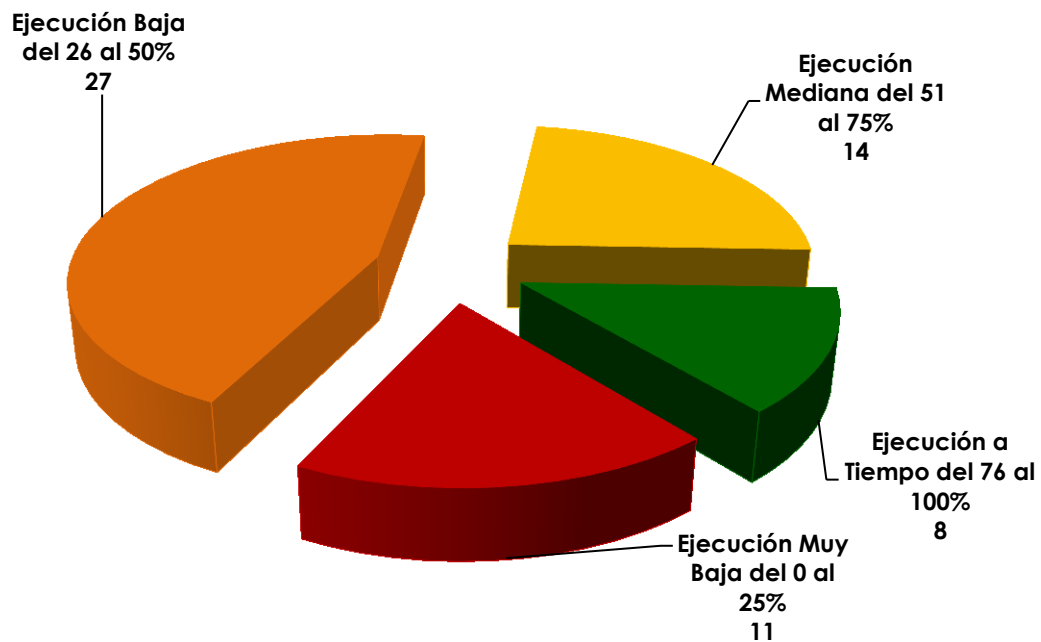


Gráfico 23: Ejecución Financiera acumulada de Proyectos de Inversión Directa

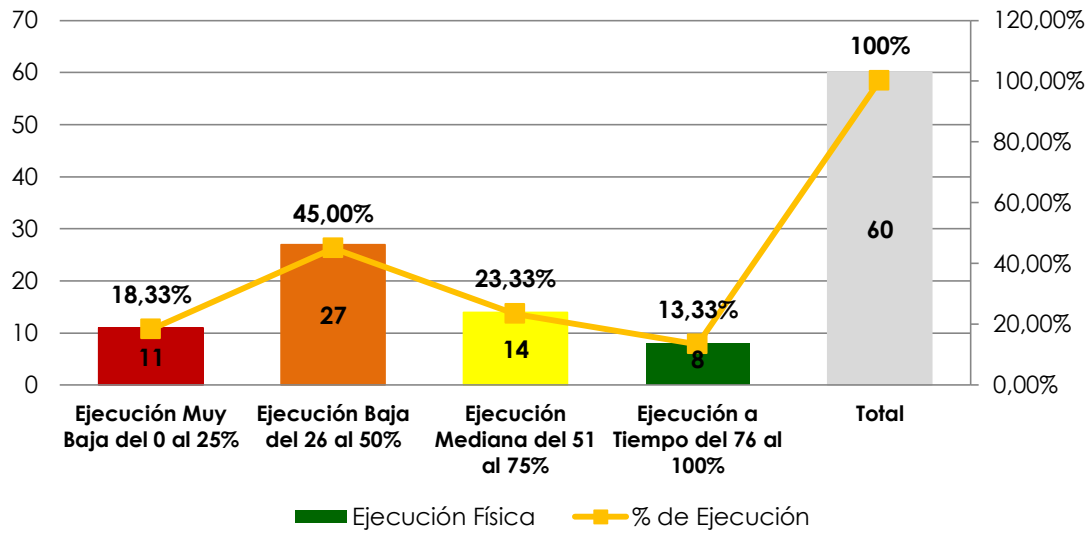

[*Ver Anexo8*](#)

4.5 Ejecución Física Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada

Gráfico 24: Ejecución Física Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada al 30 de Noviembre 2018


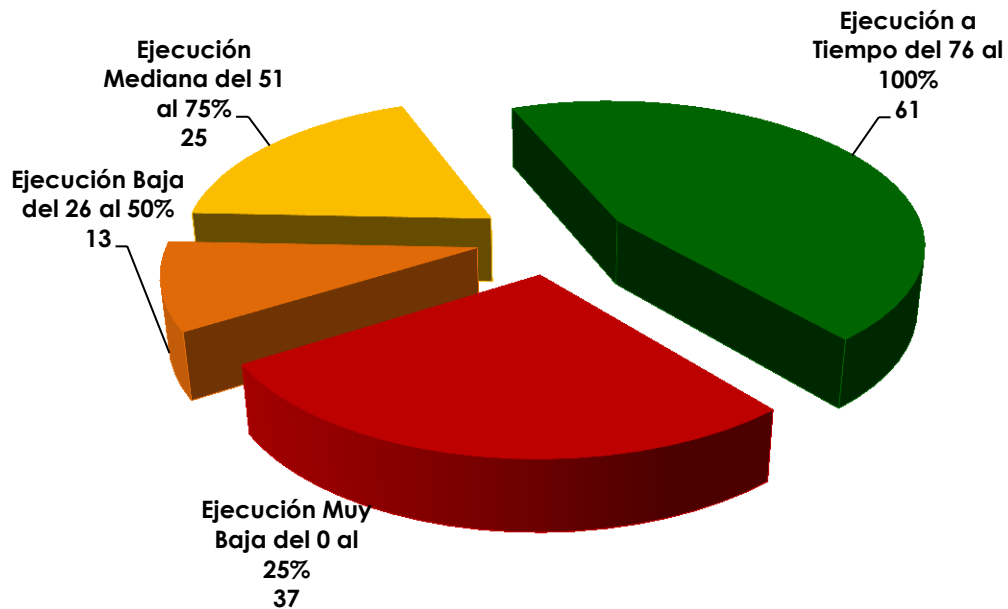


Gráfico 25: Ejecución Física de Proyectos de Inversión Delegada

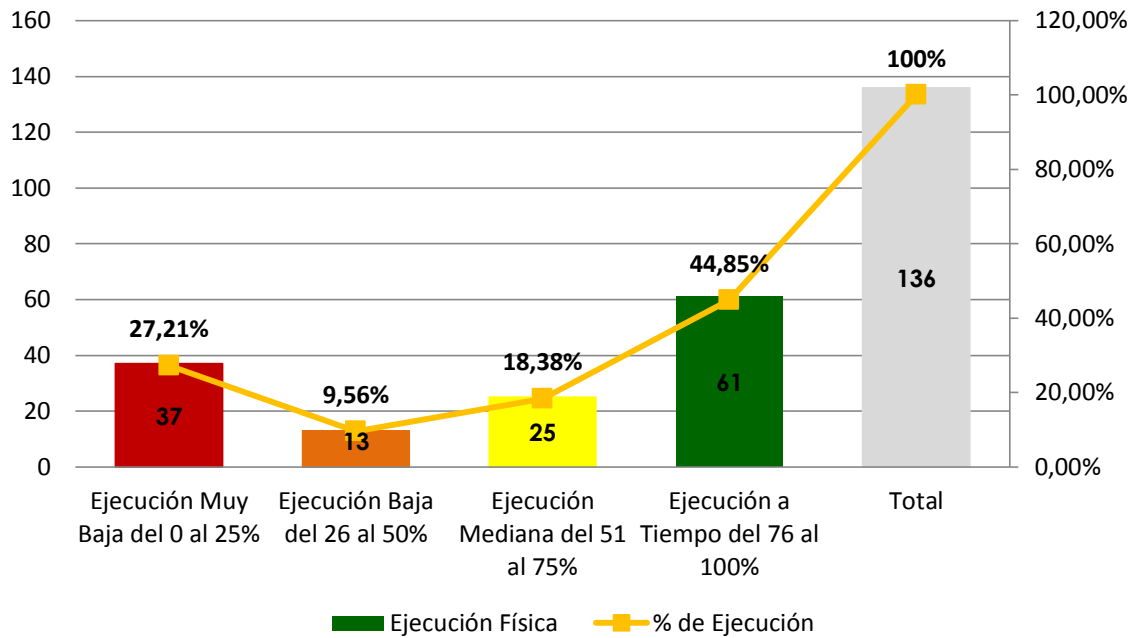

[*Ver Anexo9*](#)

4.6 Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada

Gráfico 26: Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos De Inversión Delegada al 30 de Septiembre 2018


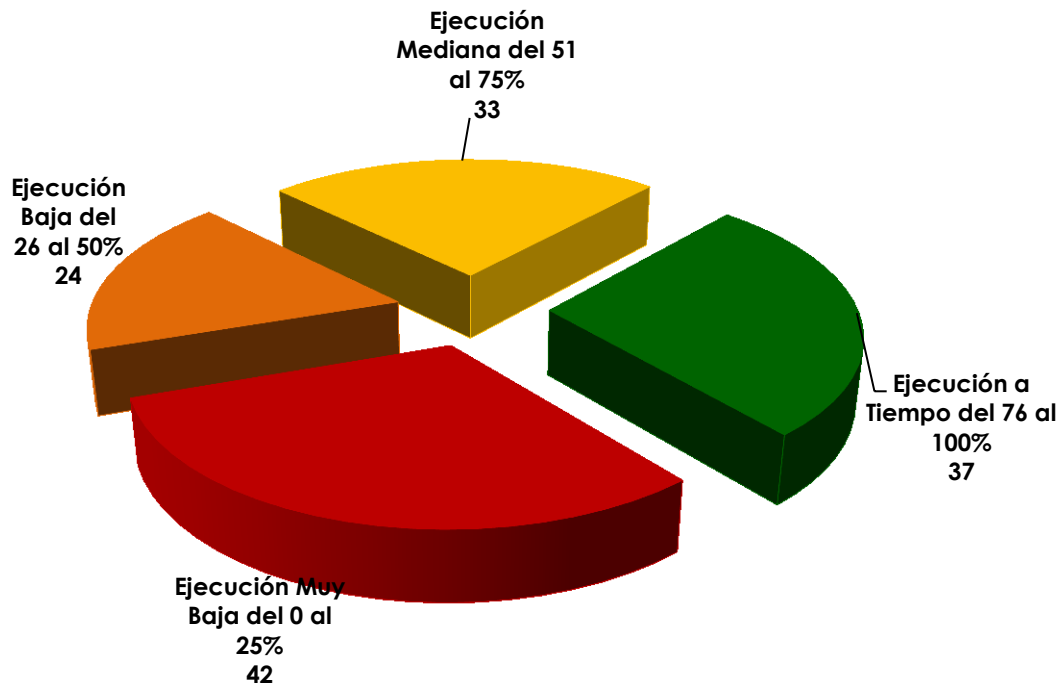


Gráfico 27: Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada

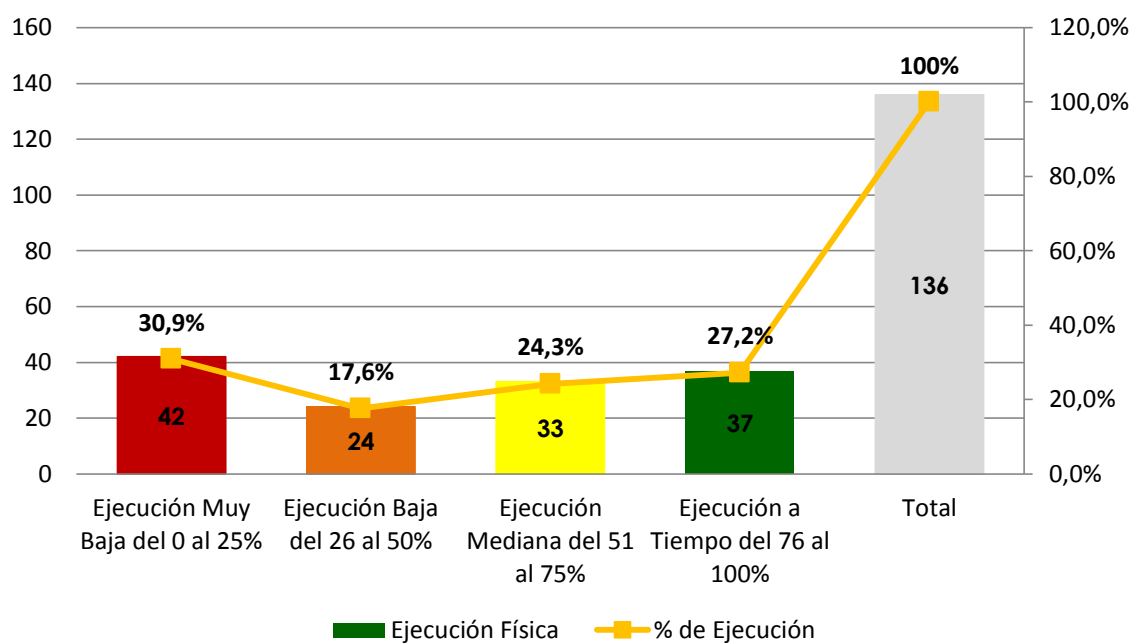

[*Ver Anexo10*](#)

5. Análisis de Desempeño por Dirección Administrativa

5.1 Análisis de Ejecución Financiera por Dirección Administrativa

Gráfico 28: Análisis de Desempeño por Dirección Administrativas Ejecución Financiera



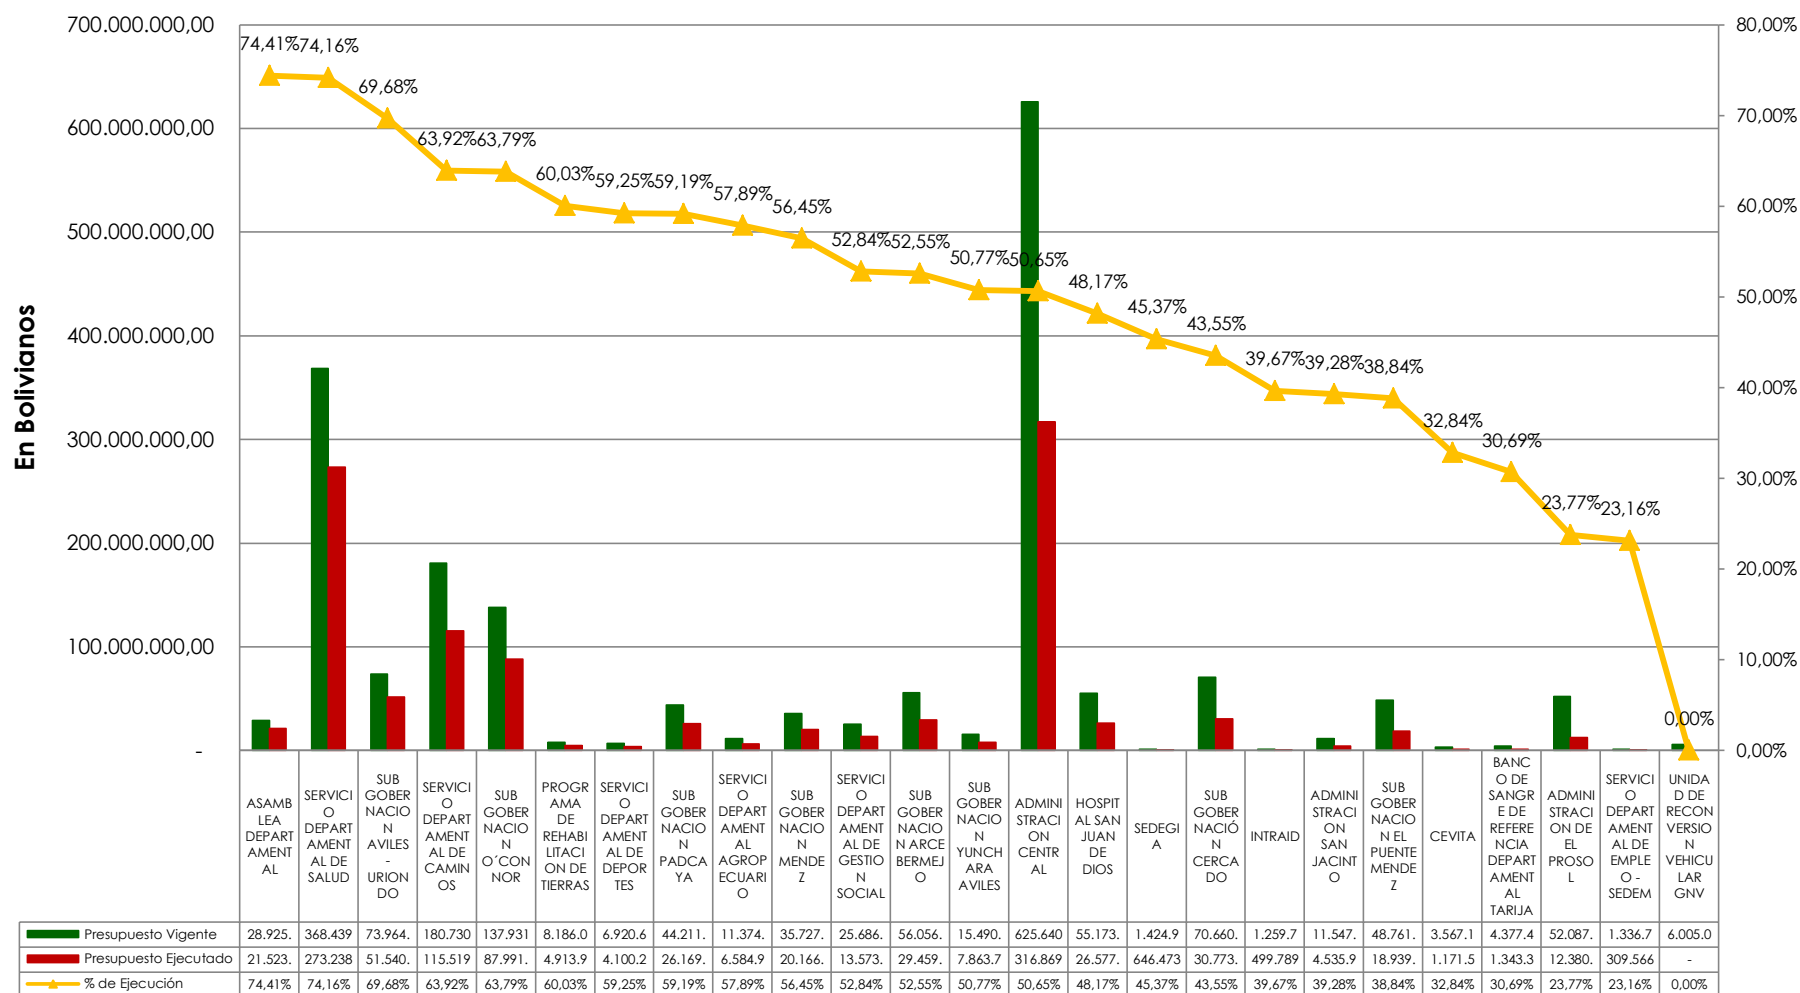


Gráfico 28.1: Análisis de Desempeño por Dirección Administrativas de Inversión Ejecución Financiera


28.2: Análisis de Desempeño por Dirección Administrativas de Programas Ejecución Financiera

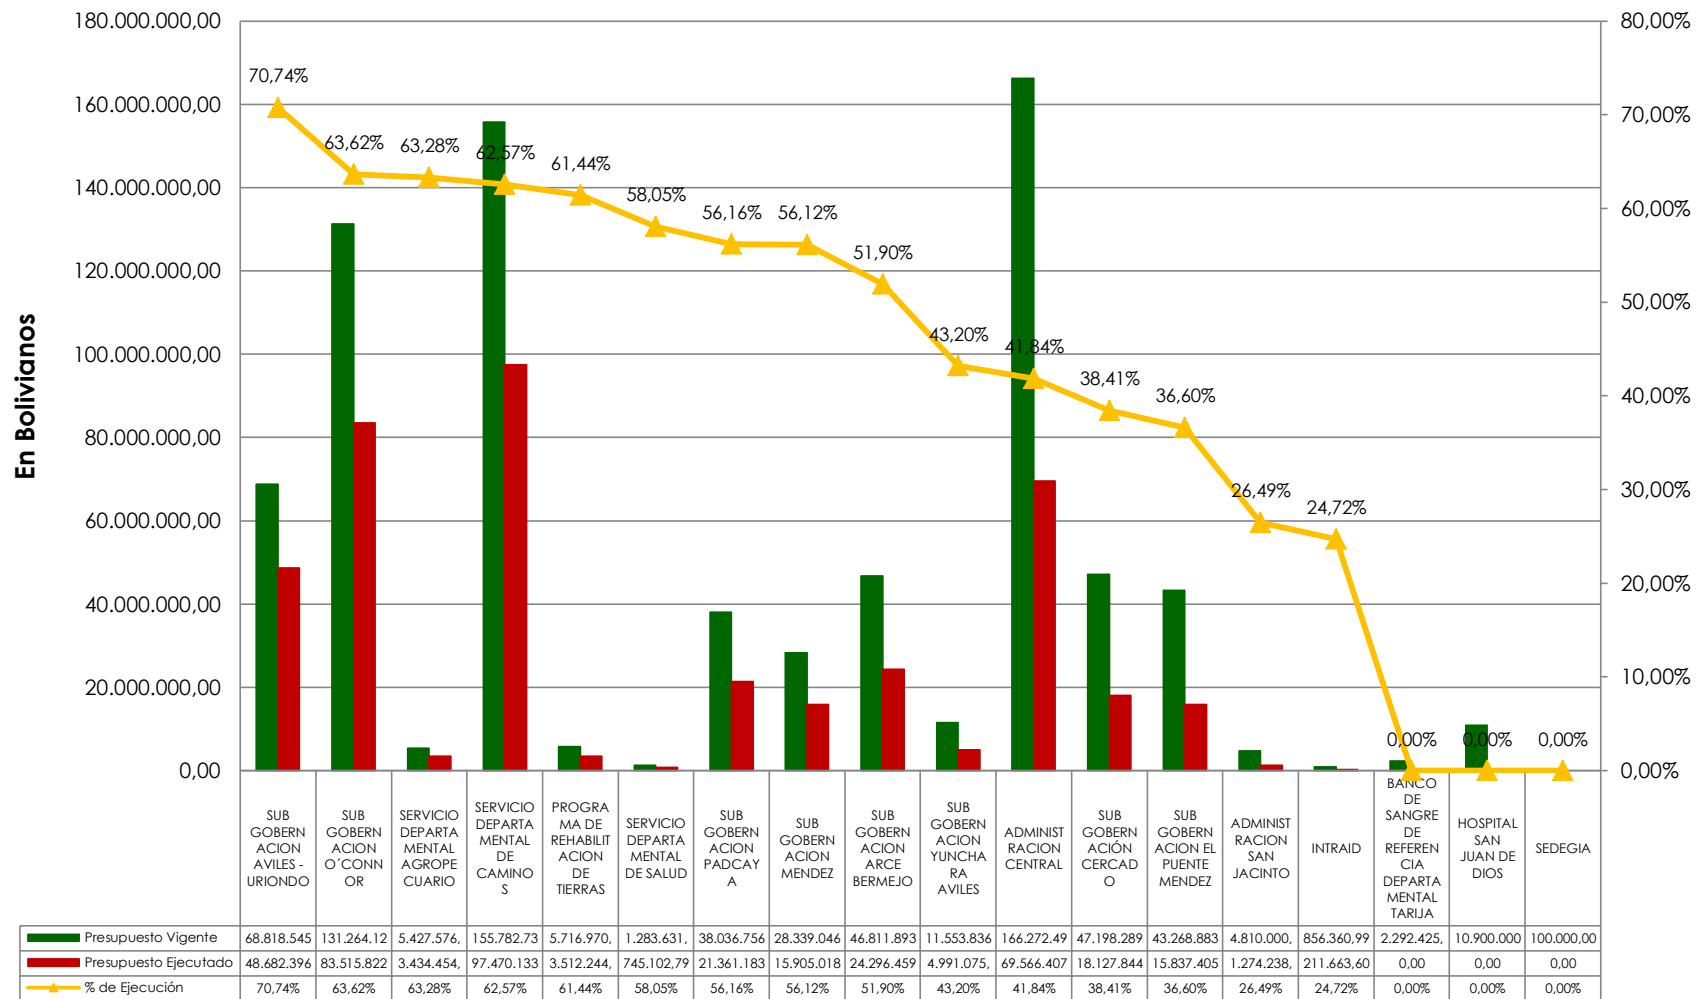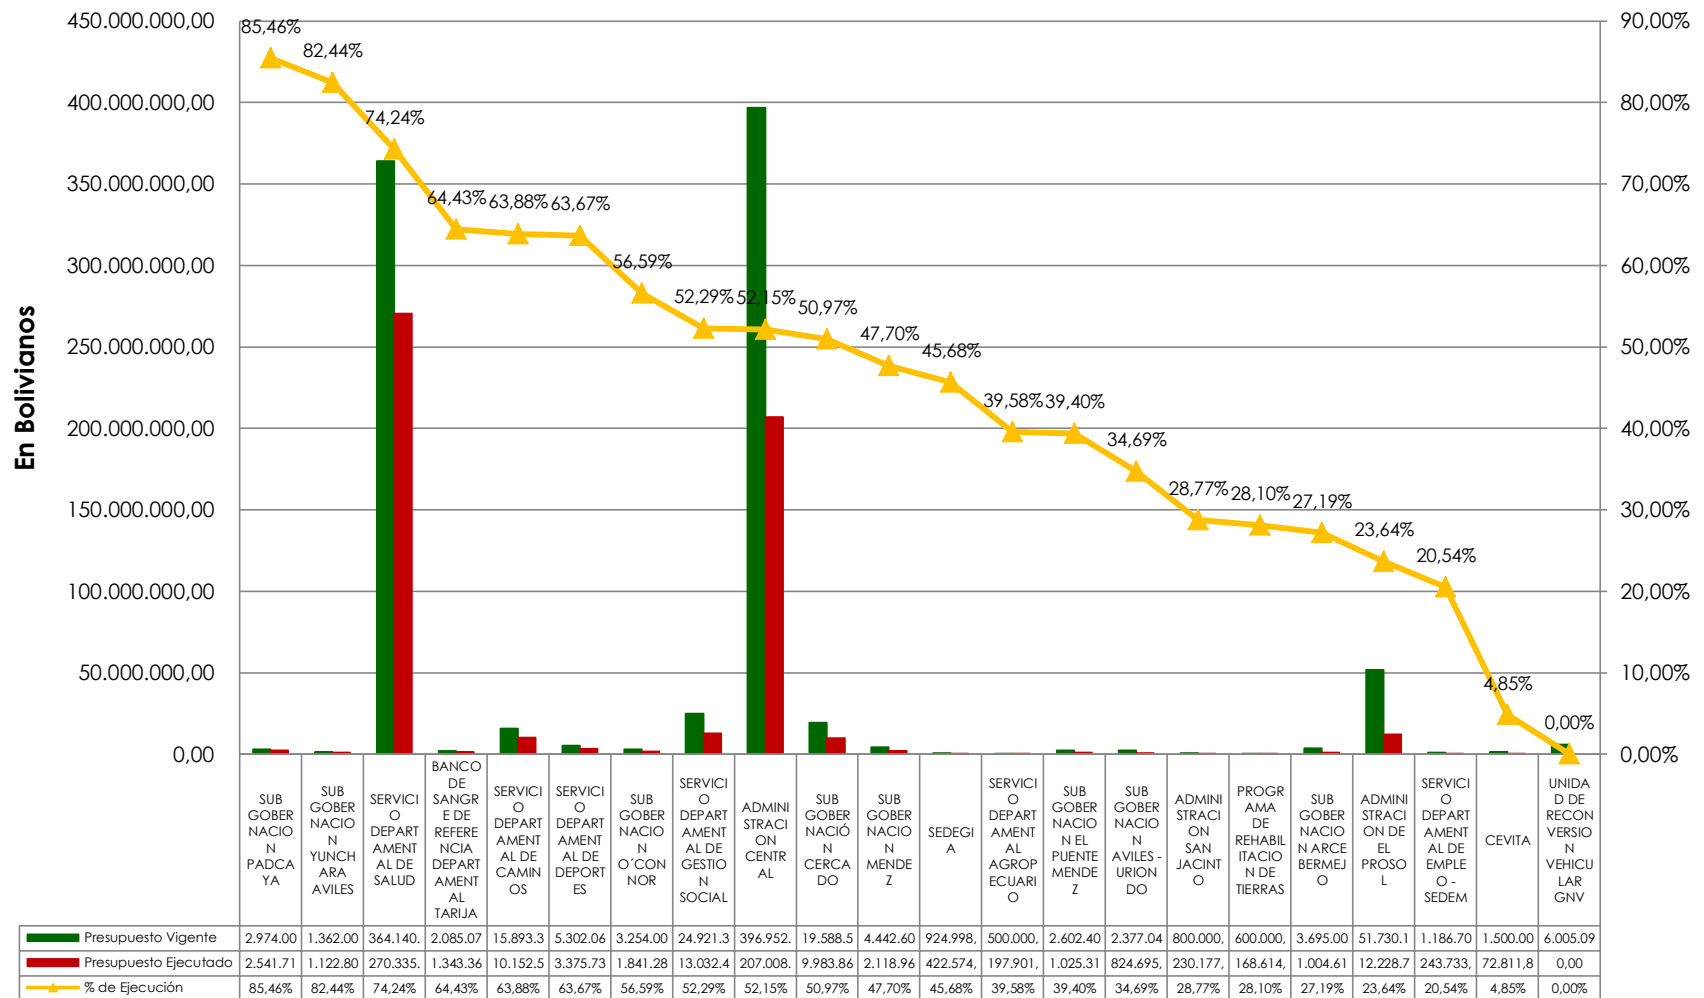

6 Cumplimiento de modelo de Gestión – Agenda del Bienestar

COMPONENTE ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
I. Plan Vida	648.416.316,17	416.446.502,04	64,23 %
II. Plan Dignidad	84.486.952,65	20.886.368,24	24,72 %
III. Plan Oportunidad	604.402.711,77	329.006.820,63	54,44 %
IV. Plan Transparencia	442.967.543,56	261.059.749,26	58,93 %
V. Plan Alegría	95.213.538,13	49.292.911,74	51,77 %
TOTAL	1.875.487.062,28	1.076.692.351,91	57,41 %

Gráfico 29 Ejecución Presupuestaria de la Agenda del Bienestar al 30 de Noviembre de 2018

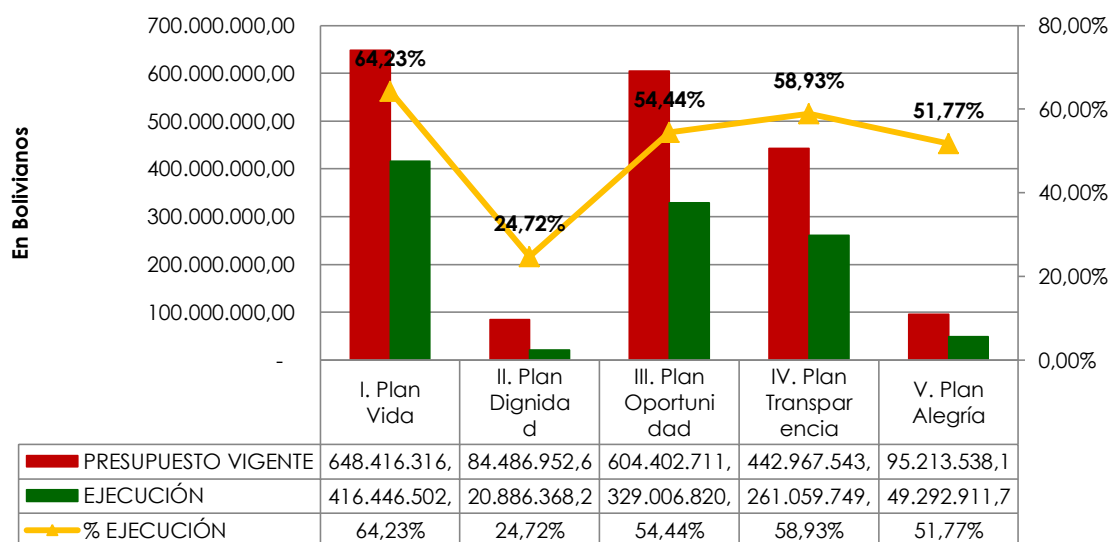

6.1 Cumplimiento de modelo de Gestión – Agenda del Bienestar y áreas de intervención

Plan / Área de Intervención	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejecución
I. Plan Vida	648.416.316,17	416.446.502,04	64,23%
i) Salud	521.501.046,90	356.707.788,16	68,40%
ii) Educación	39.989.761,14	19.516.742,95	48,80%
iii) Gestión Social	65.738.312,00	31.255.849,95	47,55%
iv) Medio Ambiente	21.187.196,13	8.966.120,98	42,32%
II. Plan Dignidad	84.486.952,65	20.886.368,24	24,72%
i) Agua potable y saneamiento Básico	52.057.505,66	17.748.008,87	34,09%
ii) Energía eléctrica	32.429.446,99	3.138.359,37	9,68%
III. Plan Oportunidad	604.402.711,77	329.006.820,63	54,44%
i) Hidrocarburos y Energía	6.743.156,00	387.858,88	5,75%
ii) Desarrollo Productivo	128.243.196,59	34.687.020,07	27,05%
iii) Turismo	11.568.628,07	2.910.889,31	25,16%
iv) Infraestructura Vial	344.385.562,15	219.246.517,60	63,66%
vi) Riego	113.462.168,96	71.774.534,77	63,26%
IV. Plan Transparencia	442.967.543,56	261.059.749,26	58,93%
i) Transparencia	365.515.080,06	201.547.730,57	55,14%
ii) Autonomía	77.452.463,50	59.512.018,69	76,84%
V. Plan Alegría	95.213.538,13	49.292.911,74	51,77%
i) Cultura y arte	5.085.553,00	3.632.635,02	71,43%
ii) Cultura de la alegría	3.086.700,00	2.348.736,30	76,09%
iii) Deporte	77.866.190,13	38.516.683,80	49,47%
iv) Convivencia y seguridad ciudadana	9.175.095,00	4.794.856,62	52,26%
Total general	1.875.487.062,28	1.076.692.351,91	57,41%

Gráfico 30 Ejecución Financiera Acumulada de la Agenda del Bienestar al 30 de Noviembre de 2018


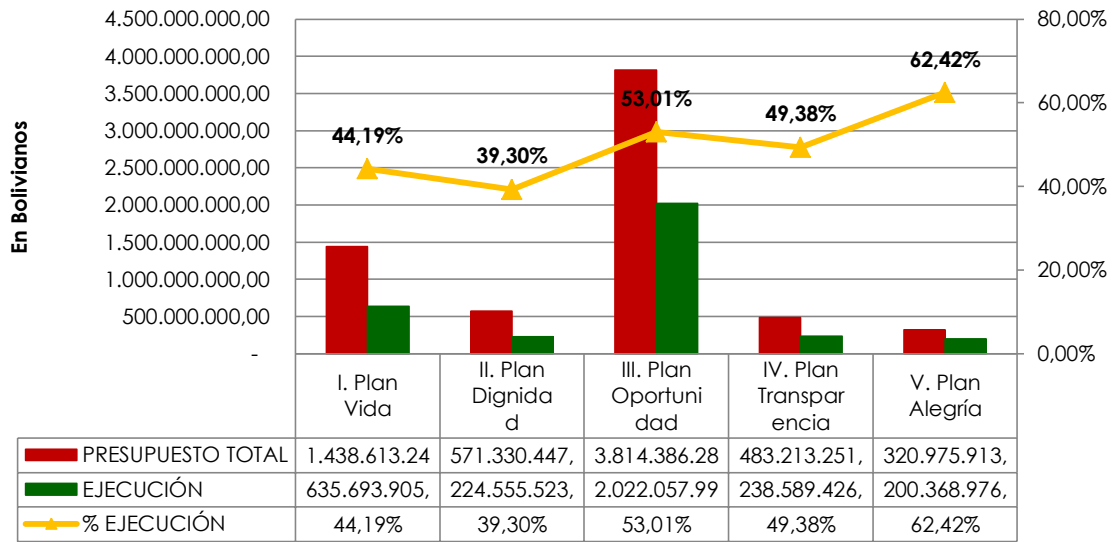



Gráfico 31 Avance Físico Acumulado de la Agenda del Bienestar al 30 de Noviembre de 2018

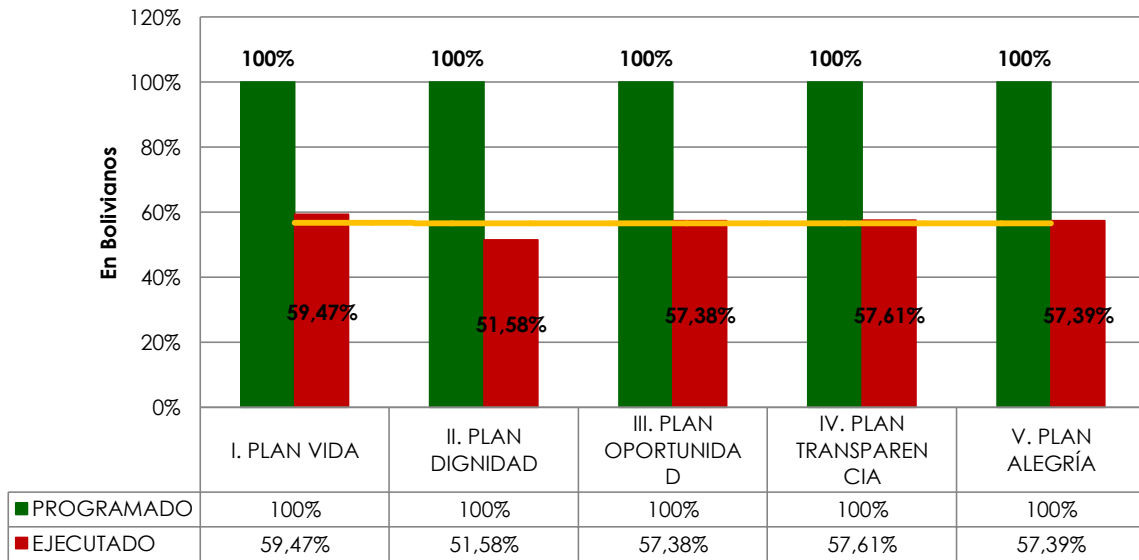

7.- Ejecución financiera por Sectores de Inversión

7.2 Ejecución Presupuestaria por sectores de Inversión publica

Gráfico 32: Ejecución Presupuestaria Vigente por Sectores de Inversión al 30 de Noviembre 2018

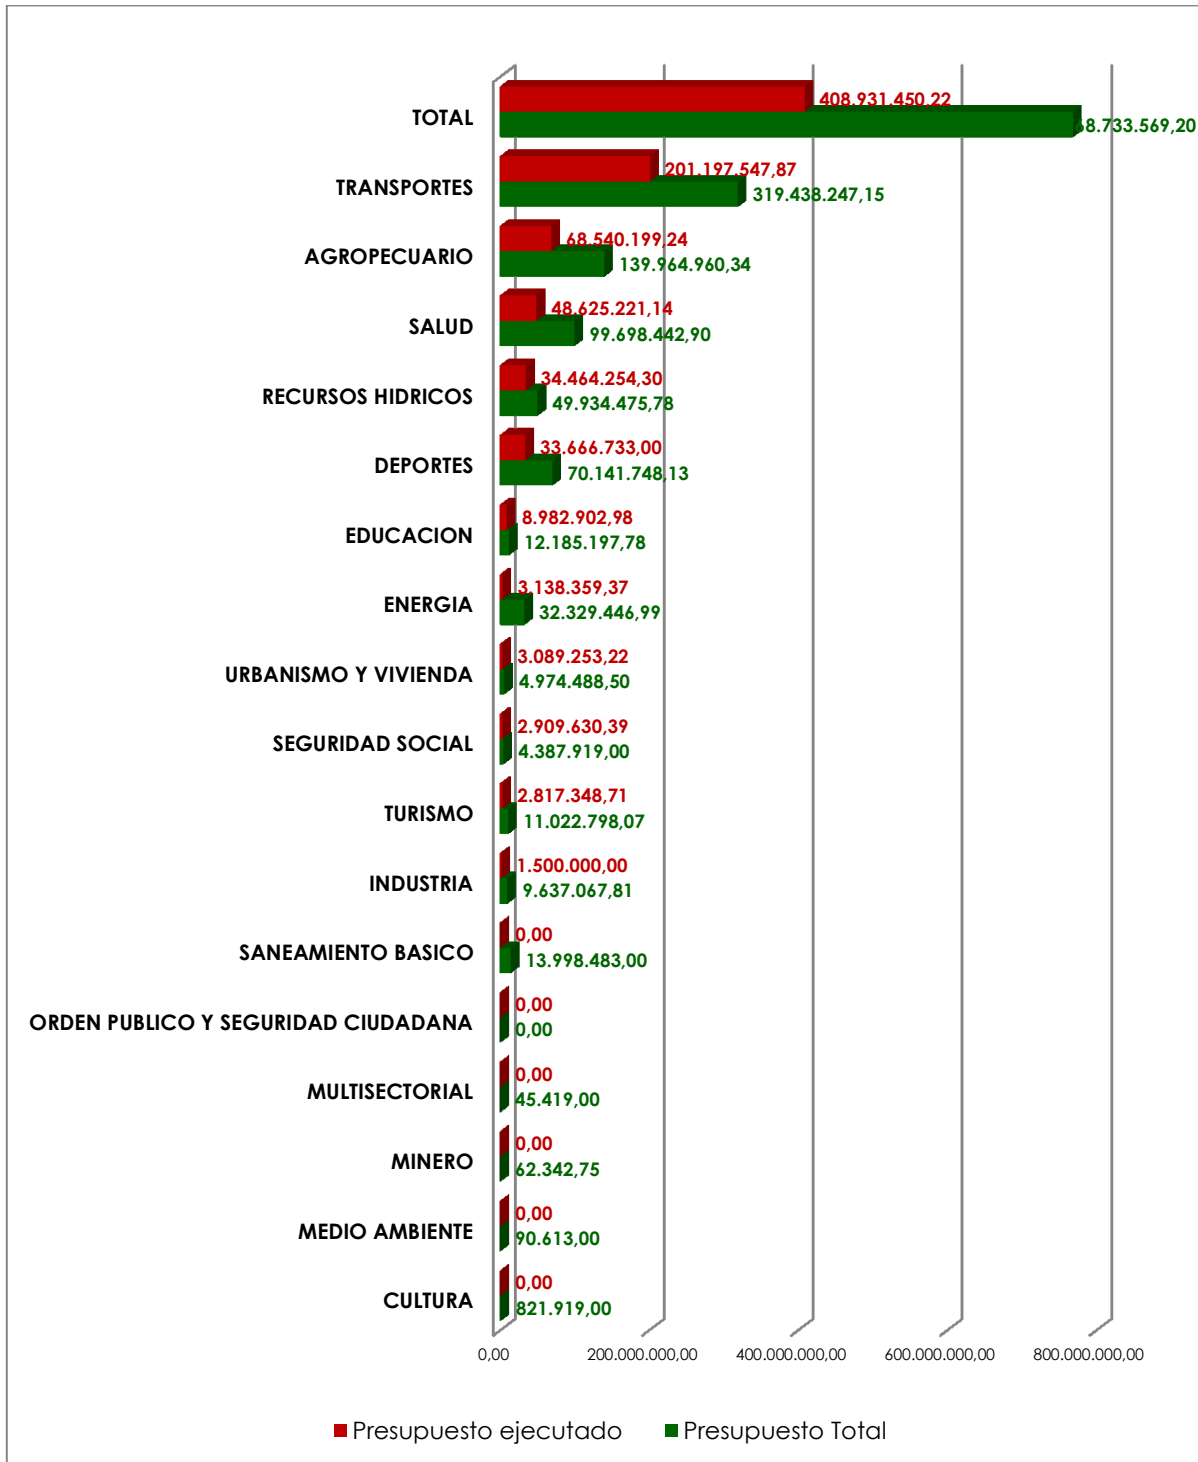



SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL

ANEXOS

Ejecución Física Programas No Recurrentes

ANEXO 1

*Sistema Integrado de Gestión por
Resultados*

**PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 0 A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	CEVITA	CEVITA	PROGRAMA DE INVESTIGACION Y CERTIFICACION DE LA PRODUCCION VITIVINICOLA EN EL DPTO DE TARIJA CEVITA	1.500.000,00	72.811,83	4,85%	0,00%
2	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS- PERTT	Ninguno	PROGRAMA PLANTINES FORESTALES NATIVAS Y EXOTICAS	600.000,00	168.614,50	28,10%	0,00%
3	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE HEMODIALISIS EN BERMEJO	303.172,00	0	0,00%	0,00%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA LA UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO	15.546.855,36	0	0,00%	0,00%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FONDO DE LUCHA CONTRA EL CANCER LEY 159	10.000,00	0	0,00%	0,00%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	4.000.000,00	0	0,00%	0,00%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROGRAMA DPTAL APOYO AL EMPRENDIMIENTO SOCIOPRODUCTIVO DPTO.TJA	3.683.212,00	11.349,33	0,31%	0,00%
8	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	PROGRAMA CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PRESAS DPTO. TARIJA	799.998,00	339.747,92	42,47%	5,00%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	AGENCIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	500.000,00	39.582,80	7,92%	10,00%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROGRAMA DPTAL APOYO TURISMO RURAL DPTO. TARIJA	34.830,00	10.500,00	30,15%	10,04%
11	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	200.000,00	47.018,52	23,51%	15,11%
12	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE PLANTINES DE FRUTALES Y SEMILLAS CERTIFICADAS, PARA EL VALLE CENTRAL Y LA ZONA ALTA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	500.000,00	197.901,86	39,58%	25,00%

**PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL ITS/VIH - SIDA	200.000,00	112.212,36	56,11%	27,75%
2	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	PROGRAMA DE MANT. SISTEMA RIEGO A PRESION-ESTACION DE BOMBEO Y EQUIP.ÁREA PRESA Y OBRAS DE TOMA DEL PMSJ	800.000,00	230.177,90	28,77%	31,97%
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	PROGRAMA SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA DE TARIJA - SEMAT	1.000.000,00	551.039,87	55,10%	35,90%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FONDO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DPTAL. TARIJA - FOPEDT	10.894.263,20	4.000.000,00	36,72%	36,00%
5	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	PROMOCION DE UVA, VINOS Y SINGANIS MARCA TARIJA	94.000,00	28.936,30	30,78%	36,77%
6	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO EMBOROZU	100.000,00	38.846,80	38,85%	39,00%
7	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA INST.TECNICO 2 DE AGOSTO ISLAYACHI	100.000,00	38.906,58	38,91%	39,60%
8	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA BERMEJO TERCER NIVEL	5.000.000,00	3.830.040,39	76,60%	50,05%

**PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	INSTITUTO TECNOLÓGICO TARIJA	210.000,00	62.124,31	29,58%	56,87%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	CONTROL Y MONITOREO INTEGRAL DE LA SALUD	1.000.000,00	687.477,78	68,75%	57,27%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DPTAL. DE CAPACITACIÓN MUSICAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	531.700,00	251.842,30	47,37%	61,46%
4	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	FORTALECIMIENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	155.000,00	103.651,60	66,87%	61,83%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	INSTITUTO DE CONTABILIDAD SUPERIOR TARIJA (INCOS)	250.000,00	156.977,43	62,79%	62,49%
6	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	PROGRAMA VIGILANCIA, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE VECTORES TRANSMISORES DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS	88.720,00	88.687,30	99,96%	63,65%
7	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	APOYO A FERIAS PRODUCTIVAS PROVINCIA CERCADO	763.548,00	465.440,20	60,96%	65,00%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SAN IGNACIO DE LOYOLA	100.000,00	56.069,23	56,07%	65,83%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO TÉCNICO SAN ANDRES	200.000,00	90.828,75	45,41%	66,66%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL AL PLAN DPTAL. DEL AGUA	100.000,00	35.152,00	35,15%	66,67%
11	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	PROGRAMA DE MONITORIO DE FUENTES HIDRÍCAS DE APOORTE AL EMBALSE HUACATA	125.000,00	82.826,17	66,26%	67,00%
12	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE DES. SOCIAL E INTEGRAL DE LA JUVENTUD DPTO. DE TARIJA	500.000,00	344.237,25	68,85%	69,00%
13	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	1.105.464,00	858.021,62	77,62%	75,59%

PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO EUSTAQUIO MENDEZ	95.000,00	75.706,50	79,69%	76,00%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DESARROLLO DE LA GESTIÓN COMUNICACIONAL PARA EL CONTROL SOCIAL	3.926.000,00	3.181.868,88	81,05%	79,56%
3	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO YUNCHARA	100.000,00	65.461,28	65,46%	83,27%
4	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	PROGRAMA BOCA SANITA	169.000,00	146.478,81	86,67%	84,52%
5	SEDEGES	SEDEGES	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL LEY 031	1.000.000,00	736.163,96	73,62%	89,31%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROMOCIÓN INTRA E INTER CULTURAL DE GESTIÓN	2.180.000,00	1.926.894,00	88,39%	90,00%
7	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO Y CULTURA DE LA 2DA SECCION PROV. MENDEZ	598.470,00	444.695,40	74,31%	93,78%
8	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO BERMEJO	100.000,00	99.910,92	99,91%	100,00%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROGRAMA CITE TURISMO TARIJA	510.000,00	83.040,60	16,28%	100,00%

Ejecución Física Programas Recurrentes

ANEXO 2

*Sistema Integrado de Gestión por
Resultados*

**PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 0 A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	6.005.094,00	0	0,00%	0,00%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL CANCER LEY 159	1.990.000,00	0	0,00%	0,00%
3	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	FESTIVIDAD VIRGEN DE GUADALUPE LEY 2078	430.000,00	385.403,00	89,63%	0,00%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	CARNAVAL DE INTEGRACIÓN LEY N° 038	20.000,00	0	0,00%	0,00%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	30.000,00	0	0,00%	0,00%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE CHAGUAYA LEY N° 115	20.000,00	0	0,00%	0,00%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO SEDERI	100.000,00	0	0,00%	0,00%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	EL ARETE GUASU LEY N° 075	40.000,00	0	0,00%	0,00%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	PREVISIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION	49.180,20	0	0,00%	0,00%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FESTIVIDAD DE CANTO, CUECA Y BAILECITO NILO SORUCO LEY 3383	20.000,00	0	0,00%	0,00%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS	LEY DE DEFENSA DE LOS CAMPOS MARGARITA Y HUACATA	350.000,00	0	0,00%	0,00%
12	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FESTIVIDAD DE SAN ROQUE LEY 3132	105.000,00	0	0,00%	0,00%
13	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (ADICIONALES)	0,00	0	#¡DIV/0!	0,00%
14	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FERIA DEL LIBRO LEY N° 045	10.000,00	0	0,00%	0,00%

**PROGRAMAS RECURRENTES
EN EL RANGO DE 0 A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA
15	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS GAD A GAR	1.000.000,00	0	0,00%	0,00%
16	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	PROVISIONES PARA CONTRAPARTES CON EL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	49.962.086,00	0	0,00%	0,00%
17	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	APOYO A LA FISCALIA DE DISTRITO TARIJA	25.000,00	0	0,00%	0,00%
18	SEDEGES	SEDEGES	PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONA CON DISCAPACIDAD	7.480.000,00	1.296.028,32	17,33%	15,00%
19	PROSOL	PROSOL	PROGRAMA SOLIDARIO DE APOYO A LA PRODUCCION PROSOL LEY 3741	51.730.150,00	12.228.750,00	23,64%	24,00%
20	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO-SEDEM	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO-SEDEM	PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL	1.186.700,00	243.733,15	20,54%	25,00%

**PROGRAMAS RECURRENTES
EN EL RANGO DE 26 A 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA EMAGUA	17.377.407,66	1.499.999,57	8,63%	30,84%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	3.701.239,00	1.800.082,77	48,63%	48,62%
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SEGURO UNIVERSAL DE SALUD PROV. GRAN CHACO - SUSAT GARCH	6.246.640,00	2.892.172,91	46,30%	48,80%
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SEGURO UNIVERSAL DE SALUD AUTÓNOMO DE TARIJA - SUSAT	20.751.400,00	15.123.467,65	72,88%	50,65%

**PROGRAMAS RECURRENTES
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS PROYECTOS CONCURRENTES	124.757.771,66	67.630.864,57	54,21%	54,58%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	7.932.765,00	4.512.607,91	56,89%	55,00%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DEFENSA Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	500.000,00	235.037,50	47,01%	60,00%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	CENTRO DE REHABILITACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA CIEGOS - CERECCI	799.001,00	500.000,00	62,58%	62,53%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL A LAS ACTIVIDADES, OBRAS Y PROYECTOS EN EL DPTO. DE TARIJA	392.000,00	195.670,50	49,92%	62,88%
6	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO URIONDO	131.546,00	83.761,23	63,67%	63,00%
7	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	FORTALECIMIENTO HUMANO EN REDES DE SALUD	43.726.570,00	27.749.826,12	63,46%	63,62%
8	SEDECA	SEDECA	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SEDECA	15.893.359,00	10.152.593,17	63,88%	64,00%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	1.946.350,00	1.243.142,72	63,87%	65,00%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS	207.500,00	131.031,00	63,15%	69,37%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	696.896,00	484.350,00	69,50%	69,50%
12	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DEUDA INTERNA	25.713.221,00	19.128.840,51	74,39%	74,35%
13	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DPTO. DE TARIJA	1.000.000,00	743.303,08	74,33%	75,00%
14	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	EDUCACION CIVICA PATRIOTICA D.S. 859	215.945,00	153.458,21	71,06%	75,00%

PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE	2.085.070,00	1.343.362,32	64,43%	76,69%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	INTEGRACION ECONOMICA PRODUCTIVA Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE TJA.EN EL COTEXTO INTER.	700.000,00	540.840,25	77,26%	78,00%
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	FORTALECIMIENTO CON RECURSO HUMANO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE TERCER NIVEL	11.368.274,00	8.111.283,79	71,35%	78,00%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	35.828.109,00	28.092.979,26	78,41%	78,59%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DEUDA EXTERNA	8.718.158,00	7.167.545,04	82,21%	82,28%
6	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - TGN	272.657.533,00	211.231.283,81	77,47%	82,97%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	RENTA DIGNIDAD	32.390.014,00	25.392.424,18	78,40%	83,33%
8	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	INSTITUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO PROVINCIA O'CONNOR	233.000,00	83.801,88	35,97%	85,00%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	CASA DE LA CULTURA Y CASA DORADA	1.170.500,00	1.035.816,00	88,49%	88,49%
10	SEDEGES	SEDEGES	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	692.330,00	282.248,71	40,77%	89,30%

**PROGRAMAS RECURRENTES
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	PREVISIONES FINANCIERAS	20.000.000,00	18.000.000,00	90,00%	90,00%
12	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	6.105.872,00	4.125.424,87	67,56%	90,57%
13	SEDEGES	SEDEGES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL - TGN	5.376.256,00	4.022.844,68	74,83%	91,40%
14	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO	9.989.307,00	9.181.445,06	91,91%	91,67%
15	SEDEGES	SEDEGES	PROGRAMA DE SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL	10.372.728,00	6.695.160,83	64,55%	92,32%
16	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	31.301.017,00	14.371.943,56	45,92%	93,33%
17	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	BONO DE VACUNACION ESCALAFON AL MERITO	7.313.908,00	7.145.043,00	97,69%	97,70%
18	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	FIESTA GRANDE PATRONAL DE SAN LORENZO LEY N° 016	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%
19	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	HOMENAJE A LA OBRA POETICA OSCAR ALFARO LEY 3682	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
20	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	PROGRAMA FESTIVIDAD A LA VENDIMIA	230.000,00	208.499,00	90,65%	100,00%
21	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	FESTIVIDAD DE SAN SANTIAGO LEY 3393	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
22	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	FESTIVIDAD INTERNACIONAL DEL LAPACHO LEY 2925	40.000,00	20.000,00	50,00%	100,00%

PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA
23	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	MUSEO NACIONAL PALEONTOLOGICO ARQUEOLOGICO	540.200,00	540.200,00	100,00%	100,00%
24	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DEUDA COMERCIAL Y RECURRENTE	420.889,00	420.863,02	99,99%	100,00%
25	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	OFICINA TECNICA DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO	2.178.294,00	2.178.294,00	100,00%	100,00%
26	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	OBSERVATORIO SANTA ANA	599.220,00	599.220,00	100,00%	100,00%
27	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	COMPLEJO CONVENTUAL SAN FRANCISCO LEY 3463	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%

Ejecución Física Operaciones de Funcionamiento

ANEXO 3

*Sistema Integrado de Gestión por
Resultados*

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	62.415.441,00	40.295.179,18	64,56%	16,33%

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	PROSOL	PROSOL	PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	357.500,00	152.043,55	42,53%	43,00%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO-SEDEM	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO-SEDEM	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO - SEDEM	150.000,00	65.833,14	43,89%	44,00%

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	5.937.017,00	3.031.497,33	51,06%	52,00%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG	5.447.169,00	2.952.600,02	54,20%	52,90%
3	CEVITA	CEVITA	CEVITA	2.067.158,00	1.098.766,96	53,15%	54,00%
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	SERVICIO DPTAL DE GESTION INTEGRAL DE AGUA	400.000,00	223.899,40	55,97%	56,00%
5	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS	44.273.253,00	26.577.354,89	60,03%	60,88%
6	SEDEDE	SEDEDE	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	1.618.570,00	724.525,93	44,76%	66,07%
7	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL CERCADO	3.874.068,00	2.662.097,60	68,72%	66,90%
8	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL PROVINCIA AVILES YUNCHARA	2.574.442,00	1.749.822,44	67,97%	68,00%
9	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL PADCAYA	3.201.201,00	2.266.682,65	70,81%	71,08%
10	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL EL PUENTE	2.890.441,00	2.077.140,52	71,86%	72,00%
11	INTRAID	INTRAID	REHABILITACION Y PREVENCIÓN TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIA	403.381,00	288.125,64	71,43%	72,00%
12	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SAN LORENZO	2.945.496,00	2.142.569,08	72,74%	73,00%
13	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE TARIJA	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE TARIJA	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	28.925.078,00	21.523.016,86	74,41%	74,38%

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SECCION O'CONNOR	3.413.245,00	2.634.189,96	77,18%	78,00%
2	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTT	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTT	PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA	1.869.118,00	1.233.087,50	65,97%	79,39%
3	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SECCION PROVINCIA AVILES	2.768.487,00	2.033.400,66	73,45%	80,39%
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	3.015.683,00	2.157.691,86	71,55%	81,39%
5	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL PROVINCIA ARCE BERMEJO	5.549.664,00	4.157.957,70	74,92%	82,39%
6	SEDECA	SEDECA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	9.053.956,00	7.896.376,56	87,21%	83,39%
7	SEDEGES	SEDEGES	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	765392	541.151,86	70,70%	84,39%

Ejecución Financiera Programas No Recurrentes

ANEXO 4

*Sistema Integrado de Gestión por
Resultados*

**PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
1	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE HEMODIALISIS EN BERMEJO	303.172,00	0	0,00%	333.172,00	0,00	0,00%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA LA UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO	15.546.855,36	0	0,00%	15.546.855,36	0,00	0,00%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FONDO DE LUCHA CONTRA EL CANCER LEY 159	10.000,00	0	0,00%	2.000.000,00	0,00	0,00%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	4.000.000,00	0	0,00%	40.000.000,00	0,00	0,00%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROGRAMA DPTAL APOYO AL EMPRENDIMIENTO SOCIOPRODUCTIVO DPTO.TJA	3.683.212,00	11.349,33	0,31%	3.683.212,00	11.349,33	0,31%
6	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	PROGRAMA CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PRESAS DPTO. TARIJA	799.998,00	339.747,92	42,47%	13.682.728,60	339.747,92	2,48%
7	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	200.000,00	47.018,52	23,51%	1.056.052,00	47.018,52	4,45%
8	CEVITA	CEVITA	PROGRAMA DE INVESTIGACION Y CERTIFICACION DE LA PRODUCCION VITIVINICOLA EN EL DPTO DE TARIJA CEVITA	1.500.000,00	72.811,83	4,85%	1.500.000,00	72.811,83	4,85%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROGRAMA DPTAL APOYO TURISMO RURAL DPTO. TARIJA	34.830,00	10.500,00	30,15%	1.173.450,00	71.048,80	6,05%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	AGENCIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	500.000,00	39.582,80	7,92%	500.000,00	39.582,80	7,92%
11	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	PROGRAMA SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA DE TARIJA - SEMAT	1.000.000,00	551.039,87	55,10%	7.598.983,08	1.140.152,27	15,00%
12	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS- PERTI	Ninguno	PROGRAMA PLANTINES FORESTALES NATIVAS Y EXOTICAS	600.000,00	168.614,50	28,10%	1.119.923,00	168.614,50	15,06%
13	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL ITS/VIH - SIDA	200.000,00	112.212,36	56,11%	737.635,00	112.212,36	15,21%
14	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROGRAMA CITE TURISMO TARIJA	510.000,00	83.040,60	16,28%	510.000,00	83.040,60	16,28%
15	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	INSTITUTO TECNOLÓGICO TARIJA	210.000,00	62.124,31	29,58%	750.000,00	138.790,56	18,51%

**PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
16	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE PLANTINES DE FRUTALES Y SEMILLAS CERTIFICADAS, PARA EL VALLE CENTRAL Y LA ZONA ALTA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	500.000,00	197.901,86	39,58%	959.736,28	197.901,86	20,62%
17	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	PROMOCION DE UVA, VINOS Y SINGANIS MARCA TARIJA	94.000,00	28.936,30	30,78%	121.000,00	28.936,30	23,91%
18	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SAN IGNACIO DE LOYOLA	100.000,00	56.069,23	56,07%	500.000,00	129.736,25	25,95%

**PROGRAMAS NO RECURRENTES
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
1	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	PROGRAMA DE MANT. SISTEMA RIEGO A PRESION-ESTACION DE BOMBEO Y EQUIP.ÁREA PRESA Y OBRAS DE TOMA DEL PMSJ	800.000,00	230.177,90	28,77%	800.000,00	230.177,90	28,77%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FONDO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DPTAL. TARIJA - FOPEDT	10.894.263,20	4.000.000,00	36,72%	10.894.263,20	4.000.000,00	36,72%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO TÉCNICO SAN ANDRES	200.000,00	90.828,75	45,41%	750.000,00	290.828,75	38,78%
4	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO EMBOROZU	100.000,00	38.846,80	38,85%	100.000,00	38.846,80	38,85%
5	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INST.TECNICO 2 DE AGOSTO ISLAYACHI	100.000,00	38.906,58	38,91%	100.000,00	38.906,58	38,91%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DPTAL. DE CAPACITACIÓN MUSICAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	531.700,00	251.842,30	47,37%	1.500.000,00	631.001,23	42,07%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	INSTITUTO DE CONTABILIDAD SUPERIOR TARIJA (INCOS)	250.000,00	156.977,43	62,79%	900.000,00	387.357,87	43,04%

**PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCION ACUMULADA PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA BERMEJO TERCER NIVEL	5.000.000,00	3.830.040,39	76,60%	30.000.000,00	16.219.608,39	54,07%
2	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	FORTALECIMIENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	155.000,00	103.651,60	66,87%	175.000,00	103.651,60	59,23%
3	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	APOYO A FERIAS PRODUCTIVAS PROVINCIA CERCADO	763.548,00	465.440,20	60,96%	763.548,00	465.440,20	60,96%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL AL PLAN DPTAL. DEL AGUA	100.000,00	35.152,00	35,15%	500.000,00	326.032,95	65,21%
5	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO YUNCHARA	100.000,00	65.461,28	65,46%	100.000,00	65.461,28	65,46%
6	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	PROGRAMA DE MONITORIO DE FUENTES HIDRÍCAS DE APOORTE AL EMBALSE HUACATA	125.000,00	82.826,17	66,26%	125.000,00	82.826,17	66,26%
7	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	CONTROL Y MONITOREO INTEGRAL DE LA SALUD	1.000.000,00	687.477,78	68,75%	1.000.000,00	687.477,78	68,75%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE DES. SOCIAL E INTEGRAL DE LA JUVENTUD DPTO. DE TARIJA	500.000,00	344.237,25	68,85%	500.000,00	344.237,25	68,85%
9	SEDEGES	SEDEGES	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL LEY 031	1.000.000,00	736.163,96	73,62%	1.000.000,00	736.163,96	73,62%
10	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO EUSTAQUIO MENDEZ	95.000,00	75.706,50	79,69%	100.000,00	75.706,50	75,71%

**PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCION ACUMULADA PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN
1	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	1.105.464,00	858.021,62	77,62%	955.464,00	736.484,00	77,08%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DESARROLLO DE LA GESTIÓN COMUNICACIONAL PARA EL CONTROL SOCIAL	3.926.000,00	3.181.868,88	81,05%	6.802.058,75	5.657.927,63	83,18%
3	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	PROGRAMA BOCA SANITA	169.000,00	146.478,81	86,67%	175.000,00	146.478,81	83,70%
4	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO Y CULTURA DE LA 2DA SECCION PROV. MENDEZ	598.470,00	444.695,40	74,31%	250.000,00	215.959,70	86,38%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROMOCIÓN INTRA E INTER CULTURAL DE GESTIÓN	2.180.000,00	1.926.894,00	88,39%	2.180.000,00	1.926.894,00	88,39%
6	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO BERMEJO	100.000,00	99.910,92	99,91%	100.000,00	99.910,92	99,91%
7	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	PROGRAMA VIGILANCIA, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE VECTORES TRANSMISORES DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS	88.720,00	88.687,30	99,96%	88.720,00	88.687,30	99,96%

Ejecución Financiera Programas Recurrentes

ANEXO 5

*Sistema Integrado de Gestión por
Resultados*

PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	6.005.094,00	0,00	0,00%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL CANCER LEY 159	1.990.000,00	0,00	0,00%
3	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	FESTIVIDAD VIRGEN DE GUADALUPE LEY 2078	430.000,00	0,00	0,00%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	CARNAVAL DE INTEGRACIÓN LEY N° 038	20.000,00	0,00	0,00%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE CHAGUAYA LEY N° 115	20.000,00	0,00	0,00%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO SEDER	100.000,00	0,00	0,00%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	EL ARETE GUASU LEY N° 075	40.000,00	0,00	0,00%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	PREVISIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION	49.180,20	0,00	0,00%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FESTIVIDAD DE CANTO, CUECA Y BAILECITO NILO SORUCO LEY 3383	20.000,00	0,00	0,00%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS	LEY DE DEFENSA DE LOS CAMPOS MARGARITA Y HUACATA	350.000,00	0,00	0,00%
12	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FESTIVIDAD DE SAN ROQUE LEY 3132	105.000,00	0,00	0,00%
13	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (ADICIONALES)	0,00	0,00	0,00%
14	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FERIA DEL LIBRO LEY N° 045	10.000,00	0,00	0,00%

PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
15	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS GAD A GAR	1.000.000,00	0,00	0,00%
16	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	PROVISIONES PARA CONTRAPARTES CON EL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	49.962.086,00	0,00	0,00%
17	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	APOYO A LA FISCALIA DE DISTRITO TARIJA	25.000,00	0,00	0,00%
18	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA EMAGUA	17.377.407,66	1.499.999,57	8,63%
19	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS	207.500,00	28.098,00	13,54%
20	SEDEGES	SEDEGES	PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONA CON DISCAPACIDAD	7.480.000,00	1.057.164,40	14,13%
21	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO-SEDEM	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO-SEDEM	PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL	1.186.700,00	243.733,15	20,54%
22	PROSOL	PROSOL	PROGRAMA SOLIDARIO DE APOYO A LA PRODUCCION PROSOL LEY 3741	51.730.150,00	12.228.750,00	23,64%

**PROGRAMAS RECURRENTES
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	SEDEGES	SEDEGES	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	692.330,00	282.248,71	40,77%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SEGURO UNIVERSAL DE SALUD PROV. GRAN CHACO - SUSAT GARCH	6.246.640,00	2.892.172,91	46,30%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DEFENSA Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	500.000,00	235.037,50	47,01%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	3.701.239,00	1.800.082,77	48,63%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL A LAS ACTIVIDADES, OBRAS Y PROYECTOS EN EL DPTO. DE TARIJA	392.000,00	195.670,50	49,92%
6	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	FESTIVIDAD INTERNACIONAL DEL LAPACHO LEY 2925	40.000,00	20.000,00	50,00%

PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS PROYECTOS CONCURRENTES	124.757.771,66	67.630.864,57	54,21%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	7.932.765,00	4.512.607,91	56,89%
3	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO URIONDO	131.546,00	83.761,23	63,67%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	CENTRO DE REHABILITACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA CIEGOS - CERECCI	799.001,00	500.000,00	62,58%
5	SEDECA	SEDECA	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SEDECA	15.893.359,00	10.152.593,17	63,88%
6	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	FORTALECIMIENTO HUMANO EN REDES DE SALUD	43.726.570,00	27.749.826,12	63,46%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	1.946.350,00	1.243.142,72	63,87%
8	SEDEGES	SEDEGES	PROGRAMA DE SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL	10.372.728,00	6.695.160,83	64,55%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	696.896,00	484.350,00	69,50%

PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FINANCIERA

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	EDUCACION CIVICA PATRIOTICA D.S. 859	215.945,00	153.458,21	71,06%
11	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	FORTALECIMIENTO CON RECURSO HUMANO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE TERCER NIVEL	11.368.274,00	8.111.283,79	71,35%
12	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - TGN	272.657.533,00	211.231.283,81	77,47%
13	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SEGURO UNIVERSAL DE SALUD AUTÓNOMO DE TARIJA - SUSAT	20.751.400,00	15.123.467,65	72,88%
14	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DPTO. DE TARIJA	1.000.000,00	743.303,08	74,33%
15	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DEUDA INTERNA	25.713.221,00	19.128.840,51	74,39%

PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	INTEGRACION ECONOMICA PRODUCTIVA Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE TJA.EN EL COTEXTO INTER.	700.000,00	540.840,25	77,26%
2	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE	2.085.070,00	1.343.362,32	64,43%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	RENTA DIGNIDAD	32.390.014,00	25.392.424,18	78,40%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	35.828.109,00	28.092.979,26	78,41%
5	SEDEGES	SEDEGES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL - TGN	5.376.256,00	4.022.844,68	74,83%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DEUDA EXTERNA	8.718.158,00	7.167.545,04	82,21%
7	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	INSTITUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO PROVINCIA O´CONNOR	233.000,00	83.801,88	35,97%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	31.301.017,00	14.371.943,56	45,92%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	CASA DE LA CULTURA Y CASA DORADA	1.170.500,00	1.035.816,00	88,49%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	PREVISIONES FINANCIERAS	20.000.000,00	18.000.000,00	90,00%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO	9.989.307,00	9.181.445,06	91,91%
12	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	6.105.872,00	4.125.424,87	67,56%
13	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	BONO DE VACUNACION ESCALAFON AL MERITO	7.313.908,00	7.145.043,00	97,69%
14	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	PROGRAMA FESTIVIDAD A LA VENDIMIA	230.000,00	208.499,00	90,65%

**PROGRAMAS RECURRENTES
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
15	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DEUDA COMERCIAL Y RECURRENTE	420.889,00	420.863,02	99,99%
16	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	FIESTA GRANDE PATRONAL DE SAN LORENZO LEY N° 016	150.000,00	150.000,00	100,00%
17	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	HOMENAJE A LA OBRA POETICA OSCAR ALFARO LEY 3682	20.000,00	20.000,00	100,00%
18	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	FESTIVIDAD DE SAN SANTIAGO LEY 3393	40.000,00	40.000,00	100,00%
19	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	MUSEO NACIONAL PALEONTOLOGICO ARQUEOLOGICO	540.200,00	540.200,00	100,00%
20	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	OFICINA TECNICA DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO	2.178.294,00	2.178.294,00	100,00%
21	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	OBSERVATORIO SANTA ANA	599.220,00	599.220,00	100,00%
22	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	COMPLEJO CONVENTUAL SAN FRANCISCO LEY 3463	100.000,00	100.000,00	100,00%

Ejecución Financiera Operaciones de Funcionamiento

ANEXO 6

*Sistema Integrado de Gestión por
Resultados*

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	62.415.441,00	40.295.179,18	64,56%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	3.015.683,00	2.157.691,86	71,55%

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	PROSOL	PROSOL	PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	357.500,00	152.043,55	42,53%
2	SEDEDE	SEDEDE	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	1.618.570,00	724.525,93	44,76%
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO-SEDEM	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO-SEDEM	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO - SEDEM	150.000,00	65.833,14	43,89%

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30- 11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	5.937.017,00	3.031.497,33	51,06%
2	CEVITA	CEVITA	CEVITA	2.067.158,00	1.098.766,96	53,15%
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG	5.447.169,00	2.952.600,02	54,20%
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	SERVICIO DPTAL DE GESTION INTEGRAL DE AGUA	400.000,00	223.899,40	55,97%
5	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS	44.273.253,00	26.577.354,89	60,03%
6	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL PROVINCIA AVILES YUNCHARA	2.574.442,00	1.749.822,44	67,97%
7	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL CERCADO	3.874.068,00	2.662.097,60	68,72%
8	SEDEGES	SEDEGES	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	765.392,00	541.151,86	70,70%
9	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL PADCAYA	3.201.201,00	2.266.682,65	70,81%
10	INTRAIID	INTRAIID	REHABILITACION Y PREVENCIÓN TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIA	403.381,00	288.125,64	71,43%

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
11	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL EL PUENTE	2.890.441,00	2.077.140,52	71,86%
12	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SAN LORENZO	2.945.496,00	2.142.569,08	72,74%
13	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SECCION PROVINCIA AVILES	2.768.487,00	2.033.400,66	73,45%
14	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE TARIJA	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE TARIJA	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	28.925.078,00	21.523.016,86	74,41%
15	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL PROVINCIA ARCE BERMEJO	5.549.664,00	4.157.957,70	74,92%

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTT	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTT	PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA	1.869.118,00	1.233.087,50	65,97%
2	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SECCION O´CONNOR	3.413.245,00	2.634.189,96	77,18%
3	SEDECA	SEDECA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	9.053.956,00	7.896.376,56	87,21%

Ejecución Física Acumulada Proyectos de Inversión Directa

ANEXO 7

*Sistema Integrado de Gestión
por Resultados*

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	FOREST. DISTRITOS MISCAS - JUNTAS DEL ROSARIO CUENCA CAMACHO	1.238.353,78	64.294,33	5,19%	15.000.000,00	64.294,33	14.935.705,67	0,00%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	Ninguno	IMPLEM. DEL AREA DE INUNDACION DE LA PRESA SELLA RUMICANCHA	2.679.063,00	0	0,00%	6.943.515,43	-	6.943.515,43	0,00%
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ Y CULTIVOS TRADICIONALES CON ENFOQUE AGROECOLOGICO PROV. O'CONNOR	480.308,00	274.526,77	57,16%	30.333.158,00	390.918,78	29.942.239,22	0,03%
4	SEDECA	SEDECA	CONST. OBRAS DE CONCLUSION ASFALTADO ISCAYACHI - FINAL COPACABANA	11.583.263,14	2.865.955,63	24,74%	55.266.229,37	2.865.955,63	52.400.273,74	0,46%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS TARIJA (PPTAR)	4.090.566,00	764.645,53	18,69%	44.659.879,00	764.645,53	43.895.233,47	1,93%
6	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	IMPLEM. DE SISTEMAS DE PROD. Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL PROVINCIA CERCADO	1.793.702,83	420.426,26	23,44%	33.316.010,26	2.247.115,18	31.068.895,08	6,83%
7	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA	10.900.000,00	0	0,00%	23.505.000,00	2.170.422,50	21.334.577,50	14,28%
8	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	MEJ. Y MANT. VIAL DEPTAL. PROVINCIA MENDEZ PRIMERA SECCION	2.411.065,13	1.559.657,64	64,69%	66.411.718,00	22.770.569,44	43.641.148,56	16,45%
9	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	MEJ. Y APOYO AL DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA PROVINCIA CERCADO	1.633.005,09	370.503,19	22,69%	35.844.641,30	2.471.386,99	33.373.254,31	21,10%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	MEJ. AMPL. SIST. RIEGO CANCHAS MAYO, CAÑAS, CRUCE ROSILLAS PADCAYA	244.386,08	244.386,07	100,00%	16.022.354,01	2.897.958,07	13.124.395,94	22,00%
11	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	IMPLEM. Y FOMENTO AL DESARROLLO PECUARIO 1RA. SECCION PROV. MENDEZ	987.308,96	547.914,15	55,50%	33.835.530,00	1.338.811,34	32.496.718,66	25,69%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11 2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	IMPLEM. SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS DISTRITOS 19,20,21,22 PROVINCIA CERCADO	8.785.256,36	4.097.672,93	46,64%	49.337.095,40	17.549.711,22	31.787.384,18	28,83%
2	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	REHAB. DE SUELOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	750.000,00	325.720,43	43,43%	42.552.787,00	13.966.319,26	28.586.467,74	29,64%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. COLISEO CERRADO DEPARTAMENTAL TARIJA	320.937,00	320.936,22	100,00%	64.790.408,35	21.230.757,99	43.559.650,36	31,87%
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	FORTAL. AL SISTEMA DE PRODUCCION Y ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	875.000,00	568.823,47	65,01%	19.734.523,40	5.523.837,49	14.210.685,91	34,79%
5	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	DESAR. DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA ZONA DEL PROY. MULTIPLE SAN JACINTO	1.410.000,00	490.119,82	34,76%	22.469.901,85	8.231.909,95	14.237.991,90	39,87%
6	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	DESAR. DE LA PRODUCCION APICOLA EN SEIS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	400.000,00	240.859,44	60,21%	12.384.472,00	3.267.188,37	9.117.283,63	40,38%
7	SEDECA	SEDECA	CONST. ASFALTADO RUTA D602-TRAMO-CR-RT-603 (CANASMORO) -RIO PILAYA SUBTRAMO 1 PUENTE UNION EUROPEA-EL ROSAL	21.316.970,00	10.285.172,95	48,25%	39.848.865,39	19.829.952,13	20.018.913,26	41,42%
8	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	PREVEN. Y ATENCION CHURA SONRISA PROVINCIA CERCADO	2.029.896,88	1.498.745,81	73,83%	8.022.192,80	3.250.159,59	4.772.033,21	42,00%
9	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	IMPLEM. PROG. DE MANEJO INTEGRADO DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL DEPTO. DE TARIJA	500.000,00	366.236,01	73,25%	29.352.736,00	8.995.387,74	20.357.348,26	42,79%
10	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	IMPLEM. CENTRO DE MEJ. GENETICO DE GAN. BOVINO EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	560.982,00	310.199,48	55,30%	17.765.649,56	8.578.352,90	9.187.296,66	45,30%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONTROL FITOSANITARIO DEL QUEMA QUEMA 2DA FASE EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	150.000,00	101.048,70	67,37%	807.346,00	353.295,38	454.050,62	45,68%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11 2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
12	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	CONTROL DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN TRANSITO AL LAGO SAN JACINTO	1.000.000,00	348945,01	34,89%	27.500.000,02	13.715.335,63	13.784.664,39	45,91%
13	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	EQUIP. MEDICO Y LABORATORIO PARA EL BANCO DE SANGRE DPTO. DE TARIJA	2.292.425,00	0	0,00%	4.978.533,00	2.263.711,00	2.714.822,00	47,73%
14	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	EQUIP. Y APOYO A LA PRODUCCION SECCION URIONDO	3.084.136,99	2275656,84	73,79%	114.520.127,41	51.571.935,00	62.948.192,41	48,69%
15	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. PAVIMENTO 180 CUADRAS - CIUDAD DE BERMEJO	6.130.698,00	2960781,9	48,29%	93.599.762,30	37.880.656,54	55.719.105,76	49,59%
16	SEDECA	SEDECA	CONST. OBRAS DE CONCLUSION MEJ. CAMINO MATADERO -TEMPORAL-S.J. NORTE-S.J. SUD -TABLADA-SAN LUI-S.J. OESTE	17.167.100,00	10.996.782,80	64,06%	36.977.425,84	18.323.454,34	18.653.971,50	49,66%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTT	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTT	RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA MEDIA DEL RIO SANTA ANA	2.044.359,23	1.382.347,34	67,62%	32.380.723,92	22.343.537,77	10.037.186,15	53,19%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	EQUIP. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS TARIJA	9.770.548,03	0	0,00%	43.702.984,00	19.806.770,79	23.896.213,21	54,14%
3	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA 2DA SECC. BERMEJO.	3.195.900,00	990.245,23	30,98%	28.259.696,00	16.563.009,10	11.696.686,90	55,05%
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	FORTALECIMIENTO. A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CITRICOS EN LA PROVINCIA ARCE DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	400.000,00	355.412,57	88,85%	15.851.763,00	8.941.568,17	6.910.194,83	61,22%
5	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	MEJ. COMPETITIVO DE LA CADENA DE MANZANILLA DE ALTURA 2DA FASE EN EL DPTO. DE TARIJA	370.000,00	183.889,39	49,70%	6.710.539,00	2.636.640,22	4.073.898,78	64,35%
6	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	DESAR. DE LA PRODUCC. DE HORTALIZAS Y BAYAS PARA LA SEGUR. ALIMENTARIA PROV. CERCADO	204.599,00	70.317,99	34,37%	993.772,40	785.633,15	208.139,25	65,68%
7	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTT	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTT	RESTAU. HIDROLOGICA FORESTAL SUBCUENCA DEL RIO TOLOMOSA	2.145.147,65	1.145.793,00	53,41%	41.931.746,97	30.804.581,55	11.127.165,42	66,57%
8	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	MEJ. Y MANT. DE LA RED VIAL DPTAL PROVINCIA ARCE	2.900.000,00	1.977.473,31	68,19%	44.468.477,76	25.140.751,69	19.327.726,07	70,36%
9	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	IMPLEM. PROGR. DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN EL DEPTO. DE TARIJA	500.000,00	247.644,83	49,53%	14.289.698,50	8.935.026,43	5.354.672,07	71,42%
10	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTT	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTT	RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA ALTA DEL RIO GUADALQUIVIR	1.527.463,12	984.103,91	64,43%	36.265.442,71	25.533.258,38	10.732.184,33	72,82%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	IMPLEM. PROG. DE CONTROL DE RABIA PARESIANTE EN EL DEPTO. DE TARIJA	127.576,00	99.260,68	77,81%	20.124.394,50	8.725.769,93	11.398.624,57	76,35%
2	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	REHAB. Y MANTENIMIENTO VIAL CAMINOS CAÑEROS BERMEJO	2.300.000,00	633.825,33	27,56%	45.937.268,00	44.110.874,16	1.826.393,84	77,13%
3	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	IMPLEM. SISTEMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ARTESANALES I SECC. PROV. ARCE	936.518,49	668.184,05	71,35%	32.503.424,24	11.526.577,69	20.976.846,55	78,39%
4	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA 1RA SECCION PROVINCIA ARCE	3.159.255,91	941.452,17	29,80%	34.909.915,00	19.001.225,82	15.908.689,18	80,12%
5	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	IMPLEM. PROG. DE ERRADICACION DE FIEBRE AFTOSA (PRODEFA) EN EL DEPTO. DE TARIJA	500.000,00	379.690,46	75,94%	43.930.340,00	21.707.429,07	22.222.910,93	80%
6	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LA PROV. O'CONNOR	5.996.900,00	5.399.299,30	90,03%	107.326.535,53	74.410.714,86	32.915.820,67	81,53%
7	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	MEJ. Y APOYO AL DESARROLLO DE LA PROD. FRUTICOLA 1RA SECCION PROVINCIA ARCE	894.357,02	606.931,69	67,86%	27.572.801,00	13.575.922,45	13.996.878,55	82,90%
8	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ESTADIO DEPARTAMENTAL GUADALUPANO PROV. O CONNOR	12.867.331,02	3.063.864,03	23,81%	45.524.197,15	38.136.243,39	7.387.953,76	85,00%
9	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	CONST. EQUIP. CENTRO PRODUC. SEMILL. AGAMICAS-CEPROSA DPTO. TARIJA	713.710,00	407.911,17	57,15%	12.184.593,41	6.625.129,61	5.559.463,80	85,31%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	REFAC. Y AMPL. SERVICIOS DE EMERG., ESTERILIZ. Y ARCHIVO CLINICO HOSP. REG. S. JUAN DE DIOS TARIJA	5.672.546,00	4.016.729,67	70,81%	59.356.460,81	21.243.672,07	38.112.788,74	86,71%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
11	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. E IMPLEMENTACION CENTROS DE CAPACITACION PRODUCTIVA AREA RURAL BERMEJO	1.160.390,24	0	0,00%	6.362.048,95	4.558.626,51	1.803.422,44	87,21%
12	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	CONTROL DE LA MALARIA EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	163.760,40	91.793,15	56,05%	7.350.606,00	3.852.246,26	3.498.359,74	87,47%
13	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL 2DA SECCION PROV. MENDEZ	2.195.948,33	1.633.799,63	74,40%	39.643.912,00	1.633.799,63	38.010.112,37	88,45%
14	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	CONTROL INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	438.174,07	187.104,55	42,70%	13.432.151,13	10.413.840,45	3.018.310,68	89,42%
15	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LA 2DA. SECC.PROV. AVILES	2.574.743,60	1.586.884,37	61,63%	46.181.352,70	44.642.479,43	1.538.873,27	90,33%
16	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	AMPL. Y MEJ. ELECTRIFICACION RURAL 2DA SECCION PROV. MENDEZ	9.528.704,71	1.989.822,37	20,88%	36.062.177,34	26.904.055,52	9.158.121,82	91,14%
17	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. INFRAEST.CORREGIMIENTO MAYOR EL PUENTE E ISCAYACHI	1.165.269,00	1.098.171,17	94,24%	7.384.181,37	6.014.960,81	1.369.220,56	91,15%
18	INTRAID	INTRAID	EQUIP. FORTALC. INSTITUTO DE DROGODEPENDENCIA Y SALUD MENTAL TARIJA	856.360,99	211.663,60	24,72%	4.812.554,00	2.233.139,11	2.579.414,89	92,70%
19	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	DESAR. DE LA PRODUCCION DEL OREGANO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	150.000,00	109.453,14	72,97%	7.833.152,00	5.038.594,87	2.794.557,13	96,07%
20	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	IMPLEM. BRIGADAS DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD COMUNIT. INTERCULT.(SAFCI) DPTO. DE TARIJA	681.697,00	466.205,09	68,39%	39.574.066,66	18.859.206,12	20.714.860,54	97,66%
21	SEDECA	SEDECA	CONST. ASFALTADO CAMINO ISCAYACHI-TOJO-CARRETAS (TRAMO FINAL COPACABANA YUNCHARA)	4.330.024,89	0,00	0,00%	83.626.980,75	68.785.660,26	14.841.320,49	100,00%
22	SUBGOBERNACION BERMEJO	Ninguno	CONST. TRAMO INTERCONEXION RUTA TARIJA - BERMEJO - CARAPARI	1.051.278,75	0,00	0,00%	59.706.782,90	28.561.021,22	31.145.761,68	100,00%
23	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	CONST. SIST. MICRORIEGO POTRERILLOS ENTRE RIOS	374.946,00	177.837,85	47,43%	11.215.446,40	11.018.338,25	197.108,15	100,00%

Ejecución Financiera Acumulada Proyectos de Inversión Directa

ANEXO 8

*Sistema Integrado de Gestión
por Resultados*

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	Ninguno	IMPLEM. DEL AREA DE INUNDACION DE LA PRESA SELLA RUMICANCHA	2.679.063,00	0,00	0,00%	6.943.515,43	0,00	6.943.515,43	0,00%
2	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	FOREST. DISTRITOS MISCAS - JUNTAS DEL ROSARIO CUENCA CAMACHO	1.238.353,78	64.294,33	5,19%	15.000.000,00	64.294,33	14.935.705,67	0,43%
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO- SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ Y CULTIVOS TRADICIONALES CON ENFOQUE AGROECOLOGICO PROV. O'CONNOR	480.308,00	274.526,77	57,16%	30.333.158,00	390.918,78	29.942.239,22	1,29%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS TARIJA (PPTAR)	4.090.566,00	764.645,53	18,69%	44.659.879,00	764.645,53	43.895.233,47	1,71%
5	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	IMPLEM. Y FOMENTO AL DESARROLLO PECUARIO 1RA. SECCION PROV. MENDEZ	987.308,96	547.914,15	55,50%	33.835.530,00	1.338.811,34	32.496.718,66	3,96%
6	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL 2DA SECCION PROV. MENDEZ	2.195.948,33	1.633.799,63	74,40%	39.643.912,00	1.633.799,63	38.010.112,37	4,12%
7	SEDECA	SEDECA	CONST. OBRAS DE CONCLUSION ASFALTADO ISLAYACHI - FINAL COPACABANA	11.583.263,14	2.865.955,63	24,74%	55.266.229,37	2.865.955,63	52.400.273,74	5,19%
8	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	IMPLEM. DE SISTEMAS DE PROD. Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL PROVINCIA CERCADO	1.793.702,83	420.426,26	23,44%	33.316.010,26	2.247.115,18	31.068.895,08	6,74%
9	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	MEJ. Y APOYO AL DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA PROVINCIA CERCADO	1.633.005,09	370.503,19	22,69%	35.844.641,30	2.471.386,99	33.373.254,31	6,89%
10	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA	10.900.000,00	0,00	0,00%	23.505.000,00	2.170.422,50	21.334.577,50	9,23%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	MEJ. AMPL. SIST. RIEGO CANCHAS MAYO, CAÑAS, CRUCE ROSILLAS PADCAYA	244.386,08	244.386,07	100,00%	16.022.354,01	2.897.958,07	13.124.395,94	18,09%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	DESAR. DE LA PRODUCCION APICOLA EN SEIS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	400.000,00	240.859,44	60,21%	12.384.472,00	3.267.188,37	9.117.283,63	26,38%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	FORTAL. AL SISTEMA DE PRODUCCION Y ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	875.000,00	568.823,47	65,01%	19.734.523,40	5.523.837,49	14.210.685,91	27,99%
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	IMPLEM. PROG. DE MANEJO INTEGRADO DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL DEPTO. DE TARIJA	500.000,00	366.236,01	73,25%	29.352.736,00	8.995.387,74	20.357.348,26	30,65%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. COLISEO CERRADO DEPARTAMENTAL TARIJA	320.937,00	320.936,22	100,00%	64.790.408,35	21.230.757,99	43.559.650,36	32,77%
5	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	REHAB. DE SUELOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	750.000,00	325.720,43	43,43%	42.552.787,00	13.966.319,26	28.586.467,74	32,82%
6	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	MEJ. Y MANT. VIAL DEPTAL. PROVINCIA MENDEZ PRIMERA SECCION	2.411.065,13	1.559.657,64	64,69%	66.411.718,00	22.770.569,44	43.641.148,56	34,29%
7	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	IMPLEM. SISTEMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ARTESANALES I SECC. PROV. ARCE	936.518,49	668.184,05	71,35%	32.503.424,24	11.526.577,69	20.976.846,55	35,46%
8	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	IMPLEM. SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS DISTRITOS 19,20,21,22 PROVINCIA CERCADO	8.785.256,36	4.097.672,93	46,64%	49.337.095,40	17.549.711,22	31.787.384,18	35,57%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	REFAC. Y AMPL. SERVICIOS DE EMERG., ESTERILIZ. Y ARCHIVO CLINICO HOSP. REG. S. JUAN DE DIOS TARIJA	5.672.546,00	4.016.729,67	70,81%	59.356.460,81	21.243.672,07	38.112.788,74	35,79%
10	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	DESAR. DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA ZONA DEL PROY. MULTIPLE SAN JACINTO	1.410.000,00	490.119,82	34,76%	22.469.901,85	8.231.909,95	14.237.991,90	36,64%
11	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	MEJ. COMPETITIVO DE LA CADENA DE MANZANILLA DE ALTURA 2DA FASE EN EL DPTO. DE TARIJA	370.000,00	183.889,39	49,70%	6.710.539,00	2.636.640,22	4.073.898,78	39,29%
12	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. PAVIMENTO 180 CUADRAS - CIUDAD DE BERMEJO	6.130.698,00	2.960.781,90	48,29%	93.599.762,30	37.880.656,54	55.719.105,76	40,47%
13	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	PREVEN. Y ATENCION CHURA SONRISA PROVINCIA CERCADO	2.029.896,88	1.498.745,81	73,83%	8.022.192,80	3.250.159,59	4.772.033,21	40,51%
14	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	IMPLEM. PROG. DE CONTROL DE RABIA PARESIANTE EN EL DEPTO. DE TARIJA	127.576,00	99.260,68	77,81%	20.124.394,50	8.725.769,93	11.398.624,57	43,36%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
15	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONTROL FITOSANITARIO DEL QUEMA QUEMA 2DA FASE EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	150.000,00	101.048,70	67,37%	807.346,00	353.295,38	454.050,62	43,76%
16	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	EQUIP. Y APOYO A LA PRODUCCION SECCION URIONDO	3.084.136,99	2.275.656,84	73,79%	114.520.127,41	51.571.935,00	62.948.192,41	45,03%
17	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	EQUIP. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS TARIJA	9.770.548,03	0	0,00%	43.702.984,00	19.806.770,79	23.896.213,21	45,32%
18	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	EQUIP. MEDICO Y LABORATORIO PARA EL BANCO DE SANGRE DPTO. DE TARIJA	2.292.425,00	0	0,00%	4.978.533,00	2.263.711,00	2.714.822,00	45,47%
19	INTRAIID	INTRAIID	EQUIP. FORTALC. INSTITUTO DE DROGODEPENDENCIA Y SALUD MENTAL TARIJA	856.360,99	211.663,60	24,72%	4.812.554,00	2.233.139,11	2.579.414,89	46,40%
20	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	IMPLEM. BRIGADAS DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD COMUNIT. INTERCULT.(SAFCI) DPTO. DE TARIJA	681.697,00	466.205,09	68,39%	39.574.066,66	18.859.206,12	20.714.860,54	47,66%
21	SUBGOBERNACION BERMEJO	Ninguno	CONST. TRAMO INTERCONEXION RUTA TARIJA - BERMEJO - CARAPARI	1.051.278,75	0,00	0,00%	59.706.782,90	28.561.021,22	31.145.761,68	47,84%
22	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	IMPLEM. CENTRO DE MEJ. GENETICO DE GAN. BOVINO EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	560.982,00	310.199,48	55,30%	17.765.649,56	8.578.352,90	9.187.296,66	48,29%
23	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	MEJ. Y APOYO AL DESARROLLO DE LA PROD. FRUTICOLA 1RA SECCION PROVINCIA ARCE	894.357,02	606.931,69	67,86%	27.572.801,00	13.575.922,45	13.996.878,55	49,24%
24	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	IMPLEM. PROG. DE ERRADICACION DE FIEBRE AFTOSA (PRODEFA) EN EL DEPTO. DE TARIJA	500.000,00	379.690,46	75,94%	43.930.340,00	21.707.429,07	22.222.910,93	49,41%
25	SEDECA	SEDECA	CONST. OBRAS DE CONCLUSION MEJ. CAMINO MATADERO - TEMPORAL-S.J. NORTE-S.J. SUD - TABLADA-SAN LUI-S.J. OESTE	17.167.100,00	10.996.782,80	64,06%	36.977.425,84	18.323.454,34	18.653.971,50	49,55%
26	SEDECA	SEDECA	CONST. ASFALTADO RUTA D602-TRAMO-CR-RT-603 (CANASMORO) -RIO PILAYA SUBTRAMO 1 PUENTE UNION EUROPEA-EL ROSAL	21.316.970,00	10.285.172,95	48,25%	39.848.865,39	19.829.952,13	20.018.913,26	49,76%
27	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	CONTROL DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN TRANSITO AL LAGO SAN JACINTO	1.000.000,00	348.945,01	34,89%	27.500.000,02	13.715.335,63	13.784.664,39	49,87%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	CONTROL DE LA MALARIA EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	163.760,40	91.793,15	56,05%	7.350.606,00	3.852.246,26	3.498.359,74	52,41%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	CONST. EQUIP. CENTRO PRODUC. SEMILL. AGAMICAS-CEPROSA DPTO. TARIJA	713.710,00	407.911,17	57,15%	12.184.593,41	6.625.129,61	5.559.463,80	54,37%
3	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA 1RA SECCION PROVINCIA ARCE	3.159.255,91	941.452,17	29,80%	34.909.915,00	19.001.225,82	15.908.689,18	54,43%
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	FORTALECIMIENTO. A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CITRICOS EN LA PROVINCIA ARCE DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	400.000,00	355.412,57	88,85%	15.851.763,00	8.941.568,17	6.910.194,83	56,41%
5	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	MEJ. YMANT. DE LA RED VIAL DPTAL PROVINCIA ARCE	2.900.000,00	1.977.473,31	68,19%	44.468.477,76	25.140.751,69	19.327.726,07	56,54%
6	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA 2DA SECC. BERMEJO.	3.195.900,00	990.245,23	30,98%	28.259.696,00	16.563.009,10	11.696.686,90	58,61%
7	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	IMPLEM. PROGR. DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN EL DEPTO. DE TARIJA	500.000,00	247.644,83	49,53%	14.289.698,50	8.935.026,43	5.354.672,07	62,53%
8	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	DESAR. DE LA PRODUCCION DEL OREGANO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	150.000,00	109.453,14	72,97%	7.833.152,00	5.038.594,87	2.794.557,13	64,32%
9	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTIT	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTIT	RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA MEDIA DEL RIO SANTA ANA	2.044.359,23	1.382.347,34	67,62%	32.380.723,92	22.343.537,77	10.037.186,15	69,00%
10	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LA PROV. O'CONNOR	5.996.900,00	5.399.299,30	90,03%	107.326.535,53	74.410.714,86	32.915.820,67	69,33%
11	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTIT	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTIT	RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA ALTA DEL RIO GUADALQUIVIR	1.527.463,12	984.103,91	64,43%	36.265.442,71	25.533.258,38	10.732.184,33	70,41%
12	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. E IMPLEMENTACION CENTROS DE CAPACITACION PRODUCTIVA AREA RURAL BERMEJO	1.160.390,24	0	0,00%	6.362.048,95	4.558.626,51	1.803.422,44	71,65%
13	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTIT	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTIT	RESTAU. HIDROLOGICA FORESTAL SUBCUENCA DEL RIO TOLOMOSA	2.145.147,65	1.145.793,00	53,41%	41.931.746,97	30.804.581,55	11.127.165,42	73,46%
14	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	AMPL. Y MEJ. ELECTRIFICACION RURAL 2DA SECCION PROV. MENDEZ	9.528.704,71	1.989.822,37	20,88%	36.062.177,34	26.904.055,52	9.158.121,82	74,60%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	CONTROL INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	438.174,07	187.104,55	42,70%	13.432.151,13	10.413.840,45	3.018.310,68	77,53%
2	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	DESAR. DE LA PRODUCC. DE HORTALIZAS Y BAYAS PARA LA SEGUR. ALIMENTARIA PROV. CERCADO	204.599,00	70.317,99	34,37%	993.772,40	785.633,15	208.139,25	79,06%
3	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. INFRAEST.CORREGIMIENTO MAYOR EL PUENTE E ISCAYACHI	1.165.269,00	1098171,17	94,24%	7.384.181,37	6.014.960,81	1.369.220,56	81,46%
4	SEDECA	SEDECA	CONST. ASFALTADO CAMINO ISCAYACHI-TOJO-CARRETAS (TRAMO FINAL COPACABANA -YUNCHARA)	4.330.024,89	0,00	0,00%	83.626.980,75	68.785.660,26	14.841.320,49	82,25%
5	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ESTADIO DEPARTAMENTAL GUADALUPANO PROV. O CONNOR	12.867.331,02	3.063.864,03	23,81%	45.524.197,15	38.136.243,39	7.387.953,76	83,77%
6	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	REHAB. Y MANTENIMIENTO VIAL CAMINOS CAÑEROS BERMEJO	2.300.000,00	633.825,33	27,56%	45.937.268,00	44.110.874,16	1.826.393,84	96,02%
7	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LA ZDA. SECC.PROV. AVILES	2.574.743,60	1.586.884,37	61,63%	46.181.352,70	44.642.479,43	1.538.873,27	96,67%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	CONST. SIST. MICRORIEGO POTRERILLOS ENTRE RIOS	374.946,00	177.837,85	47,43%	11.215.446,40	11.018.338,25	197.108,15	98,24%

Ejecución Física Acumulada Proyectos de Inversión Delegada

ANEXO 9

*Sistema Integrado de Gestión
por Resultados*

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	CONST. OBRAS DE ALMACENAMIENTO, PARA USO OPTIMO DEL AGUA EN CINCO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	0	0	0,00%	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	CONST. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PARA UN AFLUENTE DEL RIO HUACATA	100.000,00	0	0,00%	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00%
3	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	REHAB. DE LA CASA Y CUEVAS DE MOTO MENDEZ EN CARACHIMAYO	1.797.629,00	0	0,00%	7.788.141,66	0,00	7.788.141,66	0,00%
4	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. PRESA EL ROSAL	0,00	0	0,00%	980.628,00	0,00	980.628,00	0,00%
5	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. CASA DEL ADULTO MAYOR 1RA SECC. PROV. MENDEZ	0,00	0	0,00%	90.650,34	0,00	90.650,34	0,00%
6	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR EN LA PRIMERA SECCIÓN DE LA PROVINCIA MENEZ	74000	0	0,00%	365.620,00	0,00	365.620,00	0,00%
7	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. CASA DE LA MUJER PRIMERA SECCION PROV. MENDEZ	100.000,00	0	0,00%	164.923,20	0,00	164.923,20	0,00%
8	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. DE PRESA ALTO DE CAJAS	200.000,00	200000	100,00%	1.370.533,00	200.000,00	1.170.533,00	0,00%
9	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. GAVIONES RIO GUADALQUIVIR Y AFLUENTES	3.600.000,00	0	0,00%	108.708.304,34	0,00	108.708.304,34	0,00%
10	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. Y MEJORMIENTO ESTANQUES CANTON CURQUI	392.491,64	0	0,00%	392.491,64	0,00	392.491,64	0,00%
11	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	MEJ. Y APERTURA CAMINO RUPASKA - TOJO	2.228.290,00	0	0,00%	11.141.193,57	0,00	11.141.193,57	0,00%
12	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. ASFALTADO LA HIGUERA - COLON SUD	100.084,73	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
13	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	Ninguno	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO PALOS BLANCOS	1.000.000,00	0	0,00%	16.576.735,02	11.475.385,10	5.101.349,92	0,00%
14	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. INFRAEST. PRODUCTIVA CHIQUIACA MARGEN IZQUIERDO	318.062,00	318061,6	100,00%	318.062,00	318.061,60	0,40	0,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
15	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO SAN ANDRÉS TARIJA	369.119,00	0	0,00%	18.353.192,76	0,00	18.353.192,76	0,00%
16	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. PUENTE VEHICULAR PINOS SUD - CALDERILLAS PASAJES	2.042.481,00	0	0,00%	7.712.399,41	0,00	7.712.399,41	0,00%
17	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	AMPL. Y READECUACION CAMPO FERIA SAN JACINTO	4.355.129,29	0	0,00%	6.047.327,55	0,00	6.047.327,55	0,00%
18	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	AMPL. INFRAESTRUCTURA INSTITUTO TECNOLÓGICO TARIJA- D8 TARIJA	150.146,00	0	0,00%	150.146,00	0,00	150.146,00	0,00%
19	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION CASA FISCAL CIUDAD DE TARIJA	450.000,00	0	0,00%	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%
20	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA ERQUIZ.	320.000,00	0	0,00%	825.550,00	0,00	825.550,00	0,00%
21	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA COIMATA	380.000,00	0	0,00%	837.382,39	90.740,00	746.642,39	0,00%
22	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA TARIJA - SECTOR MULTISECTORIAL	300.000,00	0	0,00%	6.815.810,00	0,00	6.815.810,00	0,00%
23	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. Y ESTRUCTURACION DEL PARQUE OLIMPICO TARIJA	350.000,00	0	0,00%	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
24	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. MEJORAMIENTO Y REFACCION STADIUM IV CENTENARIO TARIJA FASE II	8.127.037,00	0	0,00%	17.709.998,74	0,00	17.709.998,74	0,00%
25	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	RESTAU. TEMPLO CATEDRAL METROPOLITANA DE TARIJA	820.919,00	0	0,00%	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00%
26	ADMINISTRACION CENTRAL	Ninguno	PROSP. GEOLOGICA MINERA EN AREAS ALEDAÑAS A ENTRE RIOS DEPTO. DE TARIJA	62.342,75	0	0,00%	623.427,50	0,00	623.427,50	0,00%
27	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONTROL DE OLORES EN LAGUNAS DE ESTABILIZACION DE SAN LUIS	10.000.000,00	0,00	0,00%	32.950.000,00	0,00	32.950.000,00	0,00%
28	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	IMPLEMENTACION PROGRAMA INTEGRAL	3.998.483,00	0	0,00%	3.998.483,00	0,00	3.998.483,00	0,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
29	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO DISTRITO COPACABANA 2DA FASE	3.802.519,00	2.814.847,44	74,03%	17.483.790,00	2.814.847,44	14.668.942,56	7,44%
30	SUBGOBERNACIÓN O'CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. ASFALTADO QUEBRADA LAS VACAS - SALINAS PROV. O'CONNOR	869.604,00	0	0,00%	33.827.341,05	0,00	33.827.341,05	13,43%
31	SUBGOBERNACIÓN O'CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. ASFALTADO TRAMO SALADITO -TIMBOY - TABASAI	24.652.463,00	23248653,66	94,31%	254.336.610,07	37.845.116,21	216.491.493,86	14,41%
32	SUBGOBERNACIÓN O'CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. PUENTE RIO PAJONAL EN EL TRAMO ENTRE RIOS- SALINAS PROV. O'CONNOR	4.700.000,00	0,00	0,00%	42.643.503,59	3.556.916,46	39.086.587,13	20,81%
33	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PUEBLOS INDÍGENAS	IMPLEM. RAZA DÜROC PORCINA EN COMUNIDADES DEL PUEBLO WEENHAYEK	800.000,00	0,00	0,00%	5.079.650,09	325.184,28	4.754.465,81	21,50%
34	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	AMPL. PRESA DE TIERRA EL CEMENTERIO	1.857.534,00	1.761.782,10	94,85%	28.267.484,63	1.761.782,10	26.505.702,53	23,40%
35	SUBGOBERNACION BERMEJO	Ninguno	APOYO FOM. A LA TRANSF Y COMERC DE CITRICOS BJO	4.881.938,52	1.500.000,00	30,73%	70.989.190,53	62.737.105,60	8.252.084,93	24,91%
36	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. CIRCUITO ELECTRICO SAN LORENZO	57.234,00	0,00	0,00%	190.780,00	47.695,00	143.085,00	25,00%
37	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. Y EQUIPAMIENTO OFICINAS SETAR BERMEJO	100.000,00	0	0,00%	7.890.662,80	886.744,54	7.003.918,26	25,25%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. ASFALTADO MONTE MENDEZ-SAN MATEO	6.400.000,00	6.399.999,23	100,00%	21.815.363,27	6.399.999,23	15.415.364,04	28,00%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTI	CONST. SIST. DE RIEGO ERQUIS (SAN LORENZO)	26.969,80	26.969,60	100,00%	8.005.160,00	971.590,66	7.033.569,34	28,00%
3	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	Ninguno	CONST. INFRAEST.PRODUCTIVA CANT. SUARURO Y TARUPAYO PROV. O'CONNOR	1.274.930,00	1.274.930,00	100,00%	23.859.686,07	2.993.033,98	20.866.652,09	28,87%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. Y EQUIPAMIENTO ONCOLOGICO TARIJA	35.795.275,21	12.958.511,96	36,20%	138.812.956,43	30.029.038,40	108.783.918,03	30,73%
5	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	MEJ. Y AMPLIACION CAMINO CRUCE SANTA ANA LA VIEJA - LADERAS NORTE	300.000,00	210000	70,00%	300.000,00	210.000,00	90.000,00	33,00%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	CONST. SIST. DE RIEGO CUENCA MARQUIRI PROVINCIA MENDEZ(SAN LORENZO)	139.821,37	0	0,00%	7.133.350,00	1.946.395,00	5.186.955,00	35,00%
7	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	MEJ. Y AMPL. SIST ELECT FASE II 1RA SEC PROV. ARCE	6.283.815,00	0	0,00%	40.282.396,53	15.974.683,99	24.307.712,54	38,00%
8	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ASFALTADO CAMINO ENTRE RIOS - QDA. LAS VACAS	10.000.000,00	0,00	0,00%	89.593.893,65	56.275.045,48	33.318.848,17	39,11%
9	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES HUAYCO GRANDE NUEVA ESPERANZA	12.100.000,00	8867695,04	73,29%	40.312.231,42	12.261.245,08	28.050.986,34	41,00%
10	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	CONST. DE DEFENSIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA	1.500.000,00	0,00	0,00%	10.595.261,12	4.383.733,78	6.211.527,34	44,29%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. HOSPITAL MATERNO INFANTIL TARIJA	31.000.000,00	29.096.707,99	93,86%	128.591.224,59	29.529.551,21	99.061.673,38	45,50%
12	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. Y EQUIP.CENTRO DE APOYO INTEGRAL COMUNIDAD SANTA ANA LA VIEJA	4.517.597,00	2.093.983,43	46,35%	5.960.728,33	2.093.983,43	3.866.744,90	49,65%
13	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	CONST. SISTEMA DE RIEGO TACUARA (PADCAYA)	106.706,94	9.868,76	9,25%	14.141.046,00	3.487.828,67	10.653.217,33	50,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO TRANCAS	602.196,00	581.428,00	96,55%	3.238.982,84	581.428,00	2.657.554,84	55,20%
2	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. OFICINAS DE LA GOBERNACION DE TARIJA SECCION URIONDO	3.259.219,50	1.991.082,05	61,09%	27.870.946,01	11.127.061,61	16.743.884,40	55,70%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. OBRAS DE CONCLUSION PISCINA OLIMPICA DEPARTAMENTAL TARIJA	29.630.835,00	15.937.892,67	53,79%	49.526.511,26	24.613.553,44	24.912.957,82	55,72%
4	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	IMPLEM. DE SISTEMAS AGROSILVOPASTORIL CANT. LA CUEVA, SALINAS Y CHIQUIACA PROV. OCONNOR	3.473.584,03	449.132,66	12,93%	30.636.509,05	17.784.192,14	12.852.316,91	55,95%
5	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	APOYO PRODUC. GANADO BOVINO CANTON IPAGUAZU Y CHIMEO PROV. OCONNOR	2.911.246,32	672.403,44	23,10%	15.882.933,76	7.219.732,80	8.663.200,96	56,96%
6	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ELECTRIF. RURAL LOMA ALTA - PAMPA REDONDA	1.151.457,00	1.148.537,00	99,75%	10.744.972,72	10.076.550,62	668.422,10	58,81%
7	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES DE ERQUIS	2.500.000,00	2.499.940,57	100,00%	6.989.248,20	2.849.940,57	4.139.307,63	59,78%
8	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	Ninguno	CONST. SISTEMA DE RIEGO TOMATAS GRANDE	92.716,00	0,00	0,00%	324.506,00	139.073,72	185.432,28	60,00%
9	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD SELLA CERCADO	3.171.738,00	1275661,94	40,22%	7.729.809,35	4.527.294,90	3.202.514,45	60,00%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	MEJ. AMPL. SIST. MICRORIEGO HUAYCO EL TIGRE (ENTRE RIOS)	262.786,42	235.214,40	89,51%	4.745.466,00	1.425.494,27	3.319.971,73	60,00%
11	SEDECA	SEDECA	CONST. CAMINO PUERTA DEL CHACO - CANALETAS KM 9+504.6 A KM 24+840.6	80.000.000,00	61.901.055,03	77,38%	202.596.457,00	123.434.315,70	79.162.141,30	61,30%
12	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE PRESA HUACATA VALLE CENTRAL DE TARIJA	1.458.269,00	947.874,71	65,00%	1.458.269,00	947.874,71	510.394,29	61,75%
13	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMAS DE RIEGO PROVINCIA CERCADO FASE I COMUNIDAD PANTIPANPA	5.645.490,20	0,00	0,00%	5.207.484,26	0,00	5.207.484,26	61,96%
14	SUBGOBERNACION BERMEJO	Ninguno	CONST. OBRAS DE PROTEC. AREAS PRODUC. MARGENES RIO BJO. Y RIO GRANDE DE TARIJA	112.617,00	0,00	0,00%	51.562.110,90	21.906.336,15	29.655.774,75	62,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
15	SEDECA	SEDECA	CONST. CAMINO SAN JOSECITO - EL PESCADO	2.630.238,00	2.630.238,00	100,00%	59.651.890,24	40.570.302,84	19.081.587,40	67,16%
16	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	APOYO PRODUC. GANADO BOVINO CANTON TARUPAYO Y SUARURO PROV. OCONNOR	4.911.303,04	524.012,18	10,67%	27.663.437,01	13.802.601,20	13.860.835,81	67,96%
17	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. INFRAEST.PRODUCTIVA CANT. DE IPAGUAZU Y CHIMEO PROV. O'CONNOR	70.000,00	69.797,28	99,71%	20.410.949,95	12.998.918,68	7.412.031,27	68,00%
18	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL EL PUENTE	10.660.000,00	9.039.719,19	84,80%	20.310.248,33	13.542.897,42	6.767.350,91	70%
19	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. Y EQUIPAMIENTO CASA DE LA MUJER PROV. O'CONNOR	2.729.429,00	2.684.255,84	98,34%	26.013.591,80	6.974.330,86	19.039.260,94	70,44%
20	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. INFRASTRUCT.PRODUCT. SAN JOSECITO PROV. O'CONNOR	1.197.787,00	112.247,45	9,37%	45.031.173,82	28.661.935,00	16.369.238,82	70,84%
21	SUBGERNACION URIONDO	Ninguno	MEJ. SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA DE ARRIBA (CONCEPCION)	552.433,05	0,00	0,00%	5.167.836,00	3.696.754,70	1.471.081,30	70,84%
22	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD TOLOMOSA NORTE	1.738.181,00	286.036,52	16,46%	4.369.871,49	2.460.260,86	1.909.610,63	70,84%
23	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	Ninguno	CONST. SIST. RIEGO SAN ANTONIO STA. CLARA	465.170,00	0,00	0,00%	2.488.580,85	1.519.020,24	969.560,61	70,84%
24	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. COLEGIO INTERNADO TREMENTINAL 1º SECCION PROV. ARCE	2.521.963,00	2.501.102,23	99,17%	13.868.197,20	8.382.421,04	5.485.776,16	70,84%
25	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. CAMPUS AGROPECUARIO Y CULTURAL PROV. O'CONNOR	3.031.793,93	1.050.010,00	34,63%	45.739.536,01	36.122.389,36	9.617.146,65	70,84%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. PAVIMENTO AEROPUERTO - CAMPO GRANDE - BERMEJO	2.075.704,49	0	0,00%	22.875.014,84	13.674.157,04	9.200.857,80	77,66%
2	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. INFRAESTRUCTURA CIRCUITO TURISTICO 2DA. SECC. PROV. MENDEZ	1.000.000,00	239.411,20	23,94%	4.318.989,25	2.158.400,45	2.160.588,80	79,57%
3	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	INSTAL. SERVICIOS COMPLEMENT. PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS BERMEJO	400.000,00	0	0,00%	6.939.136,91	4.402.293,07	2.536.843,84	80,00%
4	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ASFALTADO CARRETERA CARAPARI-PALOS BLANCOS TRAMO CHOERE-PALOS BLANCOS	50.048.531,00	43.440.914,25	86,80%	115.687.653,36	87.073.675,06	28.613.978,30	82,55%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA CHAMATA	285.680,00	0,00	0,00%	952.265,00	285.679,50	666.585,50	85,43%
6	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. ASFALTADO CRUCE PANAMERICANO LA CHOZA - SAN ISIDRO	12.000.000,00	9129738,8	76,08%	48.133.664,07	28.951.493,11	19.182.170,96	86,00%
7	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. SISTEMA DE ADUCCION PROVINCIA ARCE BERMEJO	15.132.780,00	14.535.489,06	96,05%	137.599.995,37	111.333.235,86	26.266.759,51	91,00%
8	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	ESTUDIO TESA CONST. SISTEMA DE RIEGO YEMBALSES DE REGULACION CHAGUAYA-COLON	600.000,00	600.000,00	100,00%	1.998.873,32	600.000,00	1.398.873,32	94,00%
9	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. SISTEMA DE RIEGO GUADALQUIVIR-CENAVIT-CALAMUCHITA	35.401.622,34	25343453,17	71,59%	209.387.457,59	152.912.301,05	56.475.156,54	94,57%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA SANTA ANA	180.000,00	0	0,00%	600.000,00	420.000,00	180.000,00	94,85%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA YESERA NORTE	144.000,00	0,00	0,00%	480.000,00	144.000,00	336.000,00	95,04%
12	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. PUENTE VEHICULAR YESERA-CHIGUAYPOLLA	3.439.034,49	3272290,04	95,15%	4.204.484,98	3.272.290,04	932.194,94	95,34%
13	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. SISTEMA DE RIEGO CARACHIMAYO	1.728,00	0	0,00%	6.091.269,19	4.524.874,22	1.566.394,97	96,15%
14	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	Ninguno	AMPL. SISTEMA DE RIEGO SAN ANTONIO SANTA CLARA	101.850,00	0,00	0,00%	7.708.170,05	2.938.616,20	4.769.553,85	98,00%
15	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS	CONST. Y ADECUACION TECNICA AL SIN DEL SISTEMA CENTRAL TARIJA	11.027.591,00	0	0,00%	185.883.135,62	15.000.000,00	170.883.135,62	98,33%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
16	SEDECA	SEDECA	CONST. ASFALTADO CAMINO T. VIAL CARAPARI-EL CAJON-BERMEJO SUB T. COLONIA LINARES -P. S. TELMO-P. S. ANTONIO	18.755.134,45	8790929,24	46,87%	213.424.210,42	178.871.270,50	34.552.939,92	99,95%
17	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. SISTEMA DE RIEGO SELLA MENDEZ	0,00	0	0,00%	245.000,00	145.000,00	100.000,00	100,00%
18	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. DE GAVIONES HUACATA	12.842,00	0	0,00%	114.297,13	114.297,13	0,00	100,00%
19	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. ESTANQUES COM. ZONA ALTA DEL RIO PILAYA	603.856,78	0,00	0,00%	15.708.898,06	15.122.299,75	586.598,31	100,00%
20	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. PARQUE HISTORICO CULTURAL OSCAR ALFARO EN LA PRIMERA SECCION PROV. MENDEZ	1.000,00	0,00	0,00%	325.000,00	250.000,00	75.000,00	100,00%
21	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CESPED SINETICO EN TOMATITAS	265.271,50	257.269,57	96,98%	2.209.186,56	2.058.844,06	150.342,50	100,00%
22	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. SISTEMAS DE RIEGO HUACATA ZAPATERA	56.000,00	56.000,00	100,00%	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00%
23	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. YEQUIP. CIRCUITO TURISTICO EUSTAQUIO MENDEZ SAN LORENZO	113.400,00	97.200,00	85,71%	324.000,00	307.800,00	16.200,00	100,00%
24	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	MEJ. Y CONST. SISTEMA DE RIEGO PRIMERA SECCION PROVINCIA MENDEZ FASE II	11.390,00	11.389,56	100,00%	497.118,44	399.308,00	97.810,44	100,00%
25	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	Ninguno	CONST. DOBLE VIA MOTO MENDEZ TOMATITAS SAN LORENZO	335.186,00	0	0,00%	1.685.806,00	945.433,27	740.372,73	100,00%
26	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. INSTITUTO TECNOLOGICO 2 DE AGOSTO ISLAYACHI	398.981,87	398.981,87	100,00%	2.125.955,38	2.125.955,38	0,00	100,00%
27	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. CAMINO ASFALTADO IRLALAYA - EL PUENTE - LA VERDIGUERA	17.927.488,39	1437500	8,02%	166.452.923,94	146.176.294,56	20.276.629,38	100,00%
28	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	MEJ. Y AMPLIAC. SIST. DE RIEGO DISTR.5 QUEBRADA HONDA	1.384.977,58	275.694,00	19,91%	27.161.660,00	25.650.138,52	1.511.521,48	100,00%
29	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	AMPL. ELECTRIFICACION RURAL 2DA. SECCION PROV. AVILES	123.025,70	0,00	0,00%	35.657.034,85	23.838.976,16	11.818.058,69	100,00%
30	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. LABORATORIO INSTITUTO TECNOLOGICO URIONDO	411.464,91	410.476,51	99,76%	1.766.850,73	1.766.850,72	0,01	100,00%
31	SUBGERNACION URIONDO	Ninguno	AMPL. SISTEMA DE RIEGO CONCEPCION (CANAL DEL MEDIO)	71.230,65	0	0,00%	7.484.170,53	7.413.019,06	71.151,47	100,00%
32	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	Ninguno	CONST. ASFALTADO CHALAMARCA - ALISOS DEL CARMEN	139.419,00	0,00	0,00%	348.533,00	209.113,20	139.419,80	100,00%
33	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	Ninguno	CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE NOGALITOS MUNICIPIO DE PADCAYA	149.165,00	0	0,00%	18.446.111,34	18.296.946,34	149.165,00	100,00%
34	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. CANCHA DEPORTIVA CON CESPED SINIETICO HUACANQUI	373.474,31	373474,31	100,00%	1.869.053,25	1.869.053,25	0,00	100,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
35	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. INFRAEST. PARA FORTALECIM. Y PROM. TURISTICA COMUNIT. PADCAYA	8.111.769,07	2.480.737,51	30,58%	45.000.994,53	30.755.204,30	14.245.790,23	100,00%
36	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	AMPL. INFRAESTRUCTURA HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA 3ER NIVEL BERMEJO	97.759,32	97.759,32	100,00%	1.946.846,71	1.946.846,71	0,00	100,00%
37	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. E IMPLEMENTACION GENERADORES DE ENERGIA ZONA PRODUCTIVA BERMEJO	4.157.619,58	0,00	0,00%	21.438.681,65	17.281.062,07	4.157.619,58	100,00%
38	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS GRANJA PISCICOLA - BERMEJO	2.273.281,98	0,00	0,00%	5.156.329,54	2.545.582,83	2.610.746,71	100,00%
39	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	IMPLEM. SISTEMA CIUDAD SEGURA BERMEJO	0,00	0	0,00%	21.249.392,00	20.880.000,00	369.392,00	100,00%
40	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	Ninguno	CONST. ASFALTADO CRUCE RUTA 11 (SAN SIMON)- LOS NARANJOS PROV. OCONNOR	59.704,00	59704	100,00%	59.704,00	59.704,00	0,00	100,00%
41	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD SAN MATEO	37.131,00	37.130,83	100,00%	6.053.535,78	6.053.535,77	0,01	100,00%
42	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. CANCHA DE CESPED SINTETICO EN SELLA CERCADO DE LA CIUDAD DE TARIJA	486.964,58	486.964,54	100,00%	2.114.261,70	2.114.261,70	0,00	100,00%
43	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	REHAB. DE AREAS DEGRADADAS EN LA PROV. CERCADO	90.613,00	0	0,00%	302.043,00	211.430,10	90.612,90	100,00%
44	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD PANTIPAMPA CHURQUIS	2.044.456,32	0	0,00%	3.942.645,31	2.727.747,69	1.214.897,62	100,00%
45	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. PUENTE VEHICULAR TOLOMOSA OESTE	776.892,76	776.892,76	100,00%	5.533.676,29	5.346.383,24	187.293,05	100,00%
46	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. OBRAS DE CONCLUSION VELODROMO OLIMPICO DEPARTAMENTAL TARIJA	3.872.963,00	3.872.962,47	100,00%	26.400.148,71	24.612.786,66	1.787.362,05	100,00%
47	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA GAMONEDA	259.041,00	194.280,60	75,00%	647.602,00	388.561,20	259.040,80	100,00%
48	ADMINISTRACION CENTRAL	Ninguno	CONST. CENTRO DE TECNOLOGIAS APROPIADAS COMUNIDAD YUTICANCHA	45.419,00	0,00	0,00%	959.404,01	913.985,98	45.418,03	100,00%
49	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE BASQUETBALL TARIJA	746.654,16	0,00	0,00%	18.359.122,07	16.872.702,08	1.486.419,99	100,00%
50	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. PRESA RIO POTRERO	640.099,00	240.000,00	37,49%	1.200.000,00	480.000,00	720.000,00	100,00%
51	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. DEFENSIVOS RIO PAJCHANI	1.137.014,58	300.000,00	26,38%	2.278.750,80	994.729,02	1.284.021,78	100,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
52	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	MEJ. Y CONST. SISTEMA DE RIEGO IRA SECC. PROV. MENDEZ	4.481.575,40	1.392.437,30	31,07%	17.161.683,57	13.899.879,26	3.261.804,31	100,00%
53	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO ZONA ALTA DEPTO. DE TARIJA	1.440.280,56	313.650,00	21,78%	15.158.677,90	15.059.929,30	98.748,60	100,00%
54	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. ATAJADOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS	12.000.000,00	11.811.827,74	98,43%	43.519.066,14	38.343.428,25	5.175.637,89	100,00%
55	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. CAMPUS UNIVERSITARIO U.A.J.M.S MODULO II - FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS - BERMEJO	3.741.926,00	3.578.358,94	95,63%	21.132.888,01	16.579.162,45	4.553.725,56	100,00%
56	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD LAZARETO	3.586.856,00	3.231.218,39	90,08%	6.775.325,33	6.419.689,36	355.635,97	100,00%
57	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. DE ALBERGUE PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN TARIJA	1.558.490,00	225.374,55	14,46%	7.708.533,89	7.375.422,13	333.111,76	100,00%
58	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA PRESA CALDERAS	120.000,00	90.000,00	75,00%	300.000,00	180.000,00	120.000,00	100,00%
59	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS SISTEMA DE RIEGO PRESA EL MOLINO	480.000,00	288.000,00	60,00%	480.000,00	288.000,00	192.000,00	100,00%
60	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA PRESA PAYUYO	76.221,00	57.165,30	75,00%	190.551,00	114.330,30	76.220,70	100,00%
61	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA LEON CANCHA	144.000,00	0,00	0,00%	480.000,00	144.000,00	336.000,00	100,00%

Ejecución Financiera Acumulada Proyectos de Inversión Delegada

ANEXO 10

*Sistema Integrado de Gestión
por Resultados*

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	CONST. OBRAS DE ALMACENAMIENTO, PARA USO OPTIMO DEL AGUA EN CINCO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	0	0	0,00%	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	CONST. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PARA UN AFLUENTE DEL RIO HUACATA	100.000,00	0	0,00%	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00%
3	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	REHAB. DE LA CASA Y CUEVAS DE MOTO MENDEZ EN CARACHIMAYO	1.797.629,00	0	0,00%	7.788.141,66	0,00	7.788.141,66	0,00%
4	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. PRESA EL ROSAL	0,00	0	0,00%	980.628,00	0,00	980.628,00	0,00%
5	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. CASA DEL ADULTO MAYOR 1RA SECC. PROV. MENDEZ	0,00	0	0,00%	90.650,34	0,00	90.650,34	0,00%
6	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR EN LA PRIMERA SECCIÓN DE LA PROVINCIA MÉNDEZ	74000	0	0,00%	365.620,00	0,00	365.620,00	0,00%
7	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. CASA DE LA MUJER PRIMERA SECCION PROV. MENDEZ	100.000,00	0	0,00%	164.923,20	0,00	164.923,20	0,00%
8	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. GAVIONES RIO GUADALQUIVIR Y AFLUENTES	3.600.000,00	0	0,00%	108.708.304,34	0,00	108.708.304,34	0,00%
9	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. Y MEJORMIENTO ESTANQUES CANTON CURQUI	392.491,64	0	0,00%	392.491,64	0,00	392.491,64	0,00%
10	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	MEJ. Y APERTURA CAMINO RUPASKA - TOJO	2.228.290,00	0	0,00%	11.141.193,57	0,00	11.141.193,57	0,00%
11	SUBGOBERNACIÓN URIONDO	SUBGOBERNACIÓN URIONDO	CONST. ASFALTADO LA HIGUERA - COLON SUD	100.084,73	0	0,00%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
12	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO SAN ANDRES TARIJA	369.119,00	0	0,00%	18.353.192,76	0,00	18.353.192,76	0,00%
13	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. PUENTE VEHICULAR PINOS SUD - CALDERILLAS PASAJES	2.042.481,00	0	0,00%	7.712.399,41	0,00	7.712.399,41	0,00%
14	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	AMPL. Y READECUACION CAMPO FERIA SAN JACINTO	4.355.129,29	0	0,00%	6.047.327,55	0,00	6.047.327,55	0,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
15	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	AMPL. INFRAESTRUCTURA INSTITUTO TECNOLÓGICO TARIJA- D8 TARIJA	150.146,00	0	0,00%	150.146,00	0,00	150.146,00	0,00%
16	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION CASA FISCAL CIUDAD DE TARIJA	450.000,00	0	0,00%	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%
17	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA ERQUIZ.	320.000,00	0	0,00%	825.550,00	0,00	825.550,00	0,00%
18	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA TARIJA - SECTOR MULTISECTORIAL	300.000,00	0	0,00%	6.815.810,00	0,00	6.815.810,00	0,00%
19	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. Y ESTRUCTURACION DEL PARQUE OLIMPICO TARIJA	350.000,00	0	0,00%	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
20	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. MEJORAMIENTO Y REFACCION STADIUM IV CENTENARIO TARIJA FASE II	8.127.037,00	0	0,00%	17.709.998,74	0,00	17.709.998,74	0,00%
21	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	RESTAU. TEMPLO CATEDRAL METROPOLITANA DE TARIJA	820.919,00	0	0,00%	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00%
22	ADMINISTRACION CENTRAL	Ninguno	PROSP. GEOLOGICA MINERA EN AREAS ALEDAÑAS A ENTRE RIOS DEPTO. DE TARIJA	62.342,75	0	0,00%	623.427,50	0,00	623.427,50	0,00%
23	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONTROL DE OLORES EN LAGUNAS DE ESTABILIZACION DE SAN LUIS	10.000.000,00	0	0,00%	32.950.000,00	0,00	32.950.000,00	0,00%
24	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	IMPLEMENTACION PROGRAMA INTEGRAL	3.998.483,00	0	0,00%	3.998.483,00	0,00	3.998.483,00	0,00%
25	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ASFALTADO QUEBRADA LAS VACAS - SALINAS PROV. O'CONNOR	869.604,00	0	0,00%	33.827.341,05	0,00	33.827.341,05	0,00%
26	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMAS DE RIEGO PROVINCIA CERCADO FASE I COMUNIDAD PANTI PANPA	5.645.490,20	0,00	0,00%	5.207.484,26	0,00	5.207.484,26	0,00%
27	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	AMPL. PRESA DE TIERRA EL CEMENTERIO	1.857.534,00	1761782,1	94,85%	28.267.484,63	1.761.782,10	26.505.702,53	6,23%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
28	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PUEBLOS INDÍGENAS	IMPLEM. RAZA DÚROC PORCINA EN COMUNIDADES DEL PUEBLO WEENHAYEK	800.000,00	0,00	0,00%	5.079.650,09	325.184,28	4.754.465,81	6,40%
29	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS	CONST. Y ADECUACION TECNICA AL SIN DEL SISTEMA CENTRAL TARIJA	11.027.591,00	0	0,00%	185.883.135,62	15.000.000,00	170.883.135,62	8,07%
30	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. PUENTE RIO PAJONAL EN EL TRAMO ENTRE RIOS-SALINAS PROV. O'CONNOR	4.700.000,00	0,00	0,00%	42.643.503,59	3.556.916,46	39.086.587,13	8,34%
31	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA COIMATA	380.000,00	0,00	0,00%	837.382,39	90.740,00	746.642,39	10,84%
32	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. Y EQUIPAMIENTO OFICINAS SETAR BERMEJO	100.000,00	0	0,00%	7.890.662,80	886.744,54	7.003.918,26	11,24%
33	ADMINISTRACION CENTRAL	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS- PERTI	CONST. SIST. DE RIEGO ERQUIS (SAN LORENZO)	26.969,80	26969,6	100,00%	8.005.160,00	971.590,66	7.033.569,34	12,14%
34	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	Ninguno	CONST. INFRAEST.PRODUCTIVA CANT. SUARURO Y TARUPAYO PROV. O'CONNOR	1.274.930,00	1274930	100,00%	23.859.686,07	2.993.033,98	20.866.652,09	12,54%
35	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. DE PRESA ALTO DE CAJAS	200.000,00	200000	100,00%	1.370.533,00	200.000,00	1.170.533,00	14,59%
36	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ASFALTADO TRAMO SALADITO - TIMBOY - TABASAI	24.652.463,00	23.248.653,66	94,31%	254.336.610,07	37.845.116,21	216.491.493,86	14,88%
37	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO DISTRITO COPACABANA 2DA FASE	3.802.519,00	2.814.847,44	74,03%	17.483.790,00	2.814.847,44	14.668.942,56	16,10%
38	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO TRANCAS	602.196,00	581.428,00	96,55%	3.238.982,84	581.428,00	2.657.554,84	17,95%
39	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. Y EQUIPAMIENTO ONCOLOGICO TARIJA	35.795.275,21	12.958.511,96	36,20%	138.812.956,43	30.029.038,40	108.783.918,03	21,63%
40	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. HOSPITAL MATERNO INFANTIL TARIJA	31.000.000,00	29.096.707,99	93,86%	128.591.224,59	29.529.551,21	99.061.673,38	22,96%
41	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	CONST. SISTEMA DE RIEGO TACUARA (PADCAYA)	106.706,94	9.868,76	9,25%	14.141.046,00	3.487.828,67	10.653.217,33	24,66%
42	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. CIRCUITO ELECTRICO SAN LORENZO	57.234,00	0	0,00%	190.780,00	47.695,00	143.085,00	25,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
1	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. Y EQUIPAMIENTO CASA DE LA MUJER PROV. O'CONNOR	2.729.429,00	2.684.255,84	98,34%	26.013.591,80	6.974.330,86	19.039.260,94	26,81%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	CONST. SIST. DE RIEGO CUENCA MARQUIRI PROVINCIA MENDEZ(SAN LORENZO)	139.821,37	0	0,00%	7.133.350,00	1.946.395,00	5.186.955,00	27,29%
3	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. ASFALTADO MONTE MENDEZ-SAN MAIEO	6.400.000,00	6.399.999,23	100,00%	21.815.363,27	6.399.999,23	15.415.364,04	29,34%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA CHAMATA	285.680,00	0	0,00%	952.265,00	285.679,50	666.585,50	30,00%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA YESERA NORTE	144.000,00	0	0,00%	480.000,00	144.000,00	336.000,00	30,00%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA LEON CANCHA	144.000,00	0	0,00%	480.000,00	144.000,00	336.000,00	30,00%
7	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	ESTUDIO TESA CONST. SISTEMA DE RIEGO Y EMBALSES DE REGULACION CHAGUAYA-COLON	600.000,00	600.000,00	100,00%	1.998.873,32	600.000,00	1.398.873,32	30,02%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	MEJ. AMPL. SIST. MICRORIEGO HUAYCO EL TIGRE (ENTRE RIOS)	262.786,42	235.214,40	89,51%	4.745.466,00	1.425.494,27	3.319.971,73	30,04%
9	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES HUAYCO GRANDE NUEVA ESPERANZA	12.100.000,00	8.867.695,04	73,29%	40.312.231,42	12.261.245,08	28.050.986,34	30,42%
10	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. Y EQUIP. CENTRO DE APOYO INTEGRAL COMUNIDAD SANTA ANA LA VIEJA	4.517.597,00	2.093.983,43	46,35%	5.960.728,33	2.093.983,43	3.866.744,90	35,13%
11	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	Ninguno	AMPL. SISTEMA DE RIEGO SAN ANTONIO SANTA CLARA	101.850,00	0	0,00%	7.708.170,05	2.938.616,20	4.769.553,85	38,12%
12	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	MEJ. Y AMPL. SIST ELECT FASE II 1RA SEC PROV. ARCE	6.283.815,00	0,00	0,00%	40.282.396,53	15.974.683,99	24.307.712,54	39,66%
13	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. OFICINAS DE LA GOBERNACION DE TARIJA SECCION URIONDO	3.259.219,50	1.991.082,05	61,09%	27.870.946,01	11.127.061,61	16.743.884,40	39,92%
14	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. PRESA RIO POTRERO	640.099,00	240000	37,49%	1.200.000,00	480.000,00	720.000,00	40,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
15	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES DE ERQUIS	2.500.000,00	2.499.940,57	100,00%	6.989.248,20	2.849.940,57	4.139.307,63	40,78%
16	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	CONST. DE DEFENSIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA	1.500.000,00	0,00	0,00%	10.595.261,12	4.383.733,78	6.211.527,34	41,37%
17	SUBGOBERNACION BERMEJO	Ninguno	CONST. OBRAS DE PROTEC. AREAS PRODUC. MARGENES RIO BJO. Y RIO GRANDE DE TARIJA	112.617,00	0,00	0,00%	51.562.110,90	21.906.336,15	29.655.774,75	42,49%
18	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	Ninguno	CONST. SISTEMA DE RIEGO TOMATAS GRANDE	92.716,00	0	0,00%	324.506,00	139.073,72	185.432,28	42,86%
19	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. DEFENSIVOS RIO PAJCHANI	1.137.014,58	300000	26,38%	2.278.750,80	994.729,02	1.284.021,78	43,65%
20	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	APOYO PRODUC. GANADO BOVINO CANTON IPAGUAZU Y CHIMEO PROV. OCONNOR	2.911.246,32	672403,44	23,10%	15.882.933,76	7.219.732,80	8.663.200,96	45,46%
21	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS GRANJA PISCICOLA - BERMEJO	2.273.281,98	0	0,00%	5.156.329,54	2.545.582,83	2.610.746,71	49,37%
22	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. OBRAS DE CONCLUSION PISCINA OLIMPICA DEPARTAMENTAL TARIJA	29.630.835,00	15937892,67	53,79%	49.526.511,26	24.613.553,44	24.912.957,82	49,70%
23	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	APOYO PRODUC. GANADO BOVINO CANTON TARUPAYO Y SUARUO PROV. OCONNOR	4.911.303,04	524012,18	10,67%	27.663.437,01	13.802.601,20	13.860.835,81	49,89%
24	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. INFRAESTRUCTURA CIRCUITO TURISTICO 2DA. SECC. PROV. MENDEZ	1.000.000,00	239.411,20	23,94%	4.318.989,25	2.158.400,45	2.160.588,80	49,97%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 51% A 75 % DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
1	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	Ninguno	CONST. DOBLE VIA MOTO MENDEZ TOMATITAS SAN LORENZO	335.186,00	0,00	0,00%	1.685.806,00	945.433,27	740.372,73	56,08%
2	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD TOLOMOSA NORTE	1.738.181,00	286.036,52	16,46%	4.369.871,49	2.460.260,86	1.909.610,63	56,30%
3	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	IMPLEM. DE SISTEMAS AGROSILVOPASTORIL CANT. LA CUEVA,SALINAS Y CHIQUIACA PROV.OCONNOR	3.473.584,03	449.132,66	12,93%	30.636.509,05	17.784.192,14	12.852.316,91	58,05%
4	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD SELLA CERCADO	3.171.738,00	1.275.661,94	40,22%	7.729.809,35	4.527.294,90	3.202.514,45	58,57%
5	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. SISTEMA DE RIEGO SELLA MENDEZ	0,00	0	0,00%	245.000,00	145.000,00	100.000,00	59,18%
6	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. PAVIMENTO AEROPUERTO - CAMPO GRANDE - BERMEJO	2.075.704,49	0	0,00%	22.875.014,84	13.674.157,04	9.200.857,80	59,78%
7	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	Ninguno	CONST. ASFALTADO CHALAMARCA - ALISOS DEL CARMEN	139.419,00	0,00	0,00%	348.533,00	209.113,20	139.419,80	60,00%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA PRESA PAYUYO	76.221,00	57.165,30	75,00%	190.551,00	114.330,30	76.220,70	60,00%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA GAMONEDA	259.041,00	194.280,60	75,00%	647.602,00	388.561,20	259.040,80	60,00%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA PRESA CALDERAS	120.000,00	90.000,00	75,00%	300.000,00	180.000,00	120.000,00	60,00%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS SISTEMA DE RIEGO PRESA EL MOLINO	480.000,00	288.000,00	60,00%	480.000,00	288.000,00	192.000,00	60,00%
12	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. ASFALTADO CRUCE PANAMERICANO LA CHOZA - SAN ISIDRO	12.000.000,00	9.129.738,80	76,08%	48.133.664,07	28.951.493,11	19.182.170,96	60,15%
13	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. COLEGIO INTERNADO TREMENTINAL 1° SECCION PROV. ARCE	2.521.963,00	2501102,23	99,17%	13.868.197,20	8.382.421,04	5.485.776,16	60,44%
14	SEDECA	SEDECA	CONST. CAMINO PUERTA DEL CHACO - CANALETAS KM 9+504,6 A KM 24+840,6	80.000.000,00	61901055,03	77,38%	202.596.457,00	123.434.315,70	79.162.141,30	60,93%
15	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	Ninguno	CONST. SIST. RIEGO SAN ANTONIO STA. CLARA	465.170,00	0,00	0,00%	2.488.580,85	1.519.020,24	969.560,61	61,04%
16	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ASFALTADO CAMINO ENTRE RIOS - QDA. LAS VACAS	10.000.000,00	0,00	0,00%	89.593.893,65	56.275.045,48	33.318.848,17	62,81%
17	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	INSTAL. SERVICIOS COMPLEMENT. PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS BERMEJO	400.000,00	0,00	0,00%	6.939.136,91	4.402.293,07	2.536.843,84	63,44%
18	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. INFRASTRUCT.PRODUCT. SAN JOSECITO PROV. O'CONNOR	1.197.787,00	112247,45	9,37%	45.031.173,82	28.661.935,00	16.369.238,82	63,65%
19	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. INFRAEST.PRODUCTIVA CANT. DE IPAGUAJU Y CHIMEO PROV. O'CONNOR	70.000,00	69.797,28	99,71%	20.410.949,95	12.998.918,68	7.412.031,27	63,69%
20	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE PRESA HUACATA VALLE CENTRAL DE TARIJA	1.458.269,00	947.874,71	65,00%	1.458.269,00	947.874,71	510.394,29	65,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 51% A 75 % DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
21	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL EL PUENTE	10.660.000,00	9039719,19	84,80%	20.310.248,33	13.542.897,42	6.767.350,91	66,68%
22	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	AMPL. ELECTRIFICACION RURAL 2DA. SECCION PROV. AVILES	123.025,70	0,00	0,00%	35.657.034,85	23.838.976,16	11.818.058,69	66,86%
23	SEDECA	SEDECA	CONST. CAMINO SAN JOSECITO - EL PESCADO	2.630.238,00	2630238	100,00%	59.651.890,24	40.570.302,84	19.081.587,40	68,01%
24	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. INFRAEST. PARA FORTALECIM. Y PROM. TURISTICA COMUNIT. PADCAYA	8.111.769,07	2480737,51	30,58%	45.000.994,53	30.755.204,30	14.245.790,23	68,34%
25	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD PANTIPAMPA CHURQUIS	2.044.456,32	0,00	0,00%	3.942.645,31	2.727.747,69	1.214.897,62	69,19%
26	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	Ninguno	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO PALOS BLANCOS	1.000.000,00	0,00	0,00%	16.576.735,02	11.475.385,10	5.101.349,92	69,23%
27	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	MEJ. Y AMPLIACION CAMINO CRUCE SANTA ANA LA VIEJA - LADERAS NORTE	300.000,00	210.000,00	70,00%	300.000,00	210.000,00	90.000,00	70,00%
28	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA SANTA ANA	180.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	420.000,00	180.000,00	70,00%
29	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	REHAB. DE AREAS DEGRADADAS EN LA PROV. CERCADO	90.613,00	0,00	0,00%	302.043,00	211.430,10	90.612,90	70,00%
30	SUBGERNACION URIONDO	Ninguno	MEJ. SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA DE ARRIBA (CONCEPCION)	552.433,05	0,00	0,00%	5.167.836,00	3.696.754,70	1.471.081,30	71,53%
31	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. SISTEMA DE RIEGO GUADALQUIVIR-CENAVIT-CALAMUCHITA	35.401.622,34	25.343.453,17	71,59%	209.387.457,59	152.912.301,05	56.475.156,54	73,03%
32	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. SISTEMA DE RIEGO CARACHIMAYO	1.728,00	0,00	0,00%	6.091.269,19	4.524.874,22	1.566.394,97	74,28%
33	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ASFALTADO CARRETERA CARAPARI-PALOS BLANCOS TRAMO CHOERE-PALOS BLANCOS	50.048.531,00	43.440.914,25	86,80%	115.687.653,36	87.073.675,06	28.613.978,30	75,27%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
1	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. PARQUE HISTORICO CULTURAL OSCAR ALFARO EN LA PRIMERA SECCION PROV. MENDEZ	1.000,00	0,00	0%	325.000,00	250.000,00	75.000,00	76,92%
2	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. PUENTE VEHI CULAR YESERA-CHIGUAYPOLLA	3.439.034,49	3272290,04	95,15%	4.204.484,98	3.272.290,04	932.194,94	77,83%
3	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. CAMPUS UNIVERSITARIO U.A.J.M.S MODULO II - FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS - BERMEJO	3.741.926,00	3.578.358,94	95,63%	21.132.888,01	16.579.162,45	4.553.725,56	78,45%
4	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. CAMPUS AGROPECUARIO Y CULTURAL PROV. O'CONNOR	3.031.793,93	1.050.010,00	34,63%	45.739.536,01	36.122.389,36	9.617.146,65	78,97%
5	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	MEJ. Y CONST. SISTEMA DE RIEGO PRIMERA SECCION PROVINCIA MENDEZ FASE II	11.390,00	11.389,56	100,00%	497.118,44	399.308,00	97.810,44	80,32%
6	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. E IMPLEMENTACION GENERADORES DE ENERGIA ZONA PRODUCTIVA BERMEJO	4.157.619,58	0,00	0,00%	21.438.681,65	17.281.062,07	4.157.619,58	80,61%
7	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. SISTEMA DE ADUCCION PROVINCIA ARCE BERMEJO	15.132.780,00	14.535.489,06	96,05%	137.599.995,37	111.333.235,86	26.266.759,51	80,91%
8	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	MEJ. Y CONST. SISTEMA DE RIEGO 1RA SECC. PROV. MENDEZ	4.481.575,40	1.392.437,30	31,07%	17.161.683,57	13.899.879,26	3.261.804,31	80,99%
9	SEDECA	SEDECA	CONST. ASFALTADO CAMINO T. VIAL CARAPARI-EL CAJON-BERMEJO SUB T. COLONIA LINARES -P. S. TELMO-P. S. ANTONIO	18.755.134,45	8790929,24	46,87%	213.424.210,42	178.871.270,50	34.552.939,92	83,81%
10	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. CAMINO ASFALTADO IRCALAYA - EL PUENTE - LA VERDIGUERA	17.927.488,39	1.437.500,00	8,02%	166.452.923,94	146.176.294,56	20.276.629,38	87,82%
11	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. ATAJADOS Y RESERVIORIOS COMUNIDAD ROSILLAS	12.000.000,00	11.811.827,74	98,43%	43.519.066,14	38.343.428,25	5.175.637,89	88,11%
12	SUBGOBERNACION BERMEJO	Ninguno	APOYO FOM. A LA TRANS Y COMERC DE CITRICOS BJO	4.881.938,52	1.500.000,00	30,73%	70.989.190,53	62.737.105,60	8.252.084,93	88,38%
13	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE BASQUETBALL TARIJA	746.654,16	0,00	0,00%	18.359.122,07	16.872.702,08	1.486.419,99	91,90%
14	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CESPED SINTETICO EN TOMATITAS	265.271,50	257.269,57	96,98%	2.209.186,56	2.058.844,06	150.342,50	93,19%
15	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. OBRAS DE CONCLUSION VELODROMO OLIMPICO DEPARTAMENTAL TARIJA	3.872.963,00	3872962,47	100,00%	26.400.148,71	24.612.786,66	1.787.362,05	93,23%
16	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ELECTRIF. RURAL LOMA ALTA - PAMPA REDONDA	1.151.457,00	1.148.537,00	99,75%	10.744.972,72	10.076.550,62	668.422,10	93,78%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
17	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	MEJ. Y AMPLIAC. SIST. DE RIEGO DISTR.5 QUEBRADA HONDA	1.384.977,58	275.694,00	19,91%	27.161.660,00	25.650.138,52	1.511.521,48	94,44%
18	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD LAZARETO	3.586.856,00	3.231.218,39	90,08%	6.775.325,33	6.419.689,36	355.635,97	94,75%
19	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. YEQUIP. CIRCUITO TURISTICO EUSTAQUIO MENDEZ SAN LORENZO	113.400,00	97.200,00	85,71%	324.000,00	307.800,00	16.200,00	95,00%
20	ADMINISTRACION CENTRAL	Ninguno	CONST. CENTRO DE TECNOLOGIAS APROPIADAS COMUNIDAD YUTICANCHA	45.419,00	0	0,00%	959.404,01	913.985,98	45.418,03	95,27%
21	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. DE ALBERGUE PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN TARIJA	1.558.490,00	225.374,55	14,46%	7.708.533,89	7.375.422,13	333.111,76	95,68%
22	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. ESTANQUES COM. ZONA ALTA DEL RIO PILAYA	603.856,78	0	0,00%	15.708.898,06	15.122.299,75	586.598,31	96,27%
23	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. PUENTE VEHICULAR TOLOMOSA OESTE	776.892,76	776.892,76	100,00%	5.533.676,29	5.346.383,24	187.293,05	96,62%
24	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	IMPLEM. SISTEMA CIUDAD SEGURA BERMEJO	0,00	0,00	0,00%	21.249.392,00	20.880.000,00	369.392,00	98,26%
25	SUBGERNACION URIONDO	Ninguno	AMPL. SISTEMA DE RIEGO CONCEPCION (CANAL DEL MEDIO)	71.230,65	0	0,00%	7.484.170,53	7.413.019,06	71.151,47	99,05%
26	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	Ninguno	CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE NOGALITOS MUNICIPIO DE PADCAYA	149.165,00	0	0,00%	18.446.111,34	18.296.946,34	149.165,00	99,19%
27	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO ZONA ALTA DEPTO. DE TARIJA	1.440.280,56	313.650,00	21,78%	15.158.677,90	15.059.929,30	98.748,60	99,35%
28	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. INFRAEST. PRODUCTIVA CHIQUIACA MARGEN IZQUIERDO	318.062,00	318.061,60	100,00%	318.062,00	318.061,60	0,40	100,00%
29	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. LABORATORIO INSTITUTO TECNOLÓGICO URIONDO	411.464,91	410.476,51	99,76%	1.766.850,73	1.766.850,72	0,01	100,00%
30	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD SAN MATEO	37.131,00	37.130,83	100,00%	6.053.535,78	6.053.535,77	0,01	100,00%
31	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. DE GAVIONES HUACATA	12.842,00	0,00	0,00%	114.297,13	114.297,13	0,00	100,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
32	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. SISTEMAS DE RIEGO HUACATA ZAPATERA	56.000,00	56.000,00	100,00%	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00%
33	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. INSTITUTO TECNOLÓGICO 2 DE AGOSTO ISLAYACHI	398.981,87	398.981,87	100,00%	2.125.955,38	2.125.955,38	0,00	100,00%
34	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. CANCHA DEPORTIVA CON CESPED SINTETICO HUACANQUI	373.474,31	373.474,31	100,00%	1.869.053,25	1.869.053,25	0,00	100,00%
35	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	AMPL. INFRAESTRUCTURA HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA 3ER NIVEL BERMEJO	97.759,32	97.759,32	100,00%	1.946.846,71	1.946.846,71	0,00	100,00%
36	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	Ninguno	CONST. ASFALTADO CRUCE RUTA 11 (SAN SIMON)- LOS NARANJOS PROV. OCONNOR	59.704,00	59.704,00	100,00%	59.704,00	59.704,00	0,00	100,00%
37	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. CANCHA DE CESPED SINTETICO EN SELLA CERCADO DE LA CIUDAD DE TARIJA	486.964,58	486.964,54	100,00%	2.114.261,70	2.114.261,70	0,00	100,00%
