



Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROYECTOS
TARIJA - BOLIVIA


ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GENERAL

CUADRO N° 1
DETALLE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE LAS GESTIONES
2008 AL 2013
(En Bolivianos)

GESTION	PRESUP. VIGENTE	EJECUCION	PORCENTAJE
2008	2.131.303.472,00	591.726.385,52	27,76%
2009	2.445.616.281,00	636.540.134,45	26,03%
2010	1.910.643.995,00	608.648.374,73	31,86%
2011	3.182.326.411,00	717.594.914,89	22,55%
2012	4.076.176.506,00	867.533.260,06	21,28%
2013	4.362.433.094,00	1.126.769.488,42	25,83%

Fuente: Reportes Dirección de inversión Pública

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA GOBERNACION DE TARIJA EN LAS GESTIONES 2008 AL 2013
(Al 30 de junio en Bolivianos)

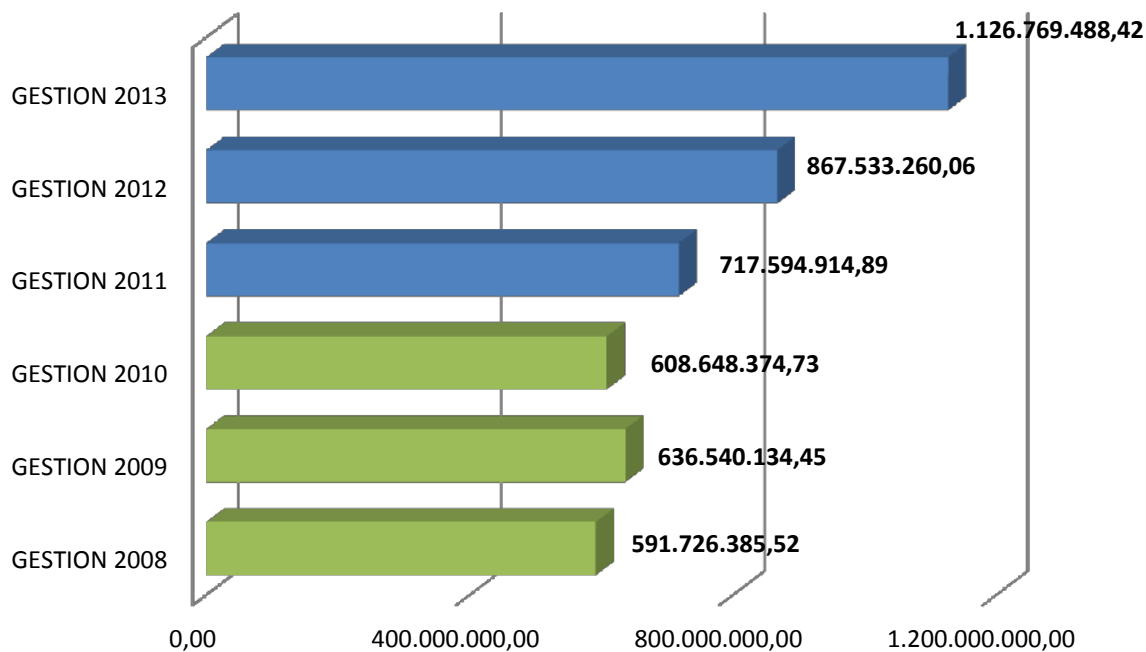


CUADRO N° 2
DETALLE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RUBRO DE GASTO
(Al 30 de junio de 2013 en Bolivianos)

RUBRO DE GASTO	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	EJECUCION	%
INVERSION PUBLICA	2.057.837.741,00	2.149.860.129,73	517.083.791,71	24,05%
ADMINISTRACION CENTRAL	217.273.348,00	227.881.227,00	45.787.983,07	20,09%
UNIDADES DESCONCENTRADAS	320.597.930,00	339.854.594,00	61.569.036,05	18,12%
UNIDADES SECCIONALES	1.519.966.463,00	1.582.124.308,73	409.726.772,59	25,90%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	945.498.521,00	967.609.951,00	291.347.867,69	30,11%
GASTO CORRIENTE	481.569.697,00	525.097.004,36	171.910.857,43	32,74%
PROGRAMAS	423.313.653,00	457.444.620,64	110.840.338,89	24,23%
PREVISIONES FINANCIERAS	176.556.555,00	217.206.174,27	17.274.921,77	7,95%
SERVICIO DE LA DEUDA	45.139.214,00	45.215.214,00	18.311.710,93	40,50%
TOTAL GOB. AUT. DPTAL. DE TARIJA	4.129.915.381,00	4.362.433.094,00	1.126.769.488,42	25,83%

Fuente: REPORTES SIGEP

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO VIGENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
POR RUBRO DE GASTO
(Al 30 de junio de 2013 en Bolivianos)

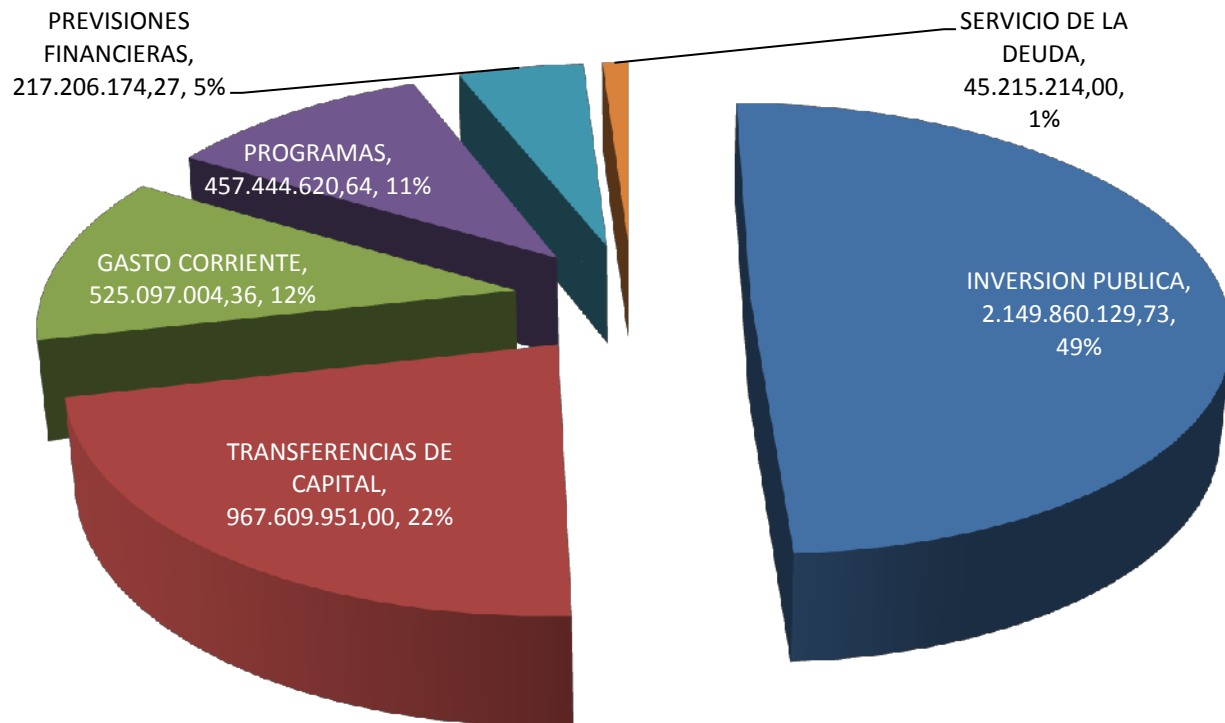

CUADRO N° 3
DETALLE DEL PRESUPUESTO VIGENTE DE LA GOBERNACION DE TARIJA
(Al 30 de junio de 2013 en Bolivianos)

DETALLE	MONTO (Bs.)	OBSERVACIONES
Presupuesto Inicial de la Gestión	4.129.915.381,00	Dado por Ley Financial 317/2012
Transferencias Adicionales del TGE	24.000.000,00	Dado por Proyectos Concurrentes con el Nivel Central y la Gobernación Seccional de Yacuiba, para el proyecto de "Const. Hospital Modelo de 3er. Nivel Región Autónoma G.Ch. Yacuiba" y para el proyecto "Const. Estadio Provincial de Fútbol Yacuiba"
Primer Presupuesto Adicional	208.517.713,00	Dado por Nota del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con CITE MEFPNPCF/DGPGPI/UET N° 1579/2013 del 17 de mayo de 2013
Presupuesto Vigente al 30 de junio de 2013	4.362.433.094,00	Dado como Reporte del SIGEP al 30 de junio de 2013


Fuente: Reportes Dirección de inversión Pública

CUADRO N° 4
DETALLE ANTICIPOS
(Al 30 de junio de 2013 en Bolivianos)


Detalle	Pagado (Bs.)	Amortizado (Bs.)	Saldo (Bs.)
Anticipos a Corto Plazo	146.591.109,50	0,00	146.591.109,50

Fuente: Reportes Dirección de inversión Pública


PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA GENERAL EN BASE AL PRESUPUESTO VIGENTE
25,83%

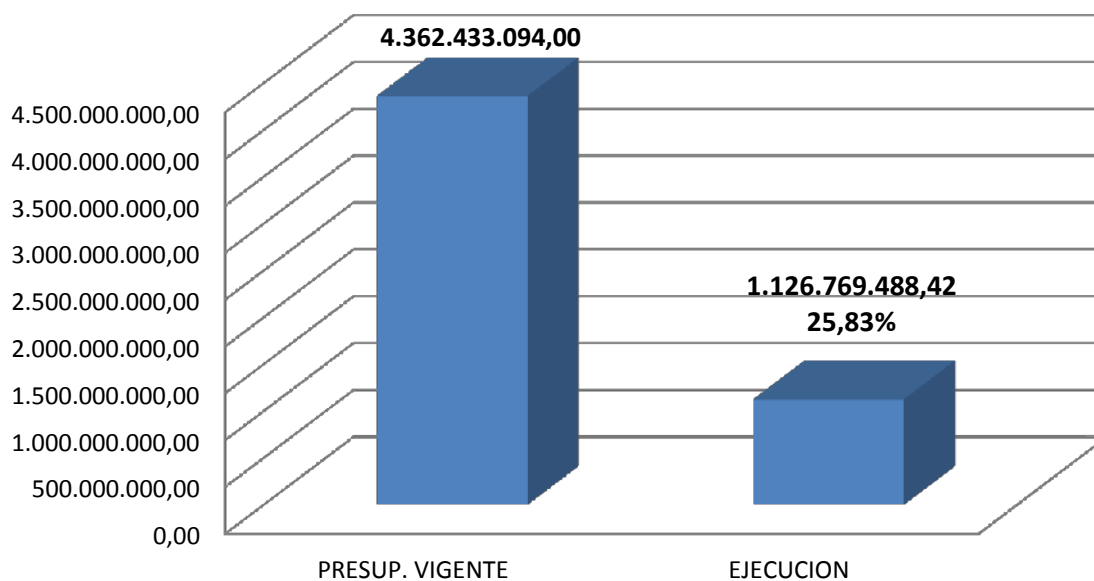

**PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA GENERAL EN BASE AL PRESUPUESTO VIGENTE
+ ANTICIPOS 29,19 %**

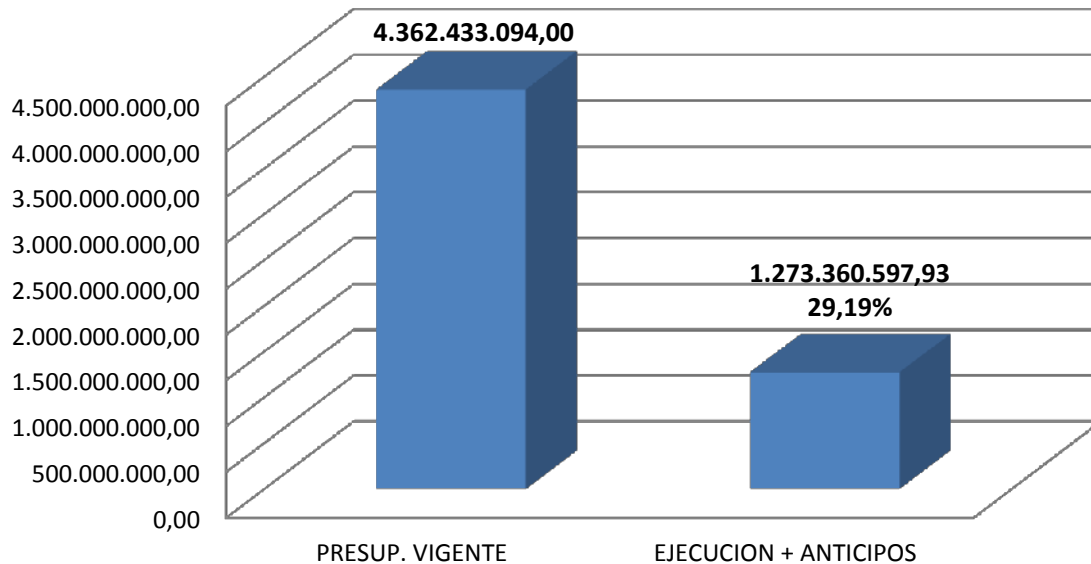

**RELACION DEL PRESUPUESTO VIGENTE Y LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Al 30 de junio de 2013 en Bolivianos)**

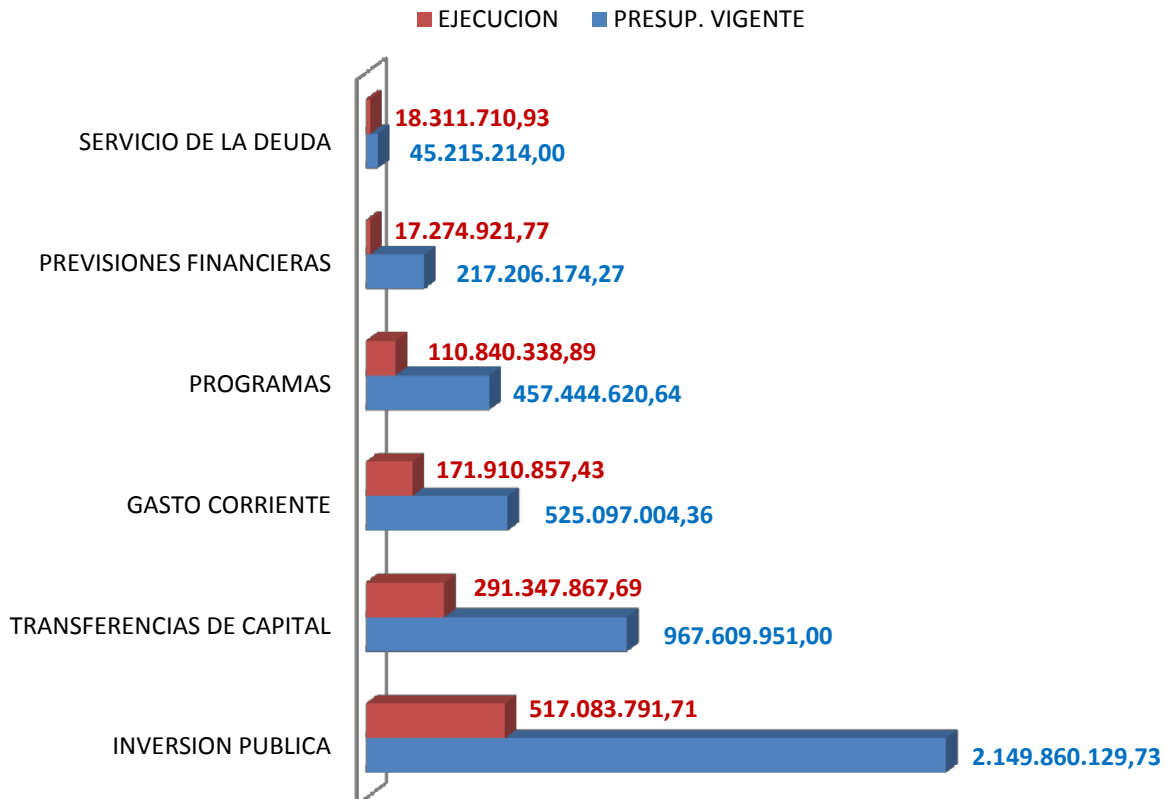



Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROYECTOS
TARIJA - BOLIVIA

CUADRO N° 5
PRESUPUESTO GENERAL POR UNIDAD EJECUTORA
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
(Al 30 de junio de 2013 en Bolivianos)

UNIDAD	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	EJECUCION	%
TOTAL GOB. AUTONOMO DPTAL. DE TARIJA	4.129.915.381,00	4.362.433.094,00	1.126.769.488,42	25,83%
ORGANO LEGISLATIVO	44.492.796,00	44.791.146,00	14.983.491,36	33,45%
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	30.954.025,00	31.252.375,00	10.999.289,72	35,20%
ASAMBLEA REGIONAL DEL CHACO	13.538.771,00	13.538.771,00	3.984.201,64	29,43%
ORGANO EJECUTIVO	4.085.422.585,00	4.317.641.948,00	1.111.785.997,06	25,75%
ADMINISTRACION CENTRAL	601.715.122,00	772.905.852,63	204.481.465,55	26,46%
STRIAZ. EJECUTIVA Y STRIA. DPTAL. DE HACIENDA (*)	367.728.981,00	526.335.253,63	154.248.850,99	29,31%
STRIA. DPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	10.052.025,00	10.052.025,00	802.351,98	7,98%
STRIA. DPTAL. DE DESAR. COMUNITARIO CAMPESINO	7.298.426,00	7.331.781,00	1.067.947,39	14,57%
STRIA. DPTAL. DE PLANIFICACION E INVERSION	331.197,00	331.197,00	0,00	0,00%
STRIA. DPTAL. DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	35.725.961,00	38.127.653,00	14.562.144,04	38,19%
STRIA. DPTAL. DE PROTEC. DEL PATRIMONIO CULTURAL	6.865.172,00	6.695.928,00	717.646,28	10,72%
STRIA. DPTAL. DE COORDINACION GUBERNAMENTAL	1.766.142,00	1.766.142,00	540.861,09	30,62%
STRIA. DPTAL. DE HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA	6.560.739,00	1.534.739,00	0,00	0,00%
STRIA. DPTAL. DE OBRAS PUBLICAS	104.157.774,00	120.234.633,00	26.627.226,48	22,15%
STRIA. DPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL	33.241.894,00	33.406.830,00	2.315.497,95	6,93%
DIR. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS	9.474.051,00	9.474.051,00	221.974,42	2,34%
REPRESENTACION LA PAZ	1.483.802,00	1.508.038,00	494.745,08	32,81%
SEDESA	17.028.958,00	16.107.582,00	2.882.219,85	17,89%
UNIDADES DESCONCENTRADAS	939.941.082,00	978.025.833,64	188.522.389,22	19,28%
CEVITA	5.981.499,00	5.172.144,00	938.381,07	18,14%
PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	41.417.135,00	40.267.135,00	3.154.201,51	7,83%
FFODEPRO	1.384.300,00	919.063,00	178.660,20	19,44%
UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	29.477.077,00	25.977.077,00	2.080.174,22	8,01%
ADMINISTRACION DE EL PROSOL	234.044.086,00	233.644.086,00	639.387,44	0,27%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	218.759.419,00	221.467.369,76	71.270.369,57	32,18%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	23.406.580,00	23.601.580,00	10.438.278,23	44,23%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	208.554.298,00	243.906.951,00	64.321.758,65	26,37%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	27.175.539,00	15.043.358,00	3.859.240,15	25,65%
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	35.446.004,00	35.446.004,00	4.569.706,00	12,89%
PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	39.654.575,00	40.625.951,00	6.740.101,72	16,59%
UTEPTAR - GIRH	39.906.383,00	23.829.524,00	1.234.301,87	5,18%
PLAN EMPLEO URGENTE DEPARTAMENTAL	29.724.008,00	30.131.448,00	14.048.135,08	46,62%
INTRAID	488.859,00	488.859,00	52.428,93	10,72%
BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DPTAL. TARIJA	1.000.000,00	1.816.929,00	320.389,32	17,63%
EXPOSUR	3.521.320,00	3.309.643,00	0,00	0,00%
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	0,00	32.378.711,88	4.676.875,26	14,44%


Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROYECTOS
TARIJA - BOLIVIA

UNIDADES SECCIONALES	2.543.766.381,00	2.566.710.261,73	718.782.142,29	28,00%
UNIDAD SECCIONAL DE YACUIBA	518.497.878,00	583.071.973,00	182.730.345,18	31,34%
UNIDAD SECCIONAL DE CARAPARI	526.473.298,00	527.204.790,00	239.446.793,16	45,42%
UNIDAD SECCIONAL DE BERMEJO	137.478.178,00	148.337.637,00	43.358.815,61	29,23%
UNIDAD SECCIONAL DE YUNCHARA	72.183.351,00	65.040.158,00	16.580.088,48	25,49%
UNIDAD SECCIONAL DE EL PUENTE	103.350.984,00	96.300.041,00	17.160.766,37	17,82%
UNIDAD SECCIONAL DE VILLA MONTES	507.377.961,00	478.860.600,00	88.415.772,14	18,46%
PROVISA	22.483.215,00	24.719.234,00	2.647.631,30	10,71%
SERVICIO DPTAL. DE CAMINOS SEDECA VILLAMONTES	84.298.686,00	106.112.702,73	24.865.161,33	23,43%
UNIDAD SECCIONAL DE CERCADO	61.082.761,00	53.923.075,00	3.337.824,52	6,19%
UNIDAD SECCIONAL DE PADCAYA	164.792.980,00	165.169.612,00	21.657.256,19	13,11%
UNIDAD SECCIONAL DE SAN LORENZO	65.120.439,00	66.012.649,00	7.183.600,92	10,88%
UNIDAD SECCIONAL DE URIONDO	98.339.351,00	84.442.111,00	19.977.432,33	23,66%
UNIDAD SECCIONAL DE O'CONNOR	182.287.299,00	167.515.679,00	51.420.654,76	30,70%

Fuente: REPORTES SIGEP

(*) Se considera el **TOTAL** del Reporte del **SIGEP** que agrupa las **Secretarías Ejecutiva y Hacienda**. La **Secretaría Ejecutiva Departamental SOLO** administra **Bs. 6.274.455,00.-** que está como proyectos de **Inversión Pública** de la **Dirección de Proyectos Especiales**, el **RESTO** corresponde a la **Secretaría de Hacienda**.

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO VIGENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
POR UNIDAD EJECUTORA
(Al 30 de junio de 2013 en Bolivianos)

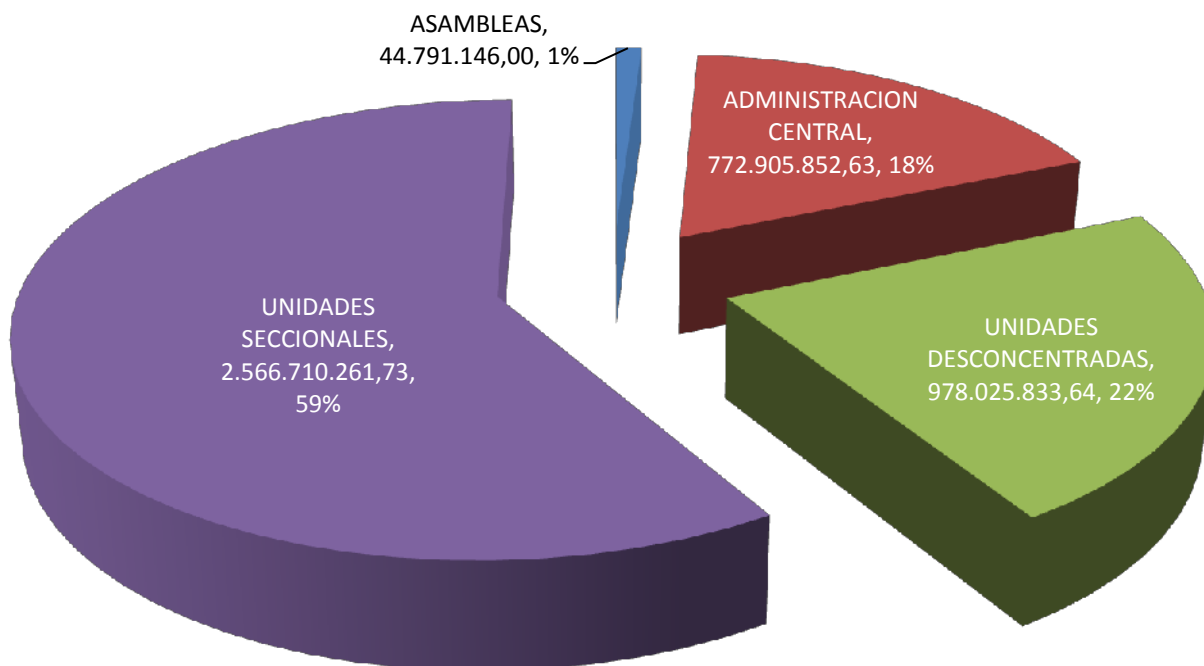

CUADRO N° 6
DETALLE DE INGRESOS DE LA GOBERNACION DE TARIJA
(Al 30 de junio de 2013 en Bolivianos)

DETALLE	PROGRAMADO INICIAL	VIGENTE	INGRESADO
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES	20.821.128,00	20.821.128,00	3.260.213,11
Venta de Bienes de las Administraciones Públicas	1.558.570,00	1.558.570,00	644.348,01
Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	15.555.164,00	15.555.164,00	2.191.249,49
Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Adm. Públicas	3.707.394,00	3.707.394,00	424.615,61
REGALIAS	2.318.401.681,00	2.494.038.067,00	1.494.696.572,51
Regalías Mineras	5.061,00	5.061,00	70.046,32
Regalías Hidrocarburíferas	2.318.396.620,00	2.494.033.006,00	1.494.626.526,19
TASAS, DERECHOS Y OTROA INGRESOS	20.185.065,00	20.185.065,00	3.755.888,65
Multas	0	0	862.162,62
Otros Ingresos	20.185.065,00	20.185.065,00	2.893.726,03
DONACION CORRIENTE	150.000,00	150.000,00	68299
Donación Corriente del Exterior	150.000,00	150.000,00	68.299,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	381.708.120,00	414.589.447,00	213.333.885,70
Por Subsidios o Subvenciones	138.400.620,00	138.400.620,00	48.651.932,37
Por Coparticipación Tributaria	240.083.757,00	272.965.084,00	163.609.986,95
De Org. Leg. Jud. Elec. Púb. Desc. Ent. d/Ctrol Def. E y Univ.	3.223.743,00	3.223.743,00	1.071.966,38
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	24.000.000,00	0
Por Subsidios o Subvenciones	0	24.000.000,00	0
RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	0	0	2.225.952,22
Por Subsidios o Subvenciones	0	0	2.225.952,22
DISMINUCIONES Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1.388.649.387,00	1.388.649.387,00	80.492,14
Disminución del Activo Disponible	1.388.649.387,00	1.388.649.387,00	80.492,14
TOTALES	4.129.915.381,00	4.362.433.094,00	1.717.421.303,33

Fuente: REPORTES SIGEP



Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROYECTOS
TARIJA - BOLIVIA

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CUADRO N° 7
DETALLE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSION PÚBLICA
(Al 30 de junio de 2013 en Bolivianos)

UNIDAD	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	EJECUCION	%
TOTAL GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	2.057.837.741,00	2.149.860.129,73	517.083.791,71	24,05%
ADMINISTRACION CENTRAL	217.273.348,00	227.881.227,00	45.787.983,07	20,09%
STRIAZ. EJECUTIVA DEPARTAMENTAL	6.274.455,00	6.274.455,00	645.716,04	10,29%
STRIA. DPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	6.875.425,00	6.875.425,00	310.822,22	4,52%
STRIA. DPTAL. DE DESAR. COMUNITARIO CAMPESINO	3.175.801,00	3.875.156,00	455.105,41	11,74%
STRIA. DPTAL. DE PLANIFICACION E INVERSION	331.197,00	331.197,00	0,00	0,00%
STRIA. DPTAL. DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	26.929.290,00	26.929.290,00	12.497.382,00	46,41%
STRIA. DPTAL. DE PROTEC. DEL PATRIMONIO CULTURAL	4.708.493,00	4.708.493,00	114.542,28	2,43%
STRIA. DPTAL. DE HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA	6.560.739,00	1.534.739,00	0,00	0,00%
STRIA. DPTAL. DE OBRAS PUBLICAS	104.157.774,00	120.234.633,00	26.627.226,48	22,15%
STRIA. DPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL	32.202.215,00	31.981.256,00	2.074.616,13	6,49%
DIR. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS	9.029.001,00	9.029.001,00	180.352,66	2,00%
SEDESA	17.028.958,00	16.107.582,00	2.882.219,85	17,89%
UNIDADES DESCONCENTRADAS	320.597.930,00	339.854.594,00	61.569.036,05	18,12%
CEVITA	1.310.588,00	611.233,00	0,00	0,00%
PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	32.137.998,00	30.437.998,00	1.653.297,99	5,43%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	5.726.096,00	5.923.981,00	917.631,21	15,49%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	175.013.434,00	211.603.977,00	49.410.925,98	23,35%
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	28.035.084,00	28.035.084,00	2.840.349,35	10,13%
PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	36.979.488,00	37.900.864,00	5.415.170,72	14,29%
UTEPTAR - GIRH	39.906.383,00	23.829.524,00	1.234.301,87	5,18%
INTRAID	488.859,00	488.859,00	52.428,93	10,72%
BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DPTAL. TARIJA	1.000.000,00	1.023.074,00	44.930,00	4,39%
UNIDADES SECCIONALES	1.519.966.463,00	1.582.124.308,73	409.726.772,59	25,90%
UNIDAD SECCIONAL DE YACUIBA	229.254.562,00	256.502.564,00	53.777.461,26	20,97%
UNIDAD SECCIONAL DE CARAPARI	245.274.599,00	245.274.599,00	145.005.518,88	59,12%
UNIDAD SECCIONAL DE BERMEJO	115.734.896,00	125.740.983,00	37.612.411,44	29,91%
UNIDAD SECCIONAL DE YUNCHARA	58.177.693,00	58.492.693,00	15.173.410,07	25,94%
UNIDAD SECCIONAL DE EL PUENTE	87.451.642,00	88.926.642,00	14.864.067,02	16,71%
UNIDAD SECCIONAL DE VILLA MONTES	206.944.029,00	204.708.010,00	28.645.252,20	13,99%
PROVISA	14.736.568,00	16.972.587,00	1.269.764,06	7,48%
SERVICIO DPTAL. DE CAMINOS SEDECA VILLAMONTES	67.075.319,00	88.189.075,73	21.399.894,96	24,27%
UNIDAD SECCIONAL DE CERCADO	49.775.669,00	41.967.907,00	439.159,26	1,05%
UNIDAD SECCIONAL DE PADCAYA	149.764.875,00	157.572.637,00	19.833.190,77	12,59%
UNIDAD SECCIONAL DE SAN LORENZO	59.167.993,00	59.167.993,00	5.230.121,13	8,84%
UNIDAD SECCIONAL DE URIONDO	78.492.093,00	78.492.093,00	17.365.075,89	22,12%
UNIDAD SECCIONAL DE O'CONNOR	158.116.525,00	160.116.525,00	49.111.445,65	30,67%

Fuente: REPORTES SIGEP



Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROYECTOS
TARIJA - BOLIVIA

CUADRO N° 8


DETALLE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSION PÚBLICA + ANTICIPOS

(Al 30 de junio de 2013 en Bolivianos)


UNIDAD	PRESUP. VIGENTE	EJECUCION	ANTICIPOS	EJEC. TOTAL	%
TOTAL GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	2.149.860.129,73	517.083.791,71	146.591.109,51	663.674.901,22	30,87%
ADMINISTRACION CENTRAL	227.881.227,00	45.787.983,07	827.583,90	46.615.566,97	20,46%
UNIDADES DESCONCENTRADAS	339.854.594,00	61.569.036,05	45.185.700,20	106.754.736,25	31,41%
CEVITA	611.233,00	0,00		0,00	0,00%
PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	30.437.998,00	1.653.297,99		1.653.297,99	5,43%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	5.923.981,00	917.631,21		917.631,21	15,49%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	211.603.977,00	49.410.925,98	44.828.473,91	94.239.399,89	44,54%
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	28.035.084,00	2.840.349,35		2.840.349,35	10,13%
PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	37.900.864,00	5.415.170,72	320.226,29	5.735.397,01	15,13%
UTEPTAR - GIRH	23.829.524,00	1.234.301,87	37.000,00	1.271.301,87	5,33%
INTRAID	488.859,00	52.428,93		52.428,93	10,72%
BANCO DE SANGRE DE REF. DPTAL. TARIJA	1.023.074,00	44.930,00		44.930,00	4,39%
UNIDADES SECCIONALES	1.582.124.308,73	409.726.772,59	100.577.825,41	510.304.598,00	32,25%
UNIDAD SECCIONAL DE YACUIBA	256.502.564,00	53.777.461,26	30.105.211,15	83.882.672,41	32,70%
UNIDAD SECCIONAL DE CARAPARI	245.274.599,00	145.005.518,88	25.969.568,89	170.975.087,77	69,71%
UNIDAD SECCIONAL DE BERMEJO	125.740.983,00	37.612.411,44	24.410.057,05	62.022.468,49	49,33%
UNIDAD SECCIONAL DE YUNCHARA	58.492.693,00	15.173.410,07	1.511.878,25	16.685.288,32	28,53%
UNIDAD SECCIONAL DE EL PUENTE	88.926.642,00	14.864.067,02	267.761,11	15.131.828,13	17,02%
UNIDAD SECCIONAL DE VILLA MONTES	204.708.010,00	28.645.252,20	3.081.114,61	31.726.366,81	15,50%
PROVISA	16.972.587,00	1.269.764,06		1.269.764,06	7,48%
SERV. DPTAL. DE CAM. SEDECA VILLA MONTES	88.189.075,73	21.399.894,96	6.264.893,18	27.664.788,14	31,37%
UNIDAD SECCIONAL DE CERCADO	41.967.907,00	439.159,26	69.263,04	508.422,30	1,21%
UNIDAD SECCIONAL DE PADCAYA	157.572.637,00	19.833.190,77	3.843.657,05	23.676.847,82	15,03%
UNIDAD SECCIONAL DE SAN LORENZO	59.167.993,00	5.230.121,13	3.119.438,49	8.349.559,62	14,11%
UNIDAD SECCIONAL DE URIONDO	78.492.093,00	17.365.075,89	33.200,00	17.398.275,89	22,17%
UNIDAD SECCIONAL DE O'CONNOR	160.116.525,00	49.111.445,65	1.901.782,59	51.013.228,24	31,86%

Fuente: REPORTES DIRECCION DE INVERSION PUBLICA


**PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSION PUBLICA EN BASE AL
PRESUPUESTO VIGENTE
24,05%**

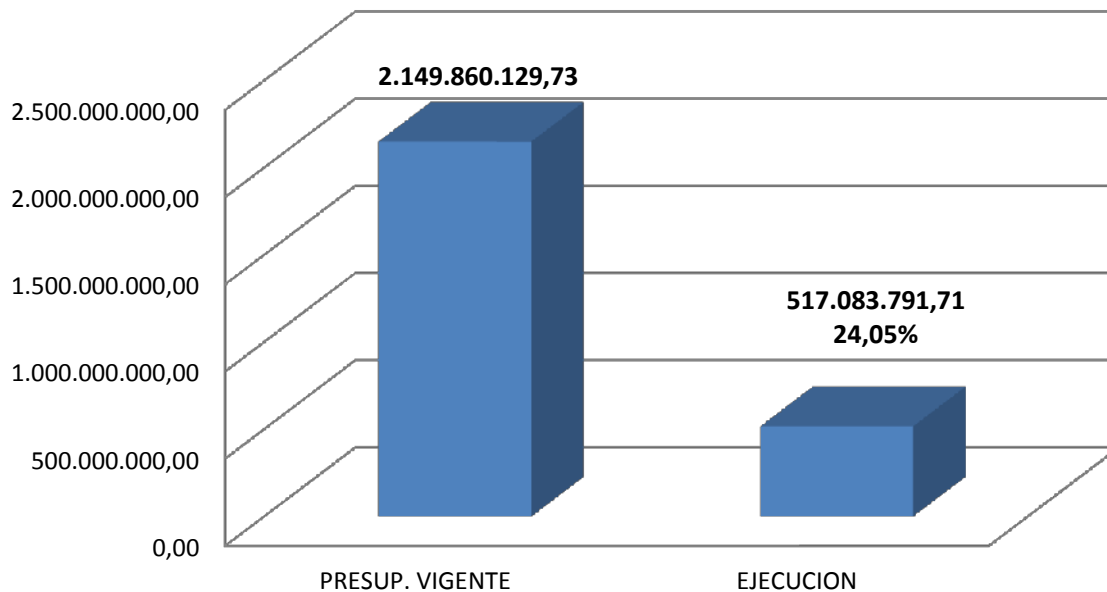

**PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSION PUBLICA EN BASE AL
PRESUPUESTO VIGENTE + ANTICIPOS
30,87%**

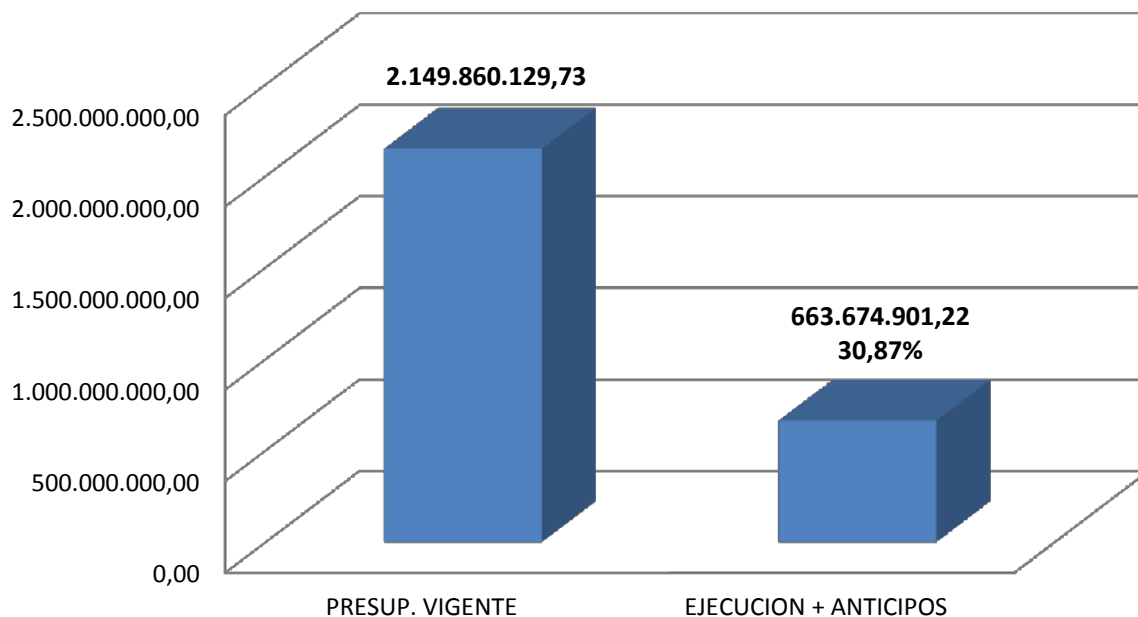

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO VIGENTE DE INVERSION PUBLICA POR UNIDAD EJECUTORA
(Al 30 de junio de 2013 en Bolivianos)

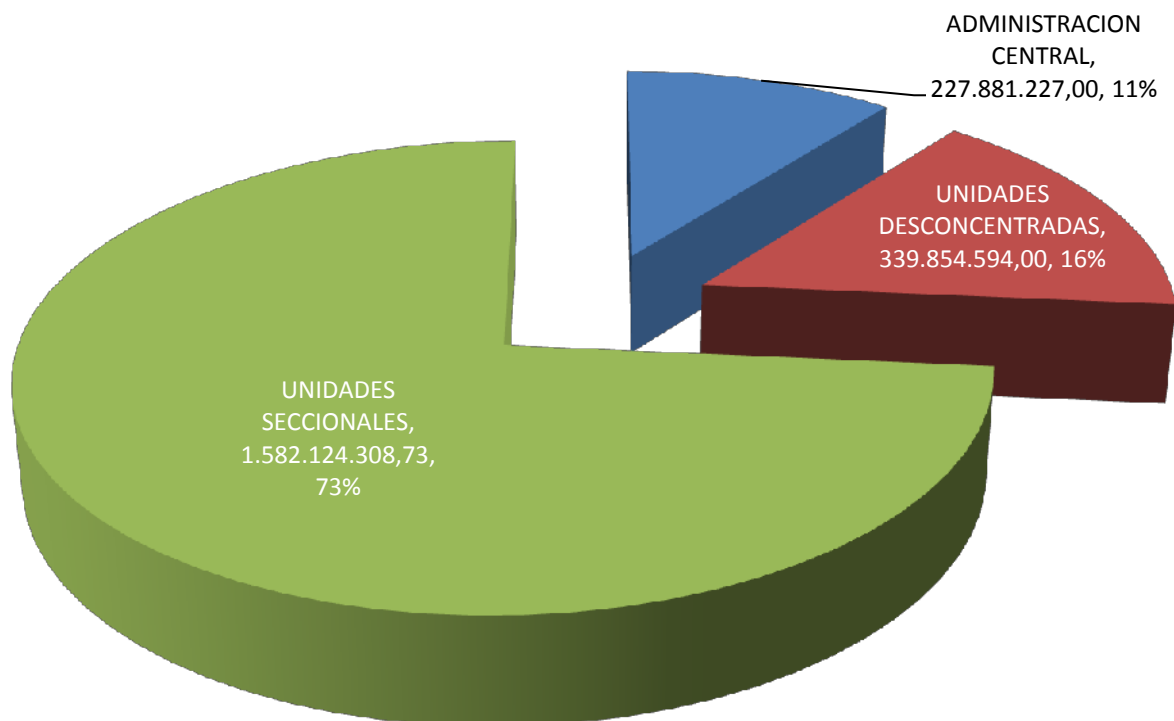


CUADRO N° 9
DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA SECTORIAL DE INVERSION PÚBLICA
(Al 30 de junio de 2013 en Bolivianos)

SECTOR	N° DE PROY.	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE
AGROPECUARIO	236	372.745.706,00	355.023.350,00
EDUCACION Y CULTURA	33	40.107.784,00	39.032.606,00
ENERGIA	43	142.843.248,00	150.619.883,00
INDUSTRIA Y TURISMO	54	41.406.191,00	39.276.918,00
JUSTICIA Y POLICIA	20	71.813.001,00	72.389.000,00
MULTISECCIONAL	9	1.879.353,00	3.011.666,00
RECURSOS HIDRICOS	133	264.621.994,00	269.617.152,00
RECURSOS NATURALES	22	38.744.339,00	38.094.761,00
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	28	99.054.087,00	100.464.613,00
SANEAMIENTO BASICO	6	52.279.014,00	41.793.315,00
TRANSPORTE	200	785.361.289,00	869.326.681,73
URBANISMO Y VIVIENDA	72	146.981.735,00	171.210.184,00
TOTAL	856	2.057.837.741,00	2.149.860.129,73


Fuente: REPORTES DIRECCION DE INVERSION PUBLICA

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO VIGENTE DE INVERSION PUBLICA POR SECTORES
(Al 30 de junio de 2013 en Bolivianos)

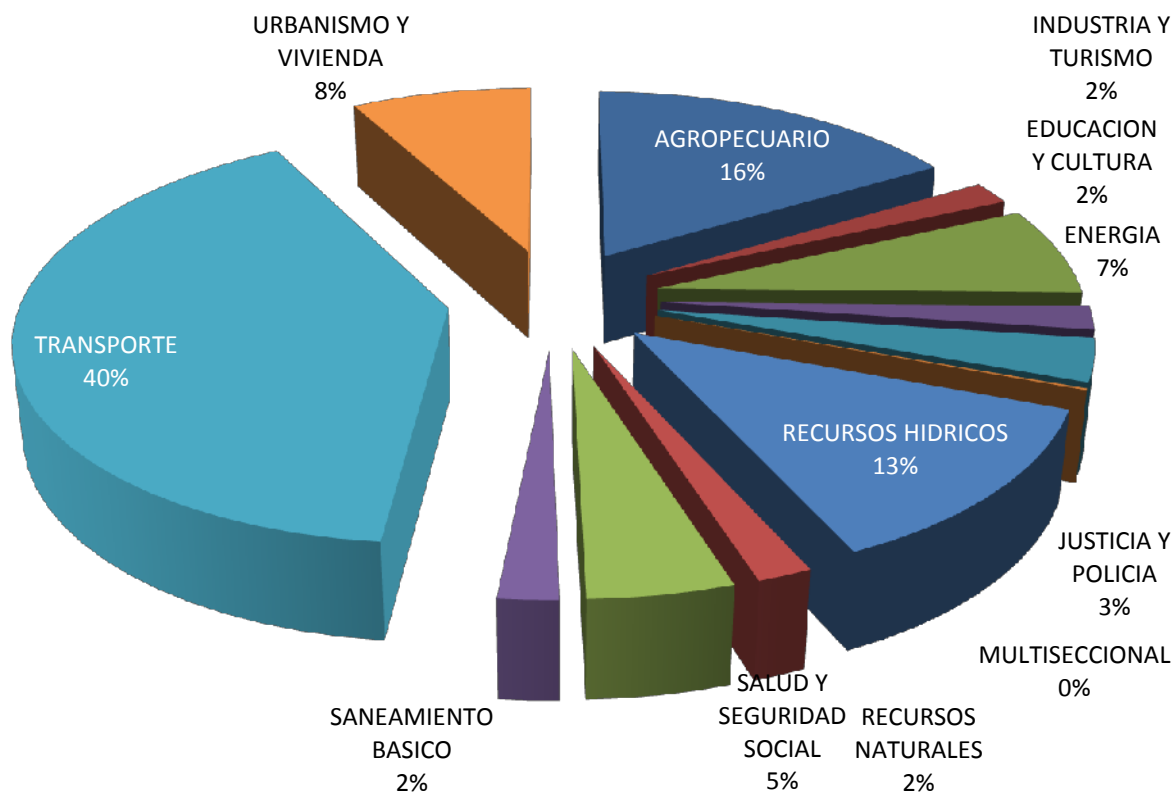

DISTRIBUCION DE NUMERO DE PROYECTOS VIGENTE DE INVERSION PUBLICA POR SECTORES

(Al 30 de junio de 2013 en Bolivianos)

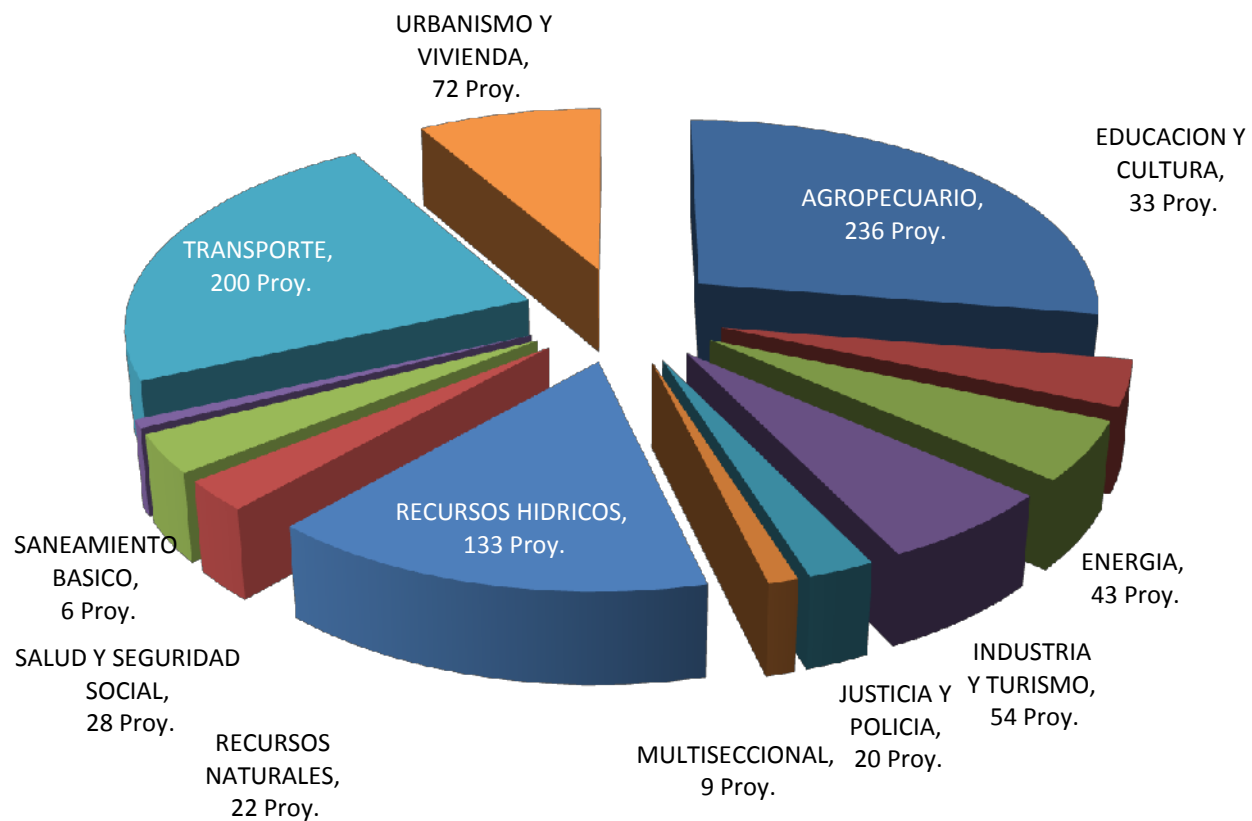


CUADRO N° 10
DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA TERRITORIAL DE INVERSION PÚBLICA
(Al 30 de junio de 2013 en Bolivianos)

SECCIÓN PROVINCIAL	N° DE PROY.	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE
BERMEJO	70	121.325.220,00	151.907.957,00
CARAPARI	139	245.682.836,00	245.678.146,00
CERCADO	90	289.603.727,00	299.115.726,00
EL PUENTE	41	101.287.051,00	96.712.857,00
O'CONNOR	62	192.195.012,00	201.331.729,00
PADCAYA	63	165.562.250,00	164.119.173,00
SAN LORENZO	55	84.002.469,00	83.071.617,00
URIONDO	29	81.771.312,00	81.516.102,00
VILLA MONTES	125	292.999.632,00	314.767.738,73
YACUIBA	84	231.711.588,00	258.655.240,00
YUNCHARA	24	68.534.279,00	61.222.049,00
MULTISECCIONAL	74	183.162.365,00	191.761.795,00
TOTAL	856	2.057.837.741,00	2.149.860.129,73

Fuente: REPORTES DIRECCION DE INVERSION PUBLICA

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO VIGENTE DE INVERSION PUBLICA POR SECCION TERRITORIAL
(Al 30 de junio de 2013 en Bolivianos)

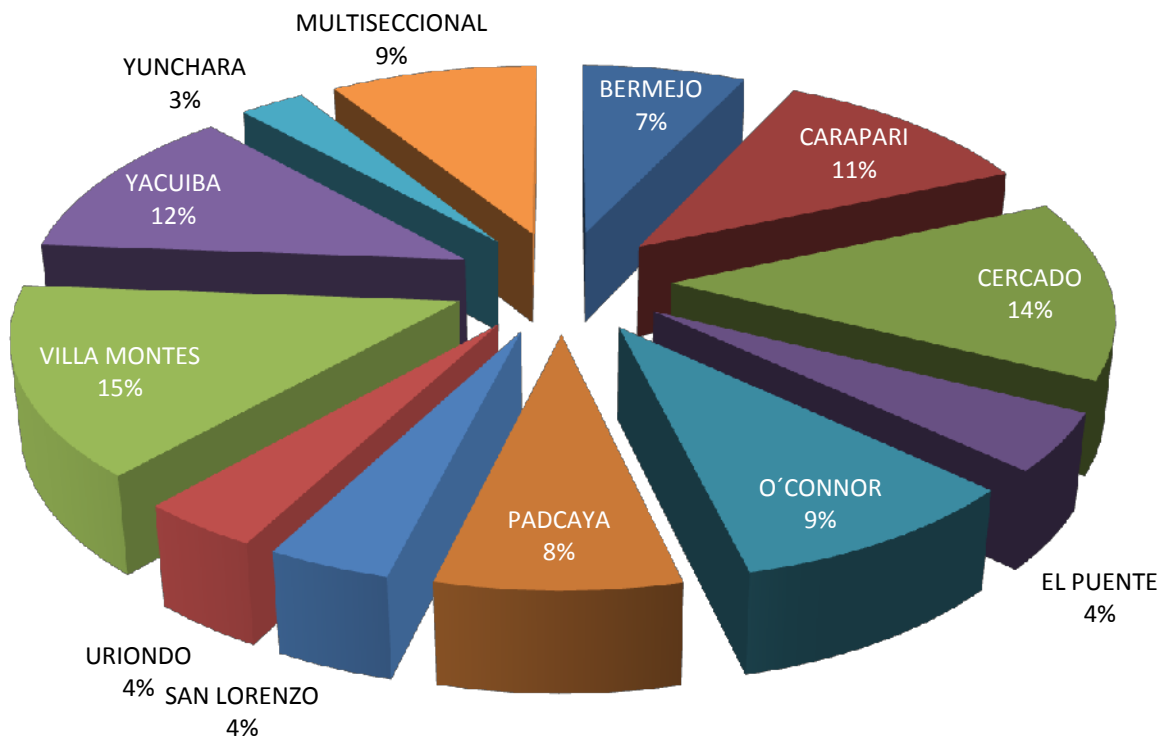

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
856			A.- INVERSION PUBLICA	2.057.837.741,00	2.149.860.129,73	517.083.791,71	24,05%		
148			A.1.- ADMINISTRACION CENTRAL	217.273.348,00	227.881.227,00	45.787.983,07	20,09%		
10			STRIA EJECUTIVA DPTAL	6.274.455,00	6.274.455,00	645.716,04	10,29%		
6			PREINVERSION	3.359.383,00	3.793.441,00	420.977,60	11,10%		
1	906-15380-00000	12-0266-000	CONST. PRESA CARACHIMAYO	631.466,00	631.466,00	420.977,60	66,67%	75,00%	EN EJECUCION
2	906-15380-00001	12-0355-000	CONST. CENTRO DE INVESTIG. Y CERTIFICACION APICOLA DEL DEPTO. DE TARIJA	169.611,00	377.026,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
3	906-15380-00002	14-0080-000	MEJ. PAVIMENTO DE PISTA-AEROPUERTO ORIEL LEA PLAZA CUIDAD DE TJA.	1.939.788,00	1.715.850,00	0,00	0,00%	20,00%	EN EJECUCION
4	906-15380-00003	14-0100-000	CONST. Y MEJORAM. EDIFICIO EXBANCO DEL ESTADO DPTO DE TARIJA	193.223,00	322.039,00	0,00	0,00%	20,00%	EN EJECUCION
5	906-15380-00004	15-0010-000	IMPLEM. PLANTA DE TRATAM. DE RECICLAJE DE BASURA DPTO. DE TARIJA	425.295,00	567.060,00	0,00	0,00%	25,00%	EN EJECUCION
6			CONST.COMPLEJO TURISTICO LAGO SAN JACINTO FASE I	0,00	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
4			INVERSION	2.915.072,00	2.481.014,00	224.738,44	9,06%		
1	906-17056-00000	11-0100-000	CONST. Y EQUIP. TORRE DE MEDICION ENERGIA EOLICA - COM. ANGOSTURA	868.460,00	721.077,00	224.738,44	31,17%	98,60%	EN EJECUCION
2	906-17057-00000	11-0101-000	CONST. Y EQUIP. TORRE DE MEDICION ENERGIA EOLICA - COM. COLON NORTE	868.460,00	770.633,00	0,00	0,00%	50,00%	EN EJECUCION
3	906-15174-00000	12-0274-000	CONST. CENTRO DE TECNOLOGIAS COMUNIDAD VICUÑAYOC	594.813,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO-PARALIZADO
4	906-15245-00000	41-0030-000	EQUIP. AL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPTO. DE TARIJA (PLAN OSCAR ALFARO)	583.339,00	989.304,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO-PARALIZADO
2			STRIA DE PLANIFICACION	331.197,00	331.197,00	0,00	0,00%		
1			PREINVERSION	174.839,00	174.839,00	0,00	0,00%		
1	906-15403-00000	12-0377-00	LEVAN. ESTADISTICO AGROPECUARIO GESTION 2012 EN EL DPTO DE TARIJA	174.839,00	174.839,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
1			INVERSION	156.358,00	156.358,00	0,00	0,00%		
1	906-15403-00000	12-0377-00	DESAR. PROG. DE INFORM. ESTADISTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	156.358,00	156.358,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
5			STRIA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	26.929.290,00	26.929.290,00	12.497.382,00	46,41%		
1			PREINVERSION	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00%		
1	906-15175-00000	14-0098-000	IMPLEM. DEL SISTEMA DE VIGILANCIA PARA EL DEPTO. DE TARIJA-CERCADO	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
4			INVERSION	23.429.290,00	23.429.290,00	12.497.382,00	53,34%		
1	906-15179-00000	14-0099-000	FORTAL. AL SIST. DE COMUNICACION DEL CMDO. DEPTAL TARIJA-CERCADO	10.921.420,00	10.921.420,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
2	906-15256-00000	14-0083-000	FORTAL. AL CMDO. POLICIAL-UNID. DE BOMBEROS -CERCADO	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
3	356-12105-00000	16-0015-000	EQUIP. FISCALIA DEL DITRITO DE TARIJA	509.520,00	509.520,00	499.032,00	97,94%	100,00%	CONCLUIDO
4	356-14168-00000	19-0009-000	FORTAL. EQUIP.A LA POLICIA DPTAL. TARIJA	4.648.350,00	4.648.350,00	4.648.350,00	100,00%	100,00%	CONCLUIDO

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
12			STRIA DE PROTECCION AL PATRIMONIO	4.708.493,00	4.708.493,00	114.542,28	2,43%		
5			PREINVERSION	527.949,00	757.035,00	114.542,28	15,13%		
1	906-17973-00000	13-0079-00	REHAB. E IMP DEL MUS DTAL DE LA GUERR DEL CHAC EN EL INM. SGTO FROILAN TEJERINA PROV. ARC GUAYAB	38.685,00	38.685,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
2	906-17958-00000	13-0080-00	RESTAU. TEMPLO CATEDRAL METROPOLITANA DE TARIJA	59.733,00	59.733,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
3	906-17962-00000	13-0081-00	RESTAU. CASA GENERAL FRANSSISCO BOURDETH O'CONNOR	41.948,00	41.948,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
4	906-17950-00000	13-0083-00	RESTAU. DE LOS CAMINOS PRECOLOMBINOS TRAMO EL SAIRE- ALISOS DEL CARMEN- LA HONDURA	43.957,00	43.957,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
5	906-01255-00000	42-0084-00	DIAGN. DEL PATRIMONIO NATURAL DEL DPTO DE TARIJA	343.626,00	572.712,00	114.542,28	20,00%	46,00%	EN EJECUCION
7			INVERSION	4.180.544,00	3.951.458,00	0,00	0,00%		
1	906-17976-00000	13-0078-00	RESTAU. INMUEBLE ARCHIVO HISTORICO DE TARIJA	152.618,00	152.618,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
2	906-19023-00000	13-0085-00	RESTAU. CAM. PRE-COLOMB. PUJZARA- CALDERILLAS- PINOS SUD PROV. AVILEZ Y CERCADO DPTO DE TJA	47.970,00	47.970,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
3	906-19023-00000	13-0085-00	REFAC. DEL MUSEO MOTO MENDEZ EN EL DPTO DE TARIJA	360.162,00	360.162,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
4	906-01252-00000	41-0045-00	CONST. EQUIP. MUSEO VINOS Y SINGANIS PROVINCIA AVILES	1.532.299,00	1.532.299,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
5	906-01251-00000	41-0046-00	CONST. DEL MUSEO COMUNITARIO DE ÑOQUERA EN EL DPTO DE TARIA	693.855,00	693.855,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
6	906-01256-00000	41-0047-00	CONST. CONST. MUSEO COMUNITARIO DE CARACHIMAYO DPTO DE TARIJA	327.718,00	98.632,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO-PARALIZADO
7	906-01250-00000	41-0048-00	REFAC. DEL MUSEO ARQUEOLOGICO CHAGUAYA EN EL DPTO DE TARIJA	1.065.922,00	1.065.922,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
5			STRIA DE HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA	6.560.739,00	1.534.739,00	0,00	0,00%		
3			PREINVERSION	217.456,00	217.456,00	0,00	0,00%		
1	906-01583-00000	11-0132-00	CONST. DE AEROBOMBA MOVIL EN EL DEPTO. DE TARIJA	71.818,00	71.818,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICIACION
2	906-01579-00000	11-0133-00	CONST. DE AEROGENERADOR DE 200W-300W EN EL DEPTO. DE TARIJA	75.399,00	75.399,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO-PARALIZADO
3	906-01569-00000	11-0131-00	CONST. BOMBA MOVIL FLOTANTE EN EL DEPTO. DE TARIJA	70.239,00	70.239,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICIACION
2			INVERSION	6.343.283,00	1.317.283,00	0,00	0,00%		
1	356-17111-00000	11-0009-00	AMPL. GENERACION ELECTRICA PROVINCIA ARCE	1.308.364,00	1.308.364,00	0,00	0,00%	100,00%	CONCLUIDO
2	906-01564-00000	11-0010-00	CONST. PRESA HUACATA-COMPONENTE HIDROELECTRICO	5.034.919,00	8.919,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
27			STRIA DE OBRAS PUBLICAS	104.157.774,00	120.234.633,00	26.627.226,48	22,15%		
3			PREINVERSION	38.504,00	15.760.411,00	0,00	0,00%		
1	906-15283-00000	44-0043-000	CONST. MEJORAMIENTO Y REFACCION STADIUM IV CENTENARIO TARIJA FASE II	38.504,00	417.250,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
2			CONST.OBRAS DE CONCLUSION PISCINA OLIMPICA DEPARTAMENTAL TARIJA	0,00	9.905.334,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
3			CONST.OBRAS DE CONCLUSION VELODROMO OLIMPICO DEPARTAMENTAL TARIJA	0,00	5.437.827,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
24			INVERSION	104.119.270,00	104.474.222,00	26.627.226,48	25,49%		
1	356-17109-00000	10-0055-000	IMPLEM. PROG. INTEGRAL SANEAMIENTO AMBIENTAL QDA. EL MONTE	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
2	356-0040-000000	12-0030-000	CONST. PRESA EL MOLINO TOMAYAPU	7.434.847,00	6.248.414,00	3.273.788,12	52,39%	81,73%	EN EJECUCION
3	356-14517-00000	12-0061-000	CONST. PRESA HUACATA	444.833,00	560.833,00	0,00	0,00%	100,00%	CONCLUIDO
4	356-96670-00000	12-0082-000	CONST. RIEGO (PRESA) CALDERAS	801.200,00	2.359.866,00	1.288.682,83	54,61%	100,00%	CONCLUIDO
5	906-00449-00000	12-0243-000	CONST. PRESA MARQUIRI	598.288,00	598.288,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
6	906-00450-00000	12-0244-000	CONST. PRESA HONDURAS	5.403.122,00	5.294.456,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
7	906-17928-00000	12-0437-000	CONST. RIEGO PRESA CALDERAS FASE II	1.487.116,00	37.116,00	0,00	0,00%	10,00%	EN EJECUCION
8	356-14211-00000	14-0027-000	CONST. EDIFICIO PREFECTURA DE TARIJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO-PARALIZADO
9	906-17834-00000	14-0076-000	REFAC. DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS DE TARIJA	100.000,00	360.106,00	99.614,70	27,66%	35,00%	EN EJECUCION
10	906-17835-00000	14-0090-000	CONST. MURO PERIMETRAL TECNOLOGICO TARIJA	100.000,00	528.529,00	186.968,17	35,38%	45,40%	EN EJECUCION
11	906-15201-00000	14-0096-000	REMODO. Y AMPLIACION PENAL DE MORROS BLANCOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO-PARALIZADO
12	906-17042-00000	14-0104-000	CONTROL DE EROSION DEL SUELO AEROPUERTO CAP. ORIEL LEA PLAZA DE LA CIUDAD DE TARIJA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
13	906-17922-00000	14-0104-000	CONST. DE ALBERGUE PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN TARIJA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
14	356-31308-00000	15-0013-000	DESAR. AGUAS SUBTERR PERF POZOS PRODASUT TARIJA	4.265.103,00	4.265.103,00	1.217.820,02	28,55%	53,00%	EN EJECUCION
15	356-09163-00000	15-0260-000	IMPLEM. SANEAMIENTO AMBIENTAL RIO GUADALQUIVIR	1.000.000,00	884.000,00	39.291,89	4,44%	15,60%	EN EJECUCION
16	906-15555-00000	15-0270-000	AMPL. DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE P/ 32 BARRIOS DE LA CIUDAD DE TJA.	2.893.933,00	6.246.683,00	1.810.351,61	28,98%	60,00%	EN EJECUCION
17	906-00141-00000	40-0034-000	CONST. HOSPITAL MATERNO INFANTIL TARIJA	15.000.000,00	15.000.000,00	1.749.608,49	11,66%	21,90%	EN EJECUCION
18	906-17041-00000	41-0092-000	CONST. Y EQUIP.INSTITUTO MODELO NORMAL SUPERIOR DE CANASMORO	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
19	356-14301-00000	43-0009-000	CONST. T. PUERTA DEL CHACO-CANALETAS -VILLAMONTES	4.296.099,00	14.596.099,00	10.995.118,05	75,33%	93,00%	EN EJECUCION
20	356-14026-00000	43-0137-000	CONST. CAMINO SAN DIEGO SUD - RIO TAMBO	5.262.363,00	5.262.363,00	0,00	0,00%	17,50%	EN EJECUCION
21	906-15189-00000	43-0199-000	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VARIANTE CANALETAS - ENTRE RIOS	8.900.000,00	8.900.000,00	430.577,63	4,84%	15,00%	EN EJECUCION

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
22	906-15203-00000	43-0202-000	CONST. AVENIDA ECOLOGICA TARIJA	21.430.366,00	16.430.366,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
23	356-17500-00000	44-0007-000	CONST. COLISEO CERRADO DEPARTAMENTAL TARIJA	6.900.000,00	6.900.000,00	2.636.697,78	38,21%	48,96%	EN EJECUCION
24	906-15202-00000	44-0012-000	CONST. MEJORAMIENTO Y REFACCION STADIUM IV CENTENARIO TARIJA FASE I	5.000.000,00	5.000.000,00	2.898.707,19	57,97%	76,50%	EN EJECUCION

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
11			STRIA DE DESARROLLO SOCIAL	32.202.215,00	31.981.256,00	2.074.616,13	6,49%		
6			PREINVERSION	943.018,00	1.208.184,00	60.893,60	5,04%		
1	906-15293-00000	40-0009-00	CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE SALUD MENTAL TARIJA	198.478,00	198.478,00	0,00	0,00%	99,00%	EN EJECUCION
2	906-15331-00000	40-0012-000	REFAC. Y AMPL. SERVICIOS DE EMERG., ESTERILIZ. Y ARCHIVO CLINICO HOSP. REG. S. JUAN DE DIOS TARIJA	24.352,00	267.900,00	0,00	0,00%	90,00%	EN EJECUCION
3	906-00139-00000	40-0036-000	CONST. Y EQUIPAMIENTO ONCOLOGICO TARIJA	267.600,00	267.600,00	0,00	0,00%	90,00%	EN EJECUCION
4	906-1903-600000	40-0100-000	CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE TERCER NIVEL CIUDAD DE TARIJA	209.118,00	209.118,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LCITAR
5	906-19037-00000	40-0102-000	CONST. DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DPTO. DE TARIJA	197.800,00	197.800,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LCITAR
6	906-15301-00000	42-0031-000	APOYO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE GENERO TARIJA	45.670,00	67.288,00	60.893,60	90,50%	95,00%	EN EJECUCION
5			INVERSION	31.259.197,00	30.773.072,00	2.013.722,53	6,54%		
1	906-15313-00000	14-0039-000	EQUIP. DE LOS TALLERES DEL RECINTO PENITENCIARIO DE MORROS BLANCOS EN LA CIUDAD DE TARIJA	577.090,00	90.965,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
2	906-15338-00000	40-0025-000	INSTAL. DEL CENTRO ODONTOLOGICO NUEVA ESPERANZA TARIJA	257.368,00	257.368,00	53.294,52	20,71%	25,00%	EN EJECUCION
3	906-15339-00000	40-0033-000	IMPLEM. BRIGADAS DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD COMUNIT. INTERCULT.(SAFCI) DPTO. DE TARIJA	9.106.416,00	7.800.717,00	915.868,01	11,74%	13,00%	EN EJECUCION
4	906-19039-00000	40-0104-000	EQUIP. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS TARIJA	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
5	356-15153-00000	41-0008-000	FORTAL. EQUIP. INST. NORMAL SUPERIOR JMS - CANASMORO	718.323,00	2.024.022,00	1.044.560,00	51,61%	55,00%	EN EJECUCION

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
21			STRIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	6.875.425,00	6.875.425,00	310.822,22	4,52%		
17			PREINVERSION	3.580.032,00	3.580.032,00	0,00	0,00%		
1	906-19019-00000	10-0100-000	CONST. DE UN ZOOCRIADERO DE LA CHARATA (ORTALISCANICOLLIS) EN LA PROV O'CONOR DPTO DE TARIJA	164.128,00	100.744,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
2	906-19084-00000	10-0103-000	DIAGN. E IDENTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESPECIES SILVESTRES EN EL DPTO. DE TARIJA	120.376,00	120.376,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
3	906-15398-00000	12-0267-000	CONST. PRESA CARRIZAL-SISTEMA DE RIEGO IVIBOBO EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
4	906-15399-00000	12-0268-000	CONST. E IMPLEMENTACION REPRESA SAN TELMO	643.260,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
5	906-00352-00000	12-0310-000	CONST. RIEGO Y PRESA CAÑADAS - TARUPAYO	569.912,00	301.615,00	0,00	0,00%	1,00%	PARALIZADO
6			CONST. DE SISTEMA DE RIEGO HUACANQUI	560.000,00	315.000,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
7	906-19031-00000	12-0570-000	CONST. PRESA CHAMATA	847.900,00	438.700,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
8	906-19020-00000	12-0576-000	CONST. DE PISIGRANJA P/LA CRIANZA PEZ CARPA EN LOS MUN. DE PADCAYA , CERCADO Y SAN LORENZO DPTO DE TARIJA	120.376,00	76.376,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
9	906-17275-00000	12-0700-000	CONST. SISTEMA DE RIEGO TOMAYAPO	544.080,00	408.060,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
10		13-0037-000	CONSTRUCCION GRANJA PILOTO PARA MANEJO Y DRIANZA DE ANDUES RHEA AMERIC. COMUNID. CHIQUIACA PROV. O'CONNOR	0,00	63.384,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
11		13-0039-000	CONSTRUCCION PRESA CALDERILLAS	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
12		12-0263-000	CONSTRUCCION PRESA CHIPAU	0,00	173.470,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
13		13-0264-000	CONSTRUCCION PRESA SANTA ANA	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
14		12-0265-000	CONSTRUCCION PRESA LEONCITO - PAICHO	0,00	93.259,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
15		12-0292-000	CONSTRUCCION PRESA RUMICANCHA	0,00	921.360,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
16		12-0382-000	APOYO EN LA CONSERVACION DEL POTENCIAL PISCICOLA EN EL CANTON HUAYCO PROV. O'CONNOR	0,00	44.000,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
17		15-0019-000	DOTAR DE AGUA RINCON DE LA VICTORIA	0,00	123.688,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
4			INVERSION	3.295.393,00	3.295.393,00	310.822,22	9,43%		
1	906-15371-00000	10-0113-000	IMPLEM. COMITES DE MONITOREO SOCIO-AMBIENTAL EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL DPTO. DE TARIJA	597.831,00	567.827,00	31.866,83	5,61%	8,00%	EN EJECUCION
2	906-19032-00000	10-0120-000	EQUIP. PARA LA GESTION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	1.000.000,00	1.000.000,00	8.190,00	0,82%	2,00%	EN EJECUCION
3	356-12114-00000	10-0262-000	DESAR. PLANTACIONES FORESTALES EN EL DPTO DE TARIJA	1.443.230,00	1.443.230,00	185.629,99	12,86%	14,00%	EN EJECUCION
4	356-12113-00000	12-0090-000	CONTROL Y COMBATE FITOSANIT. QUEMA QUEMA V. CENTRAL	254.332,00	284.336,00	85.135,40	29,94%	35,00%	EN EJECUCION

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
34			STRIA DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMPESINO	3.175.801,00	3.875.156,00	455.105,41	11,74%		
28			PREINVERSION	1.736.983,00	3.086.338,00	245.100,00	7,94%		
1	906-15239-00000	12-0067-00	IMPLEM. DE CARPAS SOLARES P/ LA SEG. ALIMENTARIA EN EL DEPTO. DE TARIJA	117.649,00	117.649,00	0,00	0,00%	100,00%	CONCLUIDO
2	906-15299-00000	12-0076-00	RECUP. Y REHAB. DE TIERRAS EN EL VALLE CENTRAL Y ZONA ALTA DE TJA.	134.800,00	337.000,00	101.100,00	30,00%	40,00%	EN EJECUCION
3	906-15232-00000	12-0221-00	REFAC. Y AMPL. DEL INSTITUTO TECNOLOGICO TARIJA	48.060,00	242.340,00	0,00	0,00%	5,00%	EN EJECUCION
4	906-00314-00000	12-0330-00	CONST. PARQUE INDUSTRIAL PROVINCIA CERCADO DE TARIJA	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
5	906-15208-00000	12-0336-00	IMPLEM. DE UNA FABRICA DE CAL HIDRATADA EN EL DEPTO. DE TARIJA	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
6	906-15210-00000	12-0338-00	IMPLEM. DE LA INDUSTRIA DE LANA DE ANGORA EN EL DEPTO. DE TARIJA	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
7	906-15211-00000	12-0339-00	MANEJO INTEGRAL ARTESANAL DE CACTUS EN LA ZONA ALTA DEL DEPTO. DE TARIJA	40.000,00	80.000,00	24.000,00	30,00%	40,00%	EN EJECUCION
8	906-15214-00000	12-0340-00	IMPLEM. DE LA INDUSTRIA DEL HONGO AGARICUS BLAZEI MURIL EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
9	906-15213-00000	12-0342-00	APOYO A LA PRODUCCION DE ALOE VERA Y SUS DERIVADOS EN EL DEPTO. DE TARIJA	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
10	906-15218-00000	12-0343-00	IMPLEM. DE UN TALLER ARTESANAL DE PRODUCTOS DE BAMBU EN EL DEPTO. DE TARIJA	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%	EN EJECUCION
11	906-15215-00000	12-0344-00	CONST. Y EQUIP. DE UNA FABRICA DE CERAMICA PARA LA CIUDAD DE TARIJA PROV. CERCADO	100.000,00	200.000,00	60.000,00	30,00%	35,00%	EN EJECUCION
12	906-15217-00000	12-0347-00	IMPLEM. DE UNA FABRICA DE VIDRIO EN EL DEPTO. DE TARIJA	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	30,00%	EN EJECUCION
13	906-15207-00000	12-0348-00	IMPLEM. DE UNA FABRICA DE YESO EN EL DEPTO. DE TARIJA	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
14	906-15229-00000	12-0349-00	IMPLEM. DE UNA FABRICA DE MALLAS PARA VID EN EL DEPTO. DE TARIJA	100.000,00	200.000,00	60.000,00	30,00%	65,00%	EN EJECUCION
15	906-15230-00000	12-0351-00	IMPLEM. DE UNA FABRICA DE CAMELOS EN BERMEJO	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
16	906-19052-00000	12-0430-00	CONST. DE ALJIBES P/ EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS COM. DEL AREA DISPERSA DEL DPTO. TJA.	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
17	906-19060-00000	12-0433-00	DIAGN. DE LA PRODUCCION DE LA CAA DE AZUCAR EN LA PROV. ARCE	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
18	906-19062-00000	12-0435-00	DESAR. COMPLEJO PRODUCTIVO DE CAPRINOS EN EL DPTO. DE TARIJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
19	906-19025-00000	12-0455-00	DESAR. EN LA IMPLEMENTACION DE BIODIGESTORES EN EL DPTO. DE TARIJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
20	906-19027-00000	12-0456-00	DESAR. A LA PRODUCCION CUNICOLA EN EL PUENTE, YUNCHARA Y SAN LORENZO	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
21	906-19029-00000	12-0457-00	DESAR. DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TOMATE EN EL DPTO. DE TARIJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
22	906-19051-00000	12-0458-00	DESAR. DEL PASTO MARALFALFA PARA GANADO EN EL DPTO. DE TARIJA	10.000,00	129.046,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
23	906-19049-00000	12-0459-00	DESAR. MECANIZACION DE ORDEO P/ BOVINOS EN EL DPTO. DE TARIJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
24	356-14908-00000	13-0053-00	IMPLEM. SEÑALIZACION TURISTICA DEPARTAMENTO DE TARIJA	103.104,00	350.283,00	0,00	0,00%	0,00%	EN EJECUCION

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
25	906-19008-00000	13-0050-00	IMPLEM. BALNEARIOS NATURALES P/ EL TURISMO EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	120.798,00	170.798,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
26	906-19009-00000	13-0051-00	CONST. CENTRO INTEGRAL DE INFORMACION Y ATENCION FRONTERIZA EN BERMEJO	10.000,00	96.650,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
27	906-19011-00000	13-0052-00	DESAR. CIRCUITOS TURISTICOS EN LOS VALLES ALTOS DE LA PROV. MENDEZ	120.612,00	120.612,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
28	906-19013-00000	13-0053-00	DESAR. RUTA ESCENICA BERMEJO - TARIJA	111.960,00	111.960,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
6			INVERSION	1.438.818,00	788.818,00	210.005,41	26,62%		
1	906-17861-00000	12-0203-00	MANEJO Y RECUP. DE SUELOS COMPACTADOS DE SIEMBRA A SECANO DEL DPTO. DE TARIJA	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
2	356-14558-00000	12-0302-00	CONST. CENTRO DE ACOPIO DE LA MADERA EN LA CIUDAD DE TARIJA	519.651,00	179.651,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
3	906-15241-00000	12-0353-00	CONST. DE 6 CENTROS DE PROD. COMUNAL EN ISCAYACHI Y CURQUI	609.167,00	609.167,00	210.005,41	34,47%	38,00%	EN EJECUCION
4	906-17827-00000	14-0425-00	CONST. MAQUICENTRO EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
5	906-19064-00000	12-0432-00	CONST. DE MOD. PRODUC. DE TRUCHA EN LA COM. DE LA HUERTA	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
6	906-17239-00000	42-0070-00	CONST. CENTRO DE PANIF. NO VIDENTES EN LA CIUDAD DE TARIJA	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
16			DIRECCION DE PUEBLOS INDIGENAS	9.029.001,00	9.029.001,00	180.352,66	2,00%		
1			PREINVERSION	29.370,00	29.370,00	22.027,50	75,00%		
1	356-12290-00000	41-0022-000	IMPLEM. INSTITUTO TEC. ITIKA GUAZU DPTO DE TARIJA	29.370,00	29.370,00	22.027,50	75,00%	95,00%	EN EJECUCION
15			INVERSION	8.999.631,00	8.999.631,00	158.325,16	1,76%		
1	906-15320-00000	12-0084-000	IMPLEM. DE AVES DE CORRAL EN COMUNIDADES DE LA ZONA APG CARAPAR	398.237,00	398.237,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
2	906-15321-00000	12-0085-000	MEJ. DE LA PRODUCCION AVICOLA EN LA ZONA APG YAKU - IGUA	639.266,00	639.266,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
3	906-15323-00000	12-0087-000	IMPLEM. RAZA DUROC PORCINA EN COMUNIDADES DEL PUEBLO WEENHAYEK	1.271.097,00	1.271.097,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
4	906-15325-00000	12-0088-000	IMPLEM. CAPRINOS PARA PRODUCC. DE CARNE Y QUESO SISTEMA SEMI-INTENSIVO SAMUGUATE	232.581,00	232.581,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
5	356-14253-00000	12-0306-000	INVEST.Y TRANSF.TECNOL. MIEL COM. INDIGENAS DPTO TARIJA	1.340.793,00	990.793,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
6	906-00337-00000	12-0307-000	IMPLEM. CENTRO ACOPIO DE PROD. AGRIC. APG VILLA MONTES	766.895,00	1.076.245,00	0,00	0,00%	15,00%	EN EJECUCION
7	356-14458-00000	12-0308-000	MANEJO Y RECUP.DE LA ESP.CARAHUATA COM. WEENHAYEK	616.364,00	1.579.864,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
8	906-00317-00000	12-0331-000	CONST. CENTROS DE COMERC. ARTESAN. GUARAN. ASOCC.TEMBIAPOR.	700.106,00	195.606,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
9	906-15312-00000	12-0406-000	APOYO AL MEJORAM. DE CULTIVOS POTENC. COMUNID. GUARANIES ZONA 1 DEL ITIKA GUAZU	973.675,00	973.675,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
10	906-15318-00000	12-0407-000	IMPLEM. PRODUCCION DE GANADO BOVINO EN 6 COMUNID. ZONA 2-ITIKAGUASU PROV. OCONNOR	231.900,00	231.900,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
11	906-15316-00000	12-0408-000	APOYO DESARR. AGRICOLA CON CULTIVOS ESTRAT. COMUNID. GUARANIES ZONA 3 DEL ITIKA GUASU	844.085,00	539.735,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
12	906-15322-00000	12-0409-000	CONST. DE UN POTRERO COMUNAL PARA LA ZONA APG VILLA MONTES	240.787,00	240.787,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
13	906-15326-00000	12-0410-000	IMPLEM. CRIA OVEJAS DE PELO SISTEMA PRODUCC. SEMI-INTENSIVO SAMUGUATE	265.886,00	265.886,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
14	906-15303-00000	12-0412-000	IMPLEM. DE GALLINAS PONEDORAS EN EL PUEBLO TAPIETE	150.000,00	36.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
15	356-17602-00000	16-0007-000	FORTAL.CAPAC.Y EQUIPAMIENTO A LAS UDAIPOS DEL DPTO DE TAR	327.959,00	327.959,00	158.325,16	48,28%	52,00%	EN EJECUCION
5			SEDESA	17.028.958,00	16.107.582,00	2.882.219,85	17,89%		
0			PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00%		
5			INVERSION	17.028.958,00	16.107.582,00	2.882.219,85	17,89%		
1	906-15345-00000	12-0358-000	IMPLEM. PROG. DE ERRADICACION DE FIEBRE AFTOSA (PRODEFA) EN EL DEPTO. DE TARIJA	7.394.917,00	7.044.917,00	1.364.700,87	19,37%	22,93%	EN EJECUCION
2	906-15350-00000	12-0359-000	IMPLEM. PROG. DE CONTROL DE RABIA PARESCIANTE EN EL DEPTO. DE TARIJA	2.548.455,00	2.448.455,00	338.795,08	13,84%	24,68%	EN EJECUCION
3	906-15352-00000	12-0360-000	IMPLEM. PROGR. DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN EL DEPTO. DE TARIJA	1.500.618,00	1.349.338,00	319.259,08	23,66%	78,00%	EN EJECUCION
4	906-15347-00000	12-0361-000	IMPLEM. PROG. DE SANIDAD EN AVES DE TRASPATIO EN EL DEPTO. DE TARIJA	1.755.000,00	1.604.904,00	368.038,52	22,93%	28,44%	EN EJECUCION
5	906-15353-00000	12-0362-000	IMPLEM. PROG. DE MANEJO INTEGRADO DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL DEPTO. DE TARIJA	3.829.968,00	3.659.968,00	491.426,30	13,43%	35,00%	EN EJECUCION

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
71			A.2.- UNIDADES DESCONCENTRADAS	320.597.930,00	339.854.594,00	61.569.036,05	18,12%		
2			CEVITA	1.310.588,00	611.233,00	0,00	0,00%		
0			PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2			INVERSION	1.310.588,00	611.233,00	0,00	0,00%		
1	356-13012-00000	12-0003-00	INVEST. PLANTAS MEJORADAS DE VID VALLE CENTRAL TJA.	810.588,00	451.752,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
2	356-13129-00000	12-0014-00	INVEST. CARACTER. DE UVAS, VINOS Y SINGANIS DE ALTURA	500.000,00	159.481,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
12			SAN JACINTO	32.137.998,00	30.437.998,00	1.653.297,99	5,43%		
1			PREINVERSION	0,00	268.251,00	0,00	0,00%		
1		12-0100-000	CONSTRUCCION DE LA TUBERIA PRINCIPAL DE RIEGO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	0,00	268.251,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
11			INVERSION	32.137.998,00	30.169.747,00	1.653.297,99	5,48%		
1	906-15346-00000	10-0107-00	FOREST. DE LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA	2.114.089,00	2.171.431,00	175.941,50	8,10%	10,00%	EN EJECUCION
2	906-15363-00000	10-0108-00	CONTROL DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN TRANSITO AL LAGO SAN JACINTO	7.059.297,00	6.551.737,00	59.132,51	0,90%	2,00%	EN EJECUCION
3	356-09338-00000	10-0212-00	CONTROL SEDIMENTOS CUENCA RIO TOLOMOSA-S. JACINTO	6.117.953,00	5.404.728,00	822.628,17	15,22%	17,00%	EN EJECUCION
4	906-15365-00000	12-0384-00	CONST. ESTANQUES PISCICOLAS SUB CENTRAL TOLOMOSA	2.346.659,00	2.121.079,00	86.658,65	4,09%	5,00%	EN EJECUCION
5	906-19015-00000	12-0554-00	REHAB. Y MEJORAMIENTO DE SUELOS AGRICOLAS EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA	2.000.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
6	906-19014-00000	12-0559-00	REFAC. Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA CENTRAL DE RIEGO PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	3.000.000,00	4.925.322,00	276.438,51	5,61%	7,00%	EN EJECUCION
7	906-19016-00000	12-0560-00	REHAB. DE SUELOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	5.000.000,00	3.013.225,00	74.529,64	2,47%	4,00%	EN EJECUCION
8	906-19017-00000	12-0565-00	CONST. DE DEFENSIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA	3.000.000,00	260.446,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
9	906-19003-00000	12-0580-00	DESAR. DE LA PRODUCCION DEL OREGANO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	1.500.000,00	2.885.633,00	157.969,01	5,47%	7,00%	EN EJECUCION
10		12-0045-000	CONSTRUCCION DEPOSITOS SUNCHU HUAYCO SW-B	0,00	836.146,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
11		24-0130-000	ANALISIS BATIMETRICO DEL LAGO SAN JACINTO	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
4			SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	5.726.096,00	5.923.981,00	917.631,21	15,49%		
1			PREINVERSION	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%		
1	906-19041-00000	40-0106-00	CONST. Y EQUIPAMIENTO SEDES - DPTO. DE TARIJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
3			INVERSION	5.716.096,00	5.913.981,00	917.631,21	15,52%		
1	906-15315-00000	40-0023-00	CONTROL INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	4.069.829,00	4.069.829,00	638.842,03	15,70%	21,20%	EN EJECUCION
2	906-15309-00000	40-0026-00	CONTROL DE LA MALARIA EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	1.403.740,00	1.403.740,00	278.789,18	19,86%	28,60%	EN EJECUCION
3	906-19043-00000	40-0108-00	EQUIP. DEL LABORATORIO EN LA UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL SEDES DPTO. DE TARIJA	242.527,00	440.412,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
24			SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	175.013.434,00	211.603.977,00	49.410.925,98	23,35%		
2			PREINVERSION	77.315,00	77.315,00	0,00	0,00%		
1	906-00599-00000	43-0016-000	CONST. ASFALTADO CAMINO CRUCE F1 - TOMAYAPO (LA PARROQUIA)	27.315,00	27.315,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
2	906-17951-00000	43-0708-000	CONST. ASFALTADO TRAMO INGRESO AEROPUERTO BERMEJO - NARANJITOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
22			INVERSION	174.936.119,00	211.526.662,00	49.410.925,98	23,36%		
1	356-12084-00000	43-0005-000	MEJ. CAM. CONCEPCION-CHOCLOCA-JUNTAS-CHAGUAYA	4.296.279,00	5.480.252,00	2.997.950,47	54,70%	56,00%	EN EJECUCION
2		43-0009-000	CONST. T. PUERTA DEL CHACO-CANALETAS -VILLAMONTES	0,00	2.592.501,00	1.471.164,05	56,75%	99,00%	EN EJECUCION
3	356-14464-00000	43-0011-000	CONST. DEL ASFALTADO DEL TRAMO BERMEJO SAN ANTONIO	4.000.000,00	24.500.000,00	2.235.259,28	9,12%	10,00%	EN EJECUCION
4	356-14955-00000	43-0019-000	CONST. ASFALTADO CAMINO ROSILLAS-MECOYA	8.636.386,00	147.473,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
5	356-16977-00000	43-0026-000	CONST. CAMINO SERRANIA TAPECUA-ZAPATERAMBIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
6	356-16978-00000	43-0080-000	CONST. CAMINO ZAPATERAMBIA - ITAGUAZUTI	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
7	356-15102-00000	43-0142-000	CONST. ASFALTADO ISCAYACHI FINAL COPACABANA	50.359.879,00	33.777.837,00	12.364.341,20	36,60%	38,00%	EN EJECUCION
8	906-00401-00000	43-0155-000	CONST. CAM.TOMATITAS-E.NORTE-E.CEIBAL CR. CADILLAR	8.360.255,00	17.671.942,00	8.096.518,10	45,82%	50,00%	EN EJECUCION
9	906-15114-00000	43-0197-000	CONST. CAMINO CR F11 (SANTA ANA) - YESERA	12.377.413,00	26.085.001,00	7.586.525,91	29,08%	31,00%	EN EJECUCION
10	906-15348-00000	43-0210-000	CONST. CAMINO PUENTE JARCAS JUNACAS PIEDRA LARGA	12.823.289,00	373.289,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
11	906-15356-00000	43-0211-000	CONST. DEL TUNEL PIEDRA LARGA PROG. 19+000	4.076.508,00	4.076.508,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
12	906-15360-00000	43-0213-000	CONST. ASFALTADO CAMINO CR RT F11- D631- SALADITO CENTRO	6.407.634,00	3.278.648,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
13	906-15379-00000	43-0214-000	CONST. OBRAS DE ARTE MAYOR TRAMO NARVAEZ - SAN JOSECITO	3.247.991,00	3.247.991,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
14	906-15386-00000	43-0215-000	CONST. ASFALTADO CAMINO TOLOMOSA CAMACHO	12.377.413,00	13.661.091,00	5.062.210,21	37,06%	39,00%	EN EJECUCION
15	906-15388-00000	43-0216-000	CONST. CAMINO SAN JOSECITO - EL PESCADO	4.896.512,00	4.896.512,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
16	906-15395-00000	43-0217-000	CONST. ASFALTADO CAMINO SAN ANDRES SAN PEDRO DE SOLA	7.000.000,00	11.000.000,00	3.531.908,11	32,11%	35,00%	EN EJECUCION
17	906-17235-00000	43-0240-000	CONST. ASFALTADO CAMINO ISCAYACHI-TOJO-CARRETAS (TRAMO FINAL COPACABANA -YUNCHARA)	9.067.918,00	2.035.501,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
18	906-17860-00000	43-0290-000	CONST. ASFALTADO CAMINO T. VIAL CARAPARI-EL CAJON-BERMEJO SUB T. COLONIA LINARES -P. S. TELMO-P. S. ANTONIO	10.584.151,00	45.265.780,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
19	906-19095-00000	43-0293-000	CONST. ASFALTADO CAMINO BELLA VISTA MISCAS CALDERAS	4.010.000,00	997,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
20	906-19101-00000	43-0294-000	MEJ. CAMINO MATADERO TEMPORAL SAN JACTINO NORTE - SAN JACINTO SUD-TABLADA (FASE II)	7.384.491,00	11.131.006,00	6.065.048,65	54,49%	56,00%	EN EJECUCION
21	906-19100-00000	43-0295-000	CONST. ASFALTADO CAMINO PUEBLO NUEVO ISCAYACHI EL MOLINO	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
22		43-0098-000	MEJ. CAM. MATADERO - TEMP-S.J. NORTE-S.J.SUD - TABLADA	0,00	2.304.333,00	0,00	0,00%	0,00%	EN EJECUCION

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
14			SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	28.035.084,00	28.035.084,00	2.840.349,35	10,13%		
0			PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00%		
14			INVERSION	28.035.084,00	28.035.084,00	2.840.349,35	10,13%		
1	356-11150-00000	12 0009 000	CAPAC. PRODUC. HABA ZONA ALTA (EL PUENTE-YUNCHARA)	948.676,00	948.676,00	152.772,56	16,10%	96,49%	EN EJECUCION
2	356-13295-00000	12 0015 000	MEJ. COMPETITIVO DE LA CADENA MANZANILLA DE ALTURA	544.982,00	571.672,00	114.891,46	20,10%	90,51%	EN EJECUCION
3	356-15016-00000	12 0038 000	TRANSF.TEC. Y DIF.GERMOPLASMA EN CITRICOS-MAIZ CARAPARI	10.000,00	5.310,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO-PARALIZADO
4	356-13285-00000	12 0097 00	INVEST.Y TRANSF.TEC.PARA GANADERIA CAMPESINA DEPTO.TARIJA	4.500.000,00	4.500.000,00	633.444,85	14,08%	71,99%	EN EJECUCION
5	356-17122-00000	12 0275 000	IMPLEM. PROG. APOYO PRODUC. AGRICOLA(PROMAGRO-MECANIZ) F1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO-PARALIZADO
6	906-00423-00000	12 0295 000	FORTAL. CADENA PRODUC. CAMELIDOS EN YUNCHARA - EL PUENTE FASE II	4.000.000,00	4.000.000,00	269.462,21	6,74%	25,44%	EN EJECUCION
7	906-00422-00000	12 0296 000	CONST. EQUIP. CENTRO PRODUC. SEMILL. AGAMICAS-CEPROSA DPTO. TARIJA	4.000.000,00	3.724.879,00	151.523,64	4,07%	8,75%	EN EJECUCION
8	906-00315-00000	12 0303 000	DESAR. COMPL. HORTOFRUTICOLA EN EL DPTO. DE TARIJA FASE I	2.500.000,00	2.500.000,00	326.252,07	13,05%	52,33%	EN EJECUCION
9	906-00316-00000	12 0304 000	DESAR. COMPL. PROD. BOVINOS EN EL DPTO. DE TARIJA FASE I	4.000.000,00	4.000.000,00	300.798,83	7,52%	24,44%	EN EJECUCION
10	906-15281-00000	12-0352-00	APOYO TEC. Y CONST. DE INFRAEST. BAS. PRODUCT. PEC. EN LOS CANTONES DE ISCAYACHI Y CURQUI	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO-PARALIZADO
11	906-15281-00000	12-0352-00	APOYO TEC. Y CONST. DE INFRAEST. BAS. PRODUCT. AGRICOLA EN LA ZONA ALTA DEL DEPTO. DE TARIJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO-PARALIZADO
12	906-15281-00000	12-0352-00	FORTAL. A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CITRICOS EN LA PROVINCIA ARCE DEPARTAMENTO DE TARIJA	4.041.948,00	4.041.948,00	470.986,80	11,65%	21,56%	EN EJECUCION
13	906-15281-00000	12-0352-00	IMPLEM. CENTRO DE MEJ. GENETICO DE GAN. BOVINO EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	1.000.000,00	2.255.121,00	62.016,36	2,75%	23,69%	EN EJECUCION
14	906-15281-00000	12-0352-00	TRANSF.TEC.Y DIF.GERMOPL.CARROZOS PEPITA-MAIZ-Y ARV V.CENTRA	1.487.478,00	1.487.478,00	358.200,57	24,08%	90,08%	EN EJECUCION
6			PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	36.979.488,00	37.900.864,00	5.415.170,72	14,29%		
0			PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00%		
6			INVERSION	36.979.488,00	37.900.864,00	5.415.170,72	14,29%		
1	906-15247-00000	10-0033-000	RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA MEDIA DEL RIO SANTA ANA	10.997.335,00	9.320.477,00	604.306,90	6,48%	8,00%	EN EJECUCION
2	906-15263-00000	10-0034-000	RESTAU. HIDROLOGICA FORESTAL SUBCUENCA DEL RIO TOLOMOSA	12.609.408,00	14.280.720,00	2.128.651,44	14,91%	16,00%	EN EJECUCION
3	906-15261-00000	10-0037-000	RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA ALTA DEL RIO GUADALQUIVIR	9.817.030,00	10.557.887,00	1.187.744,33	11,25%	13,00%	EN EJECUCION
4	356-14000-00000	10-0218-000	RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL SUB CUENCA RIO CAMACHO	29.088,00	29.088,00	22.761,20	78,25%	79,00%	EN EJECUCION
5	356-14002-00000	10-0219-000	RESTAU. DE LAS MICROCUENCAS ZONA ALTA TARIJA	532.522,00	921.602,00	38.489,00	4,18%	6,00%	EN EJECUCION
6	356-17009-00000	10-0229-000	RESTAU. Y MANEJO INTEG. MICRO CUENCA PAYUYO	2.994.105,00	2.791.090,00	1.433.217,85	51,35%	55,00%	EN EJECUCION

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
7			UTEPTAR - GIRH	39.906.383,00	23.829.524,00	1.234.301,87	5,18%		
6			PREINVERSION	1.148.610,00	2.507.244,00	886.690,00	35,37%		
1	906-15382-00000	12-00033-000	CONST. SISTEMA DE RIEGO CON AGUAS RESIDUALES TRATADAS COMUN. SAN ANTONIO LA CABAÑA	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
2	906-15377-00000	15-0016-000	DIAGN. Y PLAN DE ACCION DEL SECTOR INDUSTRIAL Y DOMESTICO PROV. CERCADO	299.626,00	998.394,00	599.035,00	60,00%	62,00%	EN EJECUCION
3	906-15375-00000	15-0018-000	DIAGN. Y PLAN DE ACCION DE GESTION INTEGRAL DE RECURSOS HIDRICOS VALLE CENTRAL DE TARIJA	398.984,00	958.850,00	287.655,00	30,00%	33,00%	EN EJECUCION
4	906-17931-00000	15-0101-000	IMPLEM. DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES EN LA CIUDAD DE TARIJA	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
5	906-18011-00000	15-0102-000	IMPLEM. DEL CENTRO DE INNOVACION EN RIEGO CON AGUA RESIDUALES TRATADAS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
6		12-0381-000	CONST. SISTEMA DE RIEGO CON AGUAS RESIDUALES TRATADAS COMUN. LADERAS	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
1			INVERSION	38.757.773,00	21.322.280,00	347.611,87	1,63%		
1	906-15370-00000	15-0015-000	CONST. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROV. CERCADO	38.757.773,00	21.322.280,00	347.611,87	1,63%	2,00%	EN EJECUCION
1			INTRAID	488.859,00	488.859,00	52.428,93	10,72%		
0			PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1			INVERSION	488.859,00	488.859,00	52.428,93	10,72%		
1	356-11445-00000	42-0005-000	REHAB. PREEVEN. TRAT. DROGODEPENDENCIA Y SALUD MENTAL 2ª FAS	488.859,00	488.859,00	52.428,93	10,72%	13,00%	EN EJECUCION
1			BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DPTAL TARIJA	1.000.000,00	1.023.074,00	44.930,00	4,39%		
0			PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1			INVERSION	1.000.000,00	1.023.074,00	44.930,00	4,39%		
1	906-19045-00000	40-0110-000	EQUIP. MEDICO Y LABORATORIO PARA EL BANCO DE SANGRE DPTO. DE TARIJA	1.000.000,00	1.023.074,00	44.930,00	4,39%	6,00%	EN EJECUCION

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
637			A.3.- UNIDADES SECCIONALES	1.519.966.463,00	1.582.124.308,73	409.726.772,59	25,90%		
18			UNIDAD SECCIONAL DE CERCADO	49.775.669,00	41.967.907,00	439.159,26	1,05%		
5			PREINVERSION	596.489,00	951.490,00	224.263,37	23,57%		
1	906-00594-00000	12-0004-00	CONST. SISTEMAS DE RIEGO PROVINCIA CERCADO FASE I	382.925,00	574.387,00	172.316,10	30,00%	50,00%	EN EJECUCION
2	906-19050-00000	14-0602-00	CONST. CASA DEL ADULTO MAYOR 1RA SECC. PROV. MENDEZ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
3	906-19053-00000	24-0605-00	REHAB. DE AREAS DEGRADADAS EN LA PROV. CERCADO	148.419,00	173.158,00	51.947,27	30,00%	40,00%	EN EJECUCION
4	356-14349-00000	43-0027-00	CONST. PUENTE VEHICULAR PINOS SUD CALDERILLAS	12.000,00	150.800,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
5	906-00203-00000	43-0032-00	CONST. OBRAS DE ARTE QUEBRADA EL GRINGO	23.145,00	23.145,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
13			INVERSION	49.179.180,00	41.016.417,00	214.895,89	0,52%		
1	356-14545-00000	11-0019-00	CONST. ELECTRIFICACION JUNACAS ALTO ESPAÑA	4.204.622,00	4.204.622,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
2	356-14346-00000	11-0033-00	AMPL. ELECTR.CANT.S.MATEO, YESERA, TOLOMOSA Y LAZARETO	10.347.608,00	10.342.051,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
3	356-14532-00000	12-0062-00	CONST. SISTEMA DE RIEGO CIRMINUELAS - CHUAPICANCHA	1.317.253,00	1.317.253,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
4	906-19094-00000	12-0639-00	DESAR. Y FOMENTO A LA CADENA DEL OREGANO PROV. CERCADO	560.591,00	560.591,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
5	906-01539-00000	12-0660-00	MEJ. Y AMP. SISTEMA DE RIEGO JUNACAS ALTO ESPAA FASE II	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
6	356-14736-00000	13-0008-00	CONST. MIRADOR SAMA BARRIO SAN MARTIN	209.350,00	214.907,00	214.895,89	99,99%	100,00%	CONCLUIDO
7	356-14741-00000	40-0021-00	CONST. INTERNADO RURAL YESERA NORTE	1.015.590,00	1.652.827,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
8	356-09878-00000	43-0036-00	CONST. CAMINO PINOS SUD-CALDERILLAS-PASAJES	2.318.086,00	2.318.086,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
9	906-17040-00000	43-0114-00	CONST. PUENTE RIO GUADALQUIVIR Y SAN BLAS	8.235.000,00	5.235.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
10	906-00202-00000	43-0221-00	CONST. PUENTE VEHICULAR QUEBRADA EL MONTE	2.541.613,00	2.541.613,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
11	356-16244-00000	43-0224-00	APERT. CAMINO CIENEGUILLAS-CRISTALINAS-ALTOPOTREROS FII	4.249.467,00	4.249.467,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
12	906-19021-00000	43-0454-00	CONST. PUENTE VEHICULAR SENAC TABLADA GRANDE	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
13	356-14536-00000	43-0455-00	MEJ. CON EMPEDRADOS CIRCUITO TOLOMOSITA CENTRO	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
57			UNIDAD SECCIONAL DE PADCAYA	149.764.875,00	157.572.637,00	19.833.190,77	12,59%		
18			PREINVERSION	3.463.312,00	3.108.311,00	0,00	0,00%		
1	906-15194-00000	11-0115-00	CONST. RED ELECTRICA TARIQUIA	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
2			MEJ. SISTEMA DE RIEGO DISTRITO 7 PADCAYA	0,00	24.830,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
3	906-17897-00000	12-0504-00	CONST. SISTEMA DE RIEGO ACHERALES - PAMPA GRANDE	294.175,00	269.345,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
4	906-17911-00000	12-0505-00	CONST. DE ATAJADOS COMUNIDAD SAN FRANCISCO	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
5	906-17912-00000	12-0506-00	CONST. DEFENSIVOS LA MERCED - MAMORA NORTE	223.440,00	223.440,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
6	906-17943-00000	12-0509-00	CONST. DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION PISCICOLA 1RA SECCION PROVINCIA ARCE	325.300,00	325.300,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
7	906-17946-00000	12-0510-00	IMPLEM. PROD. ECONOMICA MULTISTRATO DE CITRIC. DURAZ. FOREST. Y CULT. ANUALES 1RA. SECC. PADCAYA.	33.840,00	33.840,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
8	906-17945-00000	12-0511-00	CONST. DE CARPAS SOLARES PARA PROD. DE HORTALIZAS 1RA SECC. PADCAYA	437.500,00	437.500,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
9	906-17947-00000	12-0512-00	IMPLEM. DE LA PRODUCCION DE LA ESTEVIA EN LA 1RA SECCION PROV. ARCE	32.470,00	32.470,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
10	906-17272-00000	12-0550-00	CONST. DE RESERVORIOS Y ATAJADOS ABRA DE SAN MIGUEL - ROSILLAS CRUCE	168.500,00	168.500,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
11	906-17274-00000	12-0551-00	CONST. DE RESERVORIOS Y ATAJADOS EL FUERTE ABRA DE LA CRUZ	144.600,00	144.600,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
12	906-17273-00000	12-0552-00	CONST. DE RESERVORIOS Y ATAJADOS COMUNIDADES DE MARAUERO	94.230,00	94.230,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
13	906-17923-00000	13-0100-00	CONST. INFRAEST. PARA FORT. Y PROM. TURISTICA COMUNITARIA PADCAYA FASE II	195.300,00	195.300,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
14	906-17919-00000	14-0201-00	MEJ. Y AMPLIACION CENTRO TIERRA VIVA PADCAYA	150.340,00	150.340,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
15	906-17869-00000	43-0506-00	CONST. PUENTE VEHICULAR SAN ANTONIO RIO TARIJA	85.400,00	85.400,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
16	906-17870-00000	43-0507-00	CONST. PUENTES VEHICULARES CAMINO SIDRAS CAMPO LA LIMA	138.255,00	138.255,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
17	906-17867-00000	43-0508-00	CONST. ASFALTADO CHALAMARCA - ALISOS DEL CARMEN	348.522,00	316.962,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
18	906-17271-00000	44-0070-00	CONST. COLISEO DEPARTAMENTAL ANICETO ARCE	223.440,00	99.999,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
39			INVERSION	146.301.563,00	154.464.326,00	19.833.190,77	12,84%		
1	906-15198-00000	10-0125-00	CONST. ATAJADOS Y RESERVORIOS DISTRITO 7 PADCAYA	2.704.800,00	2.704.800,00	0,00	0,00%	0,00%	EN EJECUCIÓN
2	906-15197-00000	10-0126-00	CONST. ATAJADOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS	3.393.366,00	7.624.468,00	0,00	0,00%	0,00%	PROCESO DE LICITACIÓN
3	906-17228-00000	10-0301-00	CONST. DEFENSIVOS TREMENTINAL FASE II	2.670.912,00	2.670.912,00	344.030,45	12,88%	15,00%	EN EJECUCIÓN
4	906-17229-00000	10-0303-00	CONST. DEFENSIVOS SAN TELMO - LA GOMA FASE II	2.038.621,00	2.038.621,00	0,00	0,00%	5,00%	EN EJECUCIÓN
5	906-17230-00000	10-0302-00	CONST. DEFENSIVOS LA MAMORA 2DA FASE	2.290.781,00	2.710.781,00	0,00	0,00%	5,00%	EN EJECUCIÓN
6	906-17916-00000	10-0306-00	CONST. DEFENSIVOS CAMACHO SAN JOSE DE CHAGUAYA	5.727.286,00	1.136.041,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
7	906-17231-00000	10-0506-00	CONST. DEFENSIVOS ALISOS DEL CARMEN - OROZAS ABAJO	3.416.540,00	3.731.540,00	0,00	0,00%	5,00%	EN EJECUCIÓN
8	906-17917-00000	10-0507-00	CONST. DEFENSIVOS ROSILLAS CRUCE - EL SAIRE	3.394.406,00	766.048,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
9	906-15103-00000	11-0007-00	MEJ. Y AMPL. SIST ELECT FASE II 1RA SEC PROV. ARCE	4.833.888,00	4.833.888,00	0,00	0,00%	3,00%	EN EJECUCIÓN
10			MEJ. Y AMPL. SISTEMAS DE ELECT. EN LA 1RA SECC. PROV. ARCE	0,00	733.342,00	733.341,05	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
11	356-13207-00000	12-0049-00	CONST. SIST. RIEGO SAN ANTONIO STA. CLARA	357.298,00	614.298,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
12	356-14443-00000	12-0513-00	AMPL. SISTEMA DE RIEGO SAN ANTONIO SANTA CLARA	806.134,00	806.134,00	0,00	0,00%	5,00%	EN EJECUCIÓN
13	906-17904-00000	12-0600-00	CONST. SISTEMA DE RIEGO CAMACHO	4.173.767,00	974.104,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
14	906-17908-00000	12-0601-00	CONST. AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CAÑAS PADCAYA	4.776.806,00	1.740.121,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
15	906-17222-00000	12-0602-00	CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE NOGALITOS MUNICIPIO DE PADCAYA	1.977.325,00	2.722.922,00	582.801,96	21,40%	25,00%	EN EJECUCIÓN
16	906-17218-00000	12-0615-00	APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA 1RA SECCION PROVINCIA ARCE	7.407.338,00	7.407.338,00	2.360.324,62	31,86%	35,00%	EN EJECUCIÓN
17	906-17219-00000	12-0616-00	MEJ. Y APOYO AL DESARROLLO DE LA PROD. FRUTICOLA 1RA SECCION PROVINCIA ARCE	7.042.874,00	7.042.874,00	1.379.616,44	19,59%	23,00%	EN EJECUCIÓN
18	906-17935-00000	12-0650-00	IMPLEM. SISTEMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ARTESANALES 1 SECC. PROV. ARCE	8.302.091,00	8.302.091,00	0,00	0,00%	3,00%	EN EJECUCIÓN
19	906-15200-00000	13-0090-00	CONST. CONST. INFRAEST. PARA FORTALECIM. Y PROM. TURISTICA COMUNIT. PADCAY	4.145.357,00	8.180.546,00	0,00	0,00%	0,00%	PROCESO DE LICITACIÓN
20	906-15107-00000	14-0007-00	AMPL. EDIFICIO GOBERNACION SECCIONAL PADCAYA	940.163,00	1.382.913,00	0,00	0,00%	5,00%	EN EJECUCIÓN
21	906-15199-00000	15-0091-00	MEJ. CONSTRUCCION SANEAMIENTO BASICO PADCAYA	8.517.308,00	12.664.352,00	0,00	0,00%	0,00%	POR INICIAR
22	906-00402-00000	40-0035-00	CONST. Y EQUIP. COCINAS COM.1RA.SEC. PROV. ARCE	3.593.937,00	3.593.937,00	2.961.580,52	82,40%	85,00%	EN EJECUCIÓN
23	906-17948-00000	41-0010-00	CONST. COLEGIO INTERNADO TREMENTINAL 1 SECCION PROV. ARCE	876.106,00	2.668.373,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
24	906-15106-00000	41-0016-00	CONST. ESTADIO DEPARTAMENTAL ANICETO ARCE	5.331.340,00	1.030.763,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
25	906-00404-00000	43-0002-00	CONST. PUENTES DIST. 3 Y 4 PROV. ARCE	6.655.736,00	6.655.736,00	2.733.255,88	41,07%	45,00%	EN EJECUCIÓN
26	906-15099-00000	43-0015-00	CONST. PUENTES CAMINO SAN TELMO PUESTO 27	6.207.619,00	7.644.387,00	3.171.421,69	41,49%	45,00%	EN EJECUCIÓN
27	906-15102-00000	43-0016-00	CONST. CAMINO REJARA - HUAYLLAJARA	2.794.270,00	3.940.973,00	1.497.509,70	38,00%	41,00%	EN EJECUCIÓN
28	906-15100-00000	43-0048-00	MEJ. Y MANT. DE LA RED VIAL DPTAL PROVINCIA ARCE	5.381.826,00	5.381.826,00	762.868,55	14,17%	18,00%	EN EJECUCIÓN
29	356-13201-00000	43-0136-00	CONST. CAMINO HONDURA-TARIQUIA	500.000,00	2.859.705,00	359.198,12	12,56%	16,00%	EN EJECUCIÓN
30	906-00403-00000	43-0156-00	CONST. CAMINO HONDURA TARIQUIA FASE II	4.571.587,00	4.571.587,00	1.559.189,80	34,11%	38,00%	EN EJECUCIÓN
31	906-15108-00000	43-0164-00	REPAR. PUENTES VEHICULARES SOBRE EL RIO SALADO	1.495.171,00	1.495.171,00	204.661,05	13,69%	17,00%	EN EJECUCIÓN
32	906-17217-00000	43-0500-00	MEJ. Y AMPLIACION CAMINO SAN TELMO PLAYA ANCHA	3.264.510,00	3.264.510,00	0,00	0,00%	0,00%	EN EJECUCIÓN

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
33	906-15196-00000	43-0501-00	MEJ. ASFALTADO PADCAYA - CHAGUAYA	6.052.969,00	10.044.937,00	747.508,47	7,44%	10,00%	EN EJECUCIÓN
34	906-15193-00000	43-0502-00	CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO ALISOS DEL CARMEN	1.626.829,00	1.626.829,00	0,00	0,00%	3,00%	EN EJECUCIÓN
35	906-17227-00000	43-0503-00	MEJ. DE CAMINO CON OBRAS DE ARTE EL LIMAL - EMBOROZU	3.055.474,00	3.055.474,00	435.882,47	14,27%	17,00%	EN EJECUCIÓN
36	906-17232-00000	43-0504-00	CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO MECOYA	558.313,00	558.313,00	0,00	0,00%	4,00%	EN EJECUCIÓN
37	356-11149-00000	43-0505-00	CONST. CAMINO REJARA HITO Nº 2	1.593.257,00	1.912.623,00	0,00	0,00%	4,00%	EN EJECUCIÓN
38	356-12297-00000	43-0509-00	CONST. ASFALTADO CAMINO CAÑAS LA HUERTA	13.046.400,00	13.046.400,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
39	356-12292-00000	43-0510-00	CONST. PUENTES VEH. EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	779.158,00	324.648,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
40			UNIDAD SECCIONAL DE SAN LORENZO	59.167.993,00	59.167.993,00	5.230.121,13	8,84%		
19			PREINVERSION	1.151.342,00	1.692.322,00	0,00	0,00%		
1	906-01620-00000	10-0288-00	AMPL. MEJ. SISTEMA DE RIEGO LA VICTORIA	34.278,00	154.621,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
2	906-01603-00000	10-0289-00	CONST. GAVIONES RIO GUADALQUIVIR Y AFLUENTES	78.750,00	105.130,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
3	906-01604-00000	10-0290-00	CONST. SISTEMA DE RIEGO RANCHO NORTE ZONA LA HACIENDA	35.422,00	154.621,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
4	906-01606-00000	11-0085-00	AMPL. ELECTRIFICACION 1RA SECC. PROVINCIA MENDEZ II FASE	144.426,00	144.426,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
5	906-15222-00000	12-0259-00	CONST. PRESA 14 VUELTAS	30.251,00	30.251,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
6	906-15224-00000	12-0260-00	CONST. PRESA EL POTRERO	31.121,00	31.121,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
7	906-19004-00000	12-0300-00	MEJ. PARA LA PROD. DE MIEL PROVINCIA MENDEZ SAN LORENZO	100.340,00	100.340,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
8	906-19002-00000	12-0301-00	CONST. PRESA SELLA MENDEZ	70.396,00	70.396,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
9	906-15237-00000	12-0364-00	APOYO A LA PRODUCCION DE FRUTAS Y BAYAS HORTALIZAS NO TRADICIONALES SAN LORENZO	45.676,00	45.676,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
10	906-19001-00000	12-0400-00	IMPLEM. DE GANADO CAMELIDO EN LAS COM. VALLES ALTOS DEL RIO PILAYA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
11	906-19000-00000	12-0401-00	MEJ. DE LOS SISTEMAS DE PROD. DEL DURAZNERO Y LA MANZANA VALLES ALTOS DEL RIO PILAYA	41.717,00	122.571,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
12	906-18002-00000	12-0402-00	CONST. PRESA EL ROSAL	70.396,00	70.396,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
13	906-18001-00000	12-0403-00	MEJ. DEL GANADO MAYOR Y MENOR PROV. MENDEZ SECCION SAN LORENZO	48.247,00	132.107,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
14	906-18000-00000	12-0450-00	MEJ. Y AMP. SISTEMA DE RIEGO MARQUIRI CALAMA	44.278,00	154.622,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
15	906-17900-00000	12-0451-00	CONST. DE PRESA ALTO DE CAJAS	70.378,00	70.378,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
16	906-15235-00000	14-0012-00	AMPL. DE OFICINAS PARA LA GOBERNACION SECCION SAN LORENZO	59.172,00	59.172,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
17	906-15225-00000	43-0109-00	CONST. PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS CORANA SUD	43.162,00	43.162,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
18	906-15236-00000	43-0227-00	CONST. PUENTE COLGANTE TOMATITAS SOBRE EL RIO ERQUIZ	36.060,00	36.060,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
19	906-01605-00000	43-0601-00	MEJ. Y MANT. VIAL DEPTAL. PROVINCIA MENDEZ PRIMERA SECCION	87.272,00	87.272,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
21			INVERSION	58.016.651,00	57.475.671,00	5.230.121,13	9,10%		
1	906-15252-00000	10-0029-00	CONST. GAVIONES RIO CORANA	1.396.620,00	1.396.620,00	797.131,92	57,08%	62,80%	EN EJECUCION
2	906-15254-00000	10-0030-00	CONST. GAVIONES RIO PALACIOS	3.185.850,00	3.185.850,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
3	906-15255-00000	10-0031-00	CONST. GAVIONES RIO SECO	2.762.668,00	2.847.204,00	1.131.293,07	39,73%	45,00%	EN EJECUCION
4	906-15258-00000	10-0032-00	CONST. GAVIONES PAMPA GRANDE	2.371.483,00	3.943.903,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
5	356-13095-00000	10-0216-00	CONST. ATAJADOS Y ESTANQUES DISTRITO JARCAS	249.273,00	249.273,00	0,00	0,00%	44,00%	EN EJECUCION
6	356-14761-00000	10-0224-00	CONST. ATAJADOS SELLA MENDEZ-CARACHIMAYO- EL BARRANCO	6.175.423,00	6.175.423,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
7	356-17816-00000	11-0027-00	AMPL. DE ELECTRIFICACION COM. DE LA 1RA SECC. PROV. MENDEZ	10.155.118,00	10.070.582,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
8	356-15136-00000	11-0040-00	AMPL. ELECT. LA CALAMA LA VICTORIA RINCON DE LA VICTORIA	1.334.881,00	1.334.881,00	1.326.206,16	99,35%	100,00%	EN EJECUCION
9	356-14758-00000	12-0047-00	CONST. SISTEMA DE RIEGO CARACHIMAYO	2.670.358,00	2.670.358,00	0,00	0,00%	12,00%	EN EJECUCION
10	356-14747-00000	12-0064-00	CONST. SISTEMA DE RIEGO RANCHO SUD - TOMATITAS	580.285,00	1.512.371,00	1.185.885,40	78,41%	88,00%	EN EJECUCION
11	356-15137-00000	12-0072-00	MEJ. Y AMPL. SIST. DE RIEGO TARIJA CANTON ERQUIZ	857.719,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO-PARALIZADO
12	356-17818-00000	12-0079-00	MEJ. Y CONST. SISTEMA DE RIEGO 1RA SECC, PROV. MENDEZ	5.203.104,00	5.203.104,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
13	906-15393-00000	12-0127-00	CONST. ATAJADOS Y ESTANQUES DISTRITO SANTA BARBARA SAN LORENZO	1.931.278,00	1.931.278,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
14	356-17815-00000	12-0230-00	APOYO PROD. ACOPIO LECHE COM. DEL VALLE CENTRAL P. MEN	4.740.394,00	4.740.394,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
15	356-15132-00000	12-0333-00	CONST. GALERIAS FILTR.RANCHO N. BORDO EL MOLLAR ERQUIS	171.778,00	171.778,00	1.584,81	0,92%	100,00%	CONCLUIDO
16	906-19010-00000	12-0452-00	CONST. ESTANQUES COM. ZONA ALTA DEL RIO PILAYA	5.422.348,00	5.422.348,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
17	906-01601-00000	14-0082-00	CONST. PUESTO POLICIAL LA VICTORIA	602.672,00	528.305,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO-PARALIZADO
18	356-14742-00000	41-0013-00	CONST. DIRECCION DISTRITAL SAN LORENZO - EL PUENTE	316.305,00	316.305,00	186.560,00	58,98%	87,00%	EN EJECUCION
19	906-15248-00000	43-0111-00	CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SELLA (MONTE MENDEZ Y SAN MATEO)	4.564.903,00	2.451.503,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
20	906-15251-00000	43-0112-00	CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO HUACATA	3.184.191,00	3.184.191,00	601.459,77	18,89%	25,60%	EN EJECUCION
21	906-15260-00000	43-0113-00	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS PUENTE PEATONAL RIO PILAYA - CARAPARI	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
25			UNIDAD SECCIONAL DE URIONDO	78.492.093,00	78.492.093,00	17.365.075,89	22,12%		
4			PREINVERSION	607.185,00	935.185,00	287.000,00	30,69%		
1	906-17211-00000	12-0273-00	CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES HUAYCO GRANDE NUEVA ESPERANZA	123.000,00	451.000,00	287.000,00	63,64%	65,00%	EN EJECUCIÓN
2	906-17892-00000	12-0491-00	CONST. DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO URIONDO	216.641,00	216.641,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
3	906-17926-00000	12-0493-00	CONST. INFRAESTRUCTURA DE APOYO PRODUCTIVO LADERAS TOMA - TUNAL	67.935,00	67.935,00	0,00	0,00%	5,00%	EN EJECUCIÓN
4	906-17927-00000	12-0494-00	CONST. EMBALSE DE REGULACION COLON SUD	199.609,00	199.609,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
21			INVERSION	77.884.908,00	77.556.908,00	17.078.075,89	22,02%		
1	906-00015-00000	10-0231-00	CONST. GAVIONES SUBCUENCAS RIO CAMACHO	420.662,00	420.662,00	420.661,80	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
2	906-17895-00000	10-0307-00	CONST. DEFENSIVOS LA ANGOSTURA - ANCON CHICO	698.069,00	3.153.615,00	471.060,56	14,94%	16,00%	EN EJECUCIÓN
3	906-17894-00000	10-0308-00	CONST. DEFENSIVOS PAMPA LA VILLA - SAN JOSE DE CHARAJA	878.917,00	3.939.285,00	79.504,17	2,02%	5,00%	EN EJECUCIÓN
4	356-14050-00000	10-0410-00	CONST. GAVIONES QDAS.RUJERO Y COLON	9.555.590,00	9.555.590,00	4.155.875,61	43,49%	45,00%	EN EJECUCION
5	906-00012-00000	11-0062-00	AMPL. DE LINEA ELECTRICA RURAL SECCION URIONDO	10.155.270,00	10.155.270,00	5.470.220,59	53,87%	55,00%	EN EJECUCIÓN
6	356-00010-00000	12-0029-00	CONST. SISTEMA DE RIEGO GUADALQUIVIR-CENAVIT-CALAMUCHITA	20.954.531,00	14.158.082,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
7	906-19055-00000	12-0077-00	MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MEDIO COMUNIDAD CALAMUCHITA	748.194,00	748.194,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
8	906-15205-00000	12-0257-00	CONST. PRESAS Y ATAJADOS COMUNID. GUARANGUAY NORTE	3.568.312,00	3.568.312,00	767.565,45	21,51%	23,00%	EN EJECUCIÓN
9	906-15206-00000	12-0258-00	CONST. PRESA CAMPO DE VASCO	1.953.953,00	3.234.488,00	230.193,99	7,12%	9,00%	EN EJECUCION
10	356-14800-00000	12-0269-00	MEJ. SISTEMA DE RIEGO SALADILLO	865.299,00	453.180,00	0,00	0,00%	100,00%	CONCLUIDO
11	356-17003-00000	12-0280-00	CONST. SISTEMA DE RIEGO DISTRITO MISCAS	1.614.489,00	2.751.210,00	1.294.442,79	47,05%	49,00%	EN EJECUCIÓN
12	906-17896-00000	12-0492-00	CONST. DE OBRAS DE TOMA SAN JOSE DE CHARAJA HUAYRIGUANA	403.111,00	730.975,00	299.395,23	40,96%	42,00%	EN EJECUCIÓN
13	906-17954-00000	12-0495-00	EQUIP. Y APOYO A LA PRODUCCION SECCION URIONDO	8.617.961,00	7.237.495,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
14	906-17933-00000	12-0529-00	MEJ. SISTEMA DE RIEGO SAN NICOLAS COLON NORTE	877.866,00	877.866,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
15	906-17216-00000	14-0203-00	CONST. OFICINAS DE LA GOBERNACION DE TARIJA SECCION URIONDO	2.582.937,00	2.582.937,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
16	906-00013-00000	43-0144-00	MEJ. Y CONST. CAMINO CHOCLOCA - PUESTO TUNAL	5.083.982,00	5.083.982,00	3.388.945,28	66,66%	68,00%	EN EJECUCIÓN
17	906-00014-00000	43-0145-00	CONST. OBRAS DE ARTE MAYOR CHOCLOCA - PUESTO TUNAL	1.497.863,00	1.497.863,00	500.210,42	33,39%	35,00%	EN EJECUCION
18	906-17929-00000	43-0150-00	MEJ. CAMINO SUNCHUHUAYCO - LADERAS	1.457.857,00	1.457.857,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
19	906-17930-00000	43-0151-00	MEJ. Y CONSTRUCCION CAMINO LA COMPAIA - RUJERO - SAN JACINTO	1.521.597,00	1.521.597,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
20	906-17932-00000	43-0152-00	CONST. ASFALTADO LA HIGUERA - COLON SUD	1.577.745,00	1.577.745,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
21	906-17934-00000	43-0153-00	CONST. ASFALTADO CRUCE PANAMERICANO LA CHOZA - SAN ISIDRO	2.850.703,00	2.850.703,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
46			UNIDAD SECCIONAL DE O'CONNOR	158.116.525,00	160.116.525,00	49.111.445,65	30,67%		
12			PREINVERSION	3.754.677,00	4.221.170,00	268.720,00	6,37%		
1	906-15240-00000	12-0056-000	MEJ. INFRAEST.PRODUCTIVA CHIQUIACA MARG.DERECHO	10.000,00	59.013,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
2	906-18010-00000	14-0120-000	CONST. INFRAESTRUCTURA GOBERNACION DEL DPTO. DE TARIJA PROV. O'CONNOR	350.000,00	193.562,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
3	906-19026-00000	14-0124-000	CONST. CENTRO HISTORICO CULTURAL CAMPUS DE LA CAHUARINA PROV. O'CONNOR	298.377,00	298.377,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
4	906-15249-00000	42-0008-000	CONST. Y EQUIPAMIENTO CASA DE LA MUJER PROV. O'CONNOR	10.000,00	98.818,00	10.000,00	10,12%	15%	EN EJECUCIÓN
5	906-15242-00000	43-0203-000	CONST. ASFALTADO RUTA11-SUARURO-TRANCAS	90.160,00	157.780,00	67.620,00	42,86%	45%	EN EJECUCIÓN
6	906-15250-00000	43-204-000	CONST. ASFALTADO RUTA 11- TENTAGUAZU-YUKIMBIA	156.800,00	274.400,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
7	906-15257-00000	43-0205-000	CONST. ASFALTADO RUTA 11 - ZAPATERAMBI - PARALELO 21	243.040,00	425.320,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
8	906-15259-00000	43-0206-000	CONST. ASFALTADO RUTA11 - SIVINGAL	254.800,00	372.400,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
9	906-15253-00000	43-0222-000	CONST. ASFALTADO TRAMO SALADITO -TIMBOY - TABASAI	400.000,00	400.000,00	191.100,00	47,78%	50%	EN EJECUCIÓN
10	906-18012-00000	43-0701-000	CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO PILCOMAYO-TENTAGUAZU PROV. O'CONNOR	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
11	906-18013-00000	43-0702-000	CONST. ASFALTADO RUTA LAS LOMAS-NARANJOS PROV. O'CONNOR	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
12	906-18014-00000	43-0703-000	CONST. ASFALTADO RUTA TIMBOY - TENTAGUAZU KUMANDAROTI PROV. O'CONNOR	976.500,00	976.500,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
34			INVERSION	154.361.848,00	155.895.355,00	48.842.725,65	31,33%		
1	356-14779-00000	11-0034-000	CONST. ELECTRIF. RURAL LOMA ALTA - PAMPA REDONDA	217.746,00	217.746,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
2	356-17828-00000	11-0053-000	CONST. ELECTRIF. RURAL QDA. LAS VACAS CHIQUIACA OCONNOR	105.000,00	433.896,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
3	356-14777-00000	11-0054-000	CONST. ELECTRIF.RURAL ZONA 2 GUARANI SECTOR NORTE	467.460,00	1.503.622,00	467.460,00	31,09%	100%	CONCLUIDO
4	906-00400-00000	11-0065-000	CONST. ELECTRIFICACION RURAL IPA CHIM. PROVINCIA OCONNOR	2.830.371,00	2.830.371,00	2.632.707,96	93,02%	95%	EN EJECUCIÓN
5	356-15142-00000	11-0071-000	AMPL. ELECTRIFICACION RURAL ENTRE RIOS - TIMBOY - TABASAY	6.174.415,00	6.174.415,00	2.391.450,12	38,73%	40%	EN EJECUCIÓN
6	906-17223-00000	11-0201-000	AMPL. ELECTRIFICACION RURAL CANT. MORETA,SAN DIEGO,NARVAES Y HUAYCO PROV. O'CONNOR	5.461.144,00	18.849.983,00	15.883.147,94	84,26%	85%	EN EJECUCIÓN
7	906-15278-00000	12-0058-000	CONST. INFRAEST.PRODUCTIVA CANT. SUARURO Y TARUPAYO PROV. O'CONNOR	7.185.679,00	1.800.281,00	40.941,58	2,27%	5%	EN EJECUCIÓN
8	906-15279-00000	12-0059-000	CONST. INFRAEST.PRODUCTIVA CANT. DE IPAGUAZU Y CHIMEO PROV. O'CONNOR	9.817.037,00	9.817.037,00	924.615,97	9,42%	12%	EN EJECUCIÓN
9	906-15276-00000	12-0065-000	CONST. INFRAEST.PRODUCTIVA CANTON SAN DIEGO PROV. O'CONNOR	5.783.678,00	15.000,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
10	906-15273-00000	12-0066-000	MEJ. DE GANADO EQUINO PROV. OCONNOR	5.217.564,00	5.157.564,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
11	906-15333-00000	12-0096-000	APOYO A LA PRODUCCION DE LECHE PROV. O'CONNOR	5.000.000,00	1.177.023,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
12	356-00923-00000	12-0393-000	CONST. SISTEMA DE RIEGO TIMBOY- O CONNOR	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
13	906-15287-00000	12-0394-000	IMPLEM. DE SISTEMAS AGROSILVOPASTORIL CANT. LA CUEVA,SALINAS Y CHIQUIACA PROV.OCONNOR	5.192.840,00	5.192.840,00	1.934.201,39	37,25%	42%	EN EJECUCIÓN

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
14	906-15328-00000	12-0395-000	APOYO PRODUC. GANADO BOVINO CANTON TARUPAYO Y SUARURO PROV. OCONNOR	6.927.030,00	6.927.030,00	181.207,86	2,62%	5%	EN EJECUCIÓN
15	906-15329-00000	12-0396-000	APOYO PRODUC. GANADO BOVINO CANTON IPAGUAZU Y CHIMEO PROV. OCONNOR	4.146.200,00	4.146.200,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
16	906-15334-00000	12-0397-000	APOYO A LAS CADENAS AGROPRODUCT. DE DURAZNO Y ARVEJA ZONA NOROESTE PROV. O'CONNOR	5.955.811,00	0,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
17	906-15332-00000	12-0398-000	CONST. INFRAESTRUCT.PRODUCT. SAN JOSECITO PROV. O'CONNOR	7.504.768,00	7.504.768,00	6.744.144,38	89,86%	90%	EN EJECUCIÓN
18	906-15337-00000	12-0421-000	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ PROV. O'CONNOR	6.324.153,00	6.324.153,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
19	906-15337-00000	12-0421-000	CONST. Y EQUIPAMIENTO CETHA POTREROS PROV. O'CONNOR	4.455.389,00	4.455.389,00	605.176,93	13,58%	15%	EN EJECUCIÓN
20	906-15336-00000	13-0047-000	CONST. CAMPUS AGROPECUARIO Y CULTURAL PROV. O'CONNOR	5.206.000,00	5.206.000,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
21	906-17226-00000	14-0202-000	CONST. Y EQUIPAMIENTO ESTACION POLICIAL INTEGRAL ENTRE RIOS	5.048.449,00	5.048.449,00	2.673.782,53	52,96%	55%	EN EJECUCIÓN
22	356-14427-00000	43-0169-000	CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SALINAS	485.896,00	5.228.100,00	475.242,92	9,09%	12%	EN EJECUCIÓN
23	906-15271-00000	43-0207-000	MEJ. CAMINO SUARURO - TRANCAS	2.322.142,00	4.843.142,00	2.528.763,58	52,21%	55%	EN EJECUCIÓN
24	906-15280-00000	43-0208-000	CONST. ASFALTADO CAMINO ENTRE RIOS - QDA. LAS VACAS	10.000.000,00	12.000.000,00	2.915.890,38	24,30%	28%	EN EJECUCIÓN
25	906-15344-00000	43-0209-000	MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LA PROV. O'CONNOR	10.930.504,00	10.930.504,00	451.079,56	4,13%	5%	EN EJECUCIÓN
26	906-18017-00000	43-0704-000	CONST. ASFALTADO CARRETERA CARAPARI-PALOS BLANCOS TRAMO CHOERE-PALOS BLANCOS	1.528.800,00	170.263,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
27	906-18018-00000	43-0705-000	CONST. ASFALTADO RUTA ENTRE RIOS CHIQUIACA- SAN ANTONIO TRAMO SAICAN - CHAJLLAS	3.785.283,00	101.736,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
28	906-19012-00000	43-0706-000	CONST. ASFALTADO QUEBRADA LAS VACAS - SALINAS PROV. O'CONNOR	2.646.000,00	125.000,00	0,00	0,00%	0%	POR LICITAR
29	906-15270-00000	44-0035-000	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO PALOS BLANCOS	7.060.542,00	7.060.542,00	1.892.722,79	26,81%	30%	EN EJECUCIÓN
30	906-15270-00000	44-0035-000	CONST. TINGLADOS DEPORTIVOS PROV. O'CONNOR	10.291.048,00	10.291.048,00	3.356.036,13	32,61%	35%	EN EJECUCIÓN
31	906-15272-00000	44-0036-000	CONST. CONST. TINGLADOS DEPORT. CANTONES DE SALINAS Y CHIQUIACA PROV.OCONNOR	2.328.386,00	5.075.869,00	981.896,12	19,34%	25%	EN EJECUCIÓN
32	906-15327-00000	44-0037-000	CONST. COMPLEJO CULTURAL TENTAGUAZU PROV. OCONNOR	1.658.255,00	2.846.307,00	623.819,14	21,92%	25%	EN EJECUCIÓN
33	906-15330-00000	44-0038-000	CONST. COMPLEJO CULTURAL DEPORTIVO NAURENDA PROV. O'CONNOR	1.659.408,00	2.763.488,00	354.278,50	12,82%	15%	EN EJECUCIÓN
34	906-15275-00000	44-0039-000	MEJ. DEL COLISEO DEPORTIVO ENTRE RIOS PROV. O'CONNOR	539.850,00	1.572.589,00	784.159,87	49,86%	50%	EN EJECUCIÓN

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
81			UNIDAD SECCIONAL DE YACUIBA	229.254.562,00	256.502.564,00	53.777.461,26	20,97%		
30			PREINVERSION	6.992.046,00	7.446.951,00	807.013,68	10,84%		
1	906-01141-00000	10-0075-000	PRESER. Y REF. DE ESPEC. FOREST. Y FRUT. NATIVAS EN COMUNID. INDIG. 1RA SECC. PROV. GRAN CHACO	39.102,00	39.102,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
2	906-17979-00000	11-0089-000	EQUIP. E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN EL AREA RURAL 1RA SECCION - YACUIBA.	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
3	906-00167-00000	11-0121-000	APLIC. ELECTRIFICACION RURAL 1RA SEC - YACUIBA	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
4	906-00160-00000	12-0095-000	CONST. COMPLEJO PROD. DE CUERO 1RA SEC, G. CHACO	100.000,00	51.853,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
5	906-00153-00000	12-0103-000	CONST. COMPLEJO PRODUCTIVO TEXTIL YACUIBA	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
6	906-01100-00000	12-0311-000	CONST. SIST. MULTIPROPOSITO DE AGUA POR BOMBEO ITAPERENDA - YACUIBA	903.944,00	903.944,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
7	906-00973-00000	12-0312-000	CONST. INFRAESTR. PARA ALMACENAMIENTO DE GRANOS 1RA SECCION YACUIBA	140.000,00	337.880,00	202.727,64	60,00%	80,00%	EN EJECUCION
8	906-00975-00000	12-0313-000	APOYO PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRANSFORMACION DEL MANI EN LA 1RA SEC.-YACUIBA	140.000,00	348.147,00	208.887,84	60,00%	80,00%	EN EJECUCION
9	906-01101-00000	12-0314-000	CONST. PRESA TIMBOY	80.000,00	43.723,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
10	906-01102-00000	12-0315-000	CONST. PRESA PANANTY	80.000,00	40.200,00	39.800,00	99,00%	99,00%	EN EJECUCION
11	906-01103-00000	12-0316-000	CONST. PRESA SANANDITA VIEJO	80.000,00	40.200,00	39.800,00	99,00%	99,00%	EN EJECUCION
12	906-01106-00000	12-0318-000	MEJ. DEL GANADO LECHERO EN LA PRIMERA SECCION YACUIBA	150.000,00	187.419,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
13	906-01107-00000	12-0319-000	MEJ. OVEJA DE PELO DE LA PRIMERA SECCION - YACUIBA	150.000,00	175.419,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
14	906-01111-00000	12-0320-000	CONST. DE PLANTA DE TRANSFORMACION DE CITRICOS 1RA. SEC. YACUIBA	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
15	906-17978-00000	12-0321-000	CONST. MULTIPROP. DE BOMBEO Y POTAB. AGUAS BRUTAS DEL RIO PILCOMAYO 1RA SECC - YACUIBA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
16	906-01108-00000	12-0414-000	APOYO TRANSF. PROD. AGROECOLOGICA 1RA SECC. PROV. GRAN CHACO	150.000,00	124.581,00	120.771,00	96,94%	98,00%	EN EJECUCION
17	906-00166-00000	13-0001-000	IMPLEM. CIRCUITO TURISTICO HACIENDAS GANADERAS 1 SEC YACUIBA	112.000,00	271.318,00	108.527,20	40,00%	45,00%	EN EJECUCION
18	906-00155-00000	13-0059-000	IMPLEM. CIRC. TURISTICO DEL PESCADOR 1RA. SEC. G.CH.YBA	112.000,00	168.513,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
19	906-00161-00000	13-0062-000	CONST. COMPLEJO PRODUC. DE MADERA 1RA SEC. G. CHACO	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
20	906-00162-00000	13-0063-000	CONST. COMPLEJO PRODUC. DE ALIMENTOS 1RA SEC. G.CH. YACUIBA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
21	906-00163-00000	13-0064-000	CONST. COMPLEJO PRODUC DE METAL MECANICA 1RA SEC - YACUIBA	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
22	906-01105-00000	14-0022-000	CONST. CONST. SEDE SOCIAL TRABAJADORES DE LA PRENSA 1RA SECC. YACUIBA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
23			CONST. EDIFICIO GOB. AUTONOMO REGIONAL DEL CHACO TARIJEJO - YACUIBA	1.150.000,00	1.063.652,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
24	906-01201-00000	40-0031-000	CONST. HOGAR PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 1RA SEC. YACUIBA	280.000,00	346.000,00	86.500,00	25,00%	50,00%	EN EJECUCION

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
25	906-17970-00000	12-0460-00	DESAR. AL CULTIVO DE UVA DE MESA EN LA 1RA SECCION - YACUIBA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
26	906-17969-00000	12-0476-00	MEJ. GENETICO PARA BOVINOS DE CARNE Y LECHE EN LA 1RA SECCION - YACUIBA.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
27	906-17964-00000	12-0477-00	INVEST. PARA ZONIFICACION PRODUCTIVA ANIMALES DOMESTICOS DE CARNE EN LA 1RA SECCION - YACUIBA.	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
28	906-17966-00000	12-0478-00	MEJ. Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE FORRAJES EN LA 1RA SECCION - YACUIBA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
29	906-17967-00000	12-0479-00	INVEST. DE ZONIFICACION DE CALIDAD Y USO DE SUELOS EN LA 1RA SECCION - YACUIBA	400.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
30	906-17968-00000	12-0480-00	PRESER. Y MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO CRIOLLO EN LA 1RA SECCION - YACUIBA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
51			INVERSION	222.262.516,00	249.055.613,00	52.970.447,58	21,27%		
1	906-00179-00000	10-0045-000	CONST. DEFENSIVOS AREA RURAL Y URBANA 1RA SECCION YACUIBA	500.000,00	372.502,00	367.818,59	98,74%	100,00%	CONCLUIDO
2	906-01596-00000	10-0271-000	CONST. OBRAS DE ENCAUSE DEL RIO PILCOMAYO 1RA. SEC. GRAN CHACO	3.038.252,00	4.176.252,00	786.585,59	18,83%	22,00%	EN EJECUCION
3	906-17804-00000	10-0276-000	CONST. ALJIBES DE FERROCEMENTO EN COMUNIDADES AGRICOLAS 1RA SECCION	2.590.265,00	2.590.265,00	935.753,67	36,13%	45,00%	EN EJECUCION
4	356-16246-00000	12-0025-000	CONST. SIST. RIEGO COM. A GOTEO C.F.EL PALMAR-CAIPIPENDI APROV. AGUAS	150.000,00	277.498,00	139.093,87	50,12%	95,00%	EN EJECUCION
5			DESAR. PECUARIO CON INFRAEST. DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL AREA RURAL DE YACUIBA	0,00	22.232.038,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
6	356-11160-00000	12-0214-000	APOYO FORR.E INFRA.P/EL MEJ DE GAN. BOVINO TIPO CARNE 1RA	5.000.000,00	4.274.475,00	259.881,90	6,08%	10,00%	EN EJECUCION
7			IMPLEM. DISTRIBUCION AGUA LOS GANSOS-BG BOLIVIA	0,00	11.827,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
8	906-00177-00000	12-0236-000	FORTAL. MECANIZACION AGROP. COM CAMPESINAS 1RA SEC. G.CHACO	251.039,00	251.039,00	0,00	0,00%	5,00%	EN EJECUCION
9	906-00974-00000	12-0322-000	CONST. PLANTA PROCESADORA DE LECHE 1RA SECCION YACUIBA	1.000.000,00	208.870,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
10	906-00976-00000	12-0323-000	CAPAC. E IMPLEMENTACIÓN AGROPECUARIA PUEBLOS INDIGENAS 1RA SECC. GRAN CHACO	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
11	906-01133-00000	12-0325-000	IMPLEM. CULTIVO CAÑA DE AZUCAR 1RA SECCION YACUIBA	267.374,00	292.899,00	53.503,84	18,27%	25,00%	EN EJECUCION
12	906-01117-00000	12-0329-000	CONST. CENTRO DE CAP. E INV. CON TRANSFERENCIA DE TECN. COMUNIDAD TIERRAS NUEVAS GARCHT YACUIBA	360.231,00	437.132,00	370.120,77	84,67%	90,00%	EN EJECUCION
13	906-01136-00000	12-0418-000	CONST. CENTRO CAPACIT. E INVEST. CON TRANSF. DE TECNOLOGIA COMUNIDAD LA GRAMPA	187.845,00	455.218,00	455.216,37	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
14	906-01119-00000	12-0436-000	CONST. CENTRO DE CAP. E INV. CON TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA COMUNIDAD SANTA MARTHA GARCHT-YACUIBA	720.460,00	900.001,00	274.073,54	30,45%	50,00%	EN EJECUCION
15	906-00907-00000	12-0438-000	CONST. CENTRO DE CAP. E INVESTIG.CON TRANSF. TEC. COM YAGUACUA	757.065,00	757.065,00	231.681,35	30,60%	50,00%	EN EJECUCION
16	906-00997-00000	12-0439-000	CONST. CENTRO DE CAPAC. E INVESTIG. CON TRANSF.TEC COM. LA CERCADA	788.453,00	788.453,00	322.612,05	40,92%	50,00%	EN EJECUCION
17	906-00906-00000	12-0471-000	CONST. CENTRO DE CAPAC. E INVESTIG. CON TRANSF. TEC. COM.SANANDITA	762.539,00	762.539,00	176.327,02	23,12%	35,00%	EN EJECUCION
18	906-17925-00000	12-0472-000	DESAR. A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS EN LA 1RA SECCION - YACUIBA	982.699,00	982.699,00	114.998,55	11,70%	20,00%	EN EJECUCION

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
19	906-17961-00000	12-0481-000	CONST. CENTRO DE CAP. E INV. CON TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA COMUNIDAD SAN ISIDRO - YACUIBA	993.243,00	993.243,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
20	906-17963-00000	12-0482-000	CONST. CENTRO DE CAP. E INV. CON TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA COMUNIDAD SAN ISIDRO SUD ESTE - YACUIBA.	943.121,00	943.121,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
21			EQUIP. CENTRO DE CAPACITACION E INVEST. CON TRANSF. DE TECNOLOGIA 1RA. SECCION YACUIBA	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
22	906-00189-00000	13-0068-000	CONST. CENTRO TUR. ECOLOG SALITRAL C. VERDE 1RA SECCION	1.138.068,00	1.138.068,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
23	906-01123-00000	14-0026-000	AMPL. DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION REGIONAL DEL CHACO TARIJEÑO - YACUIBA	698.099,00	997.285,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
24	356-14623-00000	14-0049-000	CONST. CAMPO FERIAL YACUIBA	11.000.000,00	6.135.334,00	0,00	0,00%	5,00%	EN EJECUCION
25	356-31194-00000	14-0079-000	CONST. RODEO TRADICION CHAQUEÑA EL PALMAR	16.466.107,00	13.766.107,00	3.349.592,50	24,33%	30,00%	EN EJECUCION
26	906-00905-00000	14-0085-000	FORTAL. DEL COMANDO DE FRONTERA POLICIAL UNIDAD DE BOMBEROS YACUIBA	6.000.000,00	9.643.098,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
27	906-01120-00000	14-0092-000	CONST. CENTRO DE CAP. E INVER. CON TRANSF. DE TECNOLOGIA COMUNIDAD LAS ABRAS GARCHT-YACUIBA	271.574,00	194.673,00	190.929,39	98,08%	100,00%	CONCLUIDO
28	906-01143-00000	14-0094-000	CONST. NUEVA TERMINAL DE BUSES YACUIBA	5.175.000,00	232.401,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
29	356-14243-00000	14-0097-000	CONST. TORRE DE CONTROL AEROPUERTO DE YACUIBA	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
30	356-14553-00000	15-0222-000	CONST. (PERFOR.) POZOS PROFUND.LLANURA CHAQUEÑA 1RA S.G.CH.	4.137.403,00	4.137.403,00	1.590.244,89	38,44%	55,00%	EN EJECUCION
31	906-01110-00000	15-0250-000	PROSP. POZOS PROFUNDOS PRIMERA SECCION YACUIBA, DIST. 5,6,7 Y 8	11.170.599,00	9.970.599,00	0,00	0,00%	5,00%	EN EJECUCION
32	906-01145-00000	15-0251-000	CONST. DRENAJE PLUVIAL YACUIBA FASE I	15.863.978,00	15.063.978,00	5.141.323,65	34,13%	45,00%	EN EJECUCION
33	906-17815-00000	18-0005-000	IMPLEM. CIUDAD DIGITAL 911 YACUIBA	21.829.500,00	19.322.893,00	0,00	0,00%	5,00%	EN EJECUCION
34	906-17270-00000	40-0055-000	CONST. HOSPITAL MODELO DE 3ER. NIVEL REGION AUTONOMA G.CH. YACUIBA	13.448.008,00	12.147.568,00	2.354.204,43	19,38%	25,00%	EN EJECUCION
35	906-01137-00000	41-0027-000	EQUIP. TECNOLÓGICO EN 3 COMUNIDADES DE LA 1RA SECCION YACUIBA	349.758,00	349.758,00	15.563,00	4,45%	10,00%	EN EJECUCION
36	356-12225-00000	43-0039-000	CONST. PAVIMENTO RUTA 9 ITAVICUA	6.703.148,00	8.704.738,00	3.073.502,65	35,31%	42,00%	EN EJECUCION
37	356-14459-00000	43-0041-000	CONST. CAMINO RUTA 9 YAGUACUA	415.532,00	532.846,00	527.183,36	98,94%	100,00%	EN EJECUCION
38			CONST. PUENTE VEHICULAR CAMINO SANANDITA	0,00	3.924.159,00	2.691.279,09	68,58%	75,00%	EN EJECUCION
39	906-00152-00000	43-0101-000	CONST. PAVIMENTO RUTA 9 LA GRAMPA STA. MARTHA	7.734.979,00	7.734.979,00	244.711,62	3,16%	15,00%	EN EJECUCION
40	356-14295-00000	43-0102-000	CONST. PAVIMENTO RUTA 9 LIMITAS	2.179.828,00	4.599.686,00	3.109.669,51	67,61%	75,00%	EN EJECUCION
41	906-00180-00000	43-0110-000	CONST. PUENTE VEHICULAR S ANT TATARENDA 1RA SECCION	278.309,00	762.523,00	762.522,13	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
42	906-15186-00000	43-0126-000	MEJ. CAMINO RUTA 9 LA GRAMPA-YUQUIRENDIA-CRUC EL BAGUAL	8.897.947,00	8.897.947,00	0,00	0,00%	5,00%	EN EJECUCION
43	906-01132-00000	43-0191-000	MEJ. DE CAMINOS RED DEPARTAMENTAL DE LA 1RA SECCION DEL CHACO-YACUIBA	23.115.970,00	19.328.595,00	2.992.760,00	15,48%	20,00%	EN EJECUCION

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
44	356-13054-00000	43-0226-000	CONST. PAVIM. RUTA 9-EL BAGUAL-CREVAUX-D ORBIGNY	16.815.595,00	16.815.595,00	6.298.057,59	37,45%	45,00%	EN EJECUCION
45	356-31198-00000	44-0008-000	CONST. ESTADIO PROVINCIAL DE FUTBOL YACUIBA	21.543.729,00	35.511.445,00	15.312.129,57	43,12%	50,00%	EN EJECUCION
46	356-14547-00000	12-0017-00	EQUIP. E INVESTIGACION 6 VARIEDADES UVA 1RA. SEC.P.G.CHACO	755.368,00	727.768,00	262.547,60	36,08%	40,00%	EN EJECUCION
47	356-14550-00000	12-0018-00	DESAR. VAR.CITRICOS TEMPRANEROS Y TARDIOS 1RA SEC.G.CHACO	762.598,00	737.098,00	283.749,18	38,50%	40,00%	EN EJECUCION
48	356-15017-00000	12-0024-00	TRANSF.TECN. Y DIF.GERMOPLASMA SOYA-MAIZ-MANI YACUIBA	2.616.735,00	2.839.630,00	274.173,30	9,66%	10,00%	EN EJECUCION
49	906-17972-00000	12-0473-00	EQUIP. Y DES. LAB. VET. PARA ZONIFICAR ENF. PARAS. DE LA SANGRE EN BOVINOS EN LA 1RA SECCION - YACUIBA.	200.000,00	367.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
50	906-17974-00000	12-0474-00	PREVEN. OPERATIVA Y GESTION REGIONAL DE LA SANIDAD AGROP. EN LA 1RA SECCION - YACUIBA	429.861,00	359.861,00	8.637,01	2,40%	5,00%	EN EJECUCION
51	906-17971-00000	12-0475-00	MEJ. TRANSFERENCIA Y DIFUSION DE GERMOPLASMA EN LA 1RA SECCION - YACUIBA	572.237,00	305.442,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
137			UNIDAD SECCIONAL DE CARAPARI	245.274.599,00	245.274.599,00	145.005.518,88	59,12%		
40			PREINVERSION	18.702.325,00	16.251.715,00	1.100.699,00	6,77%		
1	906-17990-00000	10-0050-00	DIAGN. AMBIENTAL EN LA 2DA. SECC. G. CHACO	831.201,00	831.201,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
2	906-00515-00000	10-0304-00	CONST. DEFENSIVOS BUENA VISTA CARAPARI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
3	906-17994-00000	11-0043-00	AMPL. DE LA RED BAJA Y MEDIA TENSION 2DA. SECCION CARAPARI	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
4	906-17998-00000	11-0044-00	DIAGN. DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CARAPARI	831.201,00	503.281,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
5	356-14570-00000	12-0022-00	MANEJO SIST.SILVOPASTORIL 2DA SECCION GRAN CHACO	4.000.000,00	2.000.000,00	1.019.699,00	50,98%	55,00%	EN EJECUCION
6	906-00379-00000	12-0034-00	CAPAC. Y ASIST. TECNICA EN PRODUCC. DE LECHE 2DA. SECC. CARAPARI	3.000.000,00	2.969.300,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
7	906-17184-00000	12-0170-00	CONST. DE POZOS PARA APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUB TERRANEAS FASE II CARAPARI	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
8	906-17838-00000	12-0604-00	CONST. CENTRO FERIAL DISTRITO IV CARAPARI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
9	906-00501-00000	12-0606-00	CONST. CENTRO BOTANICO CARAPARI	115.957,00	144.945,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
10	906-00513-00000	12-0609-00	DIAGN. AGROECOLOGICO EN LA 2º SECC. CARAPARI	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
11	906-17975-00000	12-0611-00	CONST. EMBALSES PARA MANEJO DE CUENCAS Y COSECHA DE AGUA - RIEGO DISTRITO IV CARAPARI	480.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
12	906-17986-00000	12-0614-00	CONST. DE EMBALSES PARA MANEJO DE CUENCAS Y AGUA DE ESCORRENTIA EN EL DISTRITO 6 CARAPARI	370.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
13	906-00430-00000	13-0055-00	CONST. MUSEO ETNOGRAFICO FOLKLORICO CARAPARI	20.000,00	134.446,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
14	906-17960-00000	13-0058-00	CONST. Y EQUIP. PLANTA PROCESADORA DE PROD. CARNICOS 2DA. SECC. G. CHACO	386.750,00	417.450,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
15	906-00504-00000	13-0101-00	CONST. CIRCUITO TURISTICO LAGUNA SAN NICOLAS 2º SECC. G. CHACO	370.000,00	380.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
16	906-00521-00000	13-0102-00	DIAGN. DE ATRACTIVOS TURISTICO 2º SECC. CARAPARI	230.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
17	906-17196-00000	14-0060-00	CONST. CENTRO DE CAPACITACION GOBERNACION CARAPARI	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
18	906-00516-00000	14-0112-00	CONST. CENTRO MANUFACTURERO INTEGRAL CARAPARI	290.000,00	189.200,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
19	906-00206-00000	14-0115-00	CONST. INFRAESTRUCTURA SEDECA CARAPARI	160.000,00	260.800,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
20	906-17209-00000	14-0118-00	CONST. INFRAESTRUCTURA ASAMBLEA REGIONAL DEL CHACO TARIJE0	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
21	906-00518-00000	24-0109-00	INVEST. SIST. DE ENGORDE DE GANADO BOVINO Y OVINO 2º SECC. CARAPARI	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
22	906-17980-00000	24-0117-00	CONST. Y EQUIPAMIENTO DE INGENIOS PARA PRODUCCION DE AZUCAR INTEGRAL 2DA. SECC. G. CHACO	460.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
23	906-17987-00000	24-0613-00	CONST. DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION PORCINA 2DA. SECC. CARAPARI	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
24	906-17988-00000	24-0614-00	INVEST. DE LA CADENA PRODUCTIVA APICOLA 2DA. SECC. G. CHACO	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
25	906-17989-00000	24-0615-00	INVEST. DE LA PRODUCCION DE FRUTALES CADUCIFOLIOS 2DA. SECC. G. CHACO	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
26	906-00490-00000	40-0050-00	CONTROL ENFERMEDADES ENDEMICAS 2DA SEC. PROV.GRAN CHACO	1.000.000,00	295.956,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
27	906-00346-00000	43-0017-00	DIAGN. DE LA RED VIAL DE LA SEGUNDA SECCION CARAPARI	166.800,00	174.720,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
28	906-00431-00000	43-0184-00	CONST. ASFALTADO CR. LOMA ALTA ITAPERENDA CHIRIMOLLAR CR. SAN ALBERTO	200.000,00	504.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
29	906-00432-00000	43-0185-00	MEJ. Y AMPLIACION CAMINO TIMBOY	113.000,00	113.000,00	81.000,00	71,68%	80,00%	POR LICITAR
30	906-00433-00000	43-0186-00	CONST. CAMINO CR. TAQUITOS-PALMARCITO-CAÑON BERETY	226.416,00	303.850,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
31	906-17189-00000	43-0193-00	MEJ. CAMINO BERETI CHINCHILLA FASE II CARAPARI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
32	906-17186-00000	43-0200-00	CONST. PAVIMENTO LAGUNITAS - ARENALES - SALADILLO 2DA. SECCION G. CHACO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
33	906-17208-00000	43-0236-00	CONST. PAVIMENTADO CARAPARI - MOLINO VIEJO	136.000,00	165.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
34	906-17830-00000	43-0250-00	CONST. TUNEL LA PASTOSA 2DA SECCION GRAN CHACO	1.180.000,00	798.566,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
35	906-00509-00000	43-0251-00	CONST. PAVIMENTO AGUA BLANCA CRUCE RIO NEGRO 2º SECC. G. CHACO	440.000,00	411.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
36	906-17187-00000	43-0188-00	CONST. PUENTES PEATONALES SAN MIGUE-INIAL-CENTRAL 2DA. SECCION G. CHACO	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
37			CONST. EMBALSES PARA MANEJO DE CUENCAS Y COSECHA DE AGUA - RIEGO DISTRITO IV CARAPARI	0,00	480.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
38			CONST. DE EMBALSES P/MANEJO DE CUENCAS Y AGUA DE ESCORRENTIA EN EL DISTRITO II 2DA. SECC. G. CHACO	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
39			CONST. DE EMBALSES PARA MANEJO DE CUENCAS Y AGUA DE ESCORRENTIA EN EL DISTRITO 6 CARAPARI	0,00	370.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
40			CONST. Y EQUIPAMIENTO DE INGENIOS PARA PRODUCCION DE AZUCAR INTEGRAL 2DA. SECC. G. CHACO	0,00	460.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
97			INVERSION	226.572.274,00	229.022.884,00	143.904.819,88	62,83%		
1	356-14187-00000	10-0003-00	CONST. DEFENSIVOS ALTA CUENCA DEL RIO CARAPARI	25.518,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
2	906-00436-00000	10-0027-00	PROTEC. CAUCES QUEBRADA CAÑADA ANCHA 2DA. SECCION CARAPARI	5.138.300,00	1.846.057,00	1.766.645,20	95,70%	97,00%	EN EJECUCION
3	906-00427-00000	10-0053-00	CONST. PISCIGRANJAS COMUN. LA SECA	825.608,00	1.009.474,00	319.567,16	31,66%	35,00%	EN EJECUCION
4	906-17195-00000	10-0065-00	AMPL. RED AGROMETEOROLOGICA 2DA. SECC. G. CHACO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
5	356-14181-00000	10-0091-00	CONST. DEFENSIVOS CANTO DEL AGUA	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
6	906-00415-00000	10-0094-00	CONST. DEFENSIVOS DISTRITO 6 CARAPARI	3.041.997,00	3.041.997,00	3.023.451,77	99,39%	99,00%	EN EJECUCION
7	356-31232-00000	10-0260-00	CONST. CANALIZACION QDA LIBERATO	5.700.000,00	5.700.000,00	2.447.786,44	42,94%	45,00%	EN EJECUCION
8	906-17207-00000	10-0269-00	CONST. DEFENSIVOS BOYUY 2DA. SECCION CARAPARI	500.589,00	500.589,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
9	906-00428-00000	11-0039-00	CONST. LINEA DE 69 KV. YACUIBA-CARAPARI	2.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
10	906-00323-00000	11-0127-00	CONST. RED TRIFASICA CARAPARI FASE II	4.000.000,00	5.800.000,00	5.316.934,72	91,67%	95,00%	EN EJECUCION
11	356-13240-00000	12-0041-00	MANEJO DE SUELOS AGRICOLAS 2DA SECC. G. CHACO	4.000.000,00	1.115.147,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
12	906-00425-00000	12-0051-00	MEJ. OVINO OVEJA DE PELO 2DA. SECCION CARAPARI	2.000.000,00	1.990.000,00	1.700.000,00	85,43%	87,00%	EN EJECUCION
13	906-00426-00000	12-0052-00	CONST. CENTRO DE INVEST. PARA EL MEJORAMIENTO DE GANADO BOVINO CARAPARI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
14	906-00444-00000	12-0055-00	INVEST. DEL CULTIVO DE LA STEVIA 2DA. SECC. CARAPARI	488.453,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
15	906-17992-00000	12-0108-00	MEJ. DE LA COSECHA NATURAL DE AGUA PARA CONSUMO AGROPECUARIO 2DA. SECC. CARAPARI	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
16	906-17999-00000	12-0110-00	DESAR. DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CITRICOS 2DA. SECCION G. CHACO	1.000.000,00	2.461.935,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
17	906-17180-00000	12-0112-00	EQUIP. Y OPTIMIZACION DE CONSUMO DE AGUA PARA EL GANADO 2DA. SECCION CARAPARI	600.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
18	906-17191-00000	12-0155-00	CONST. DE RESERVORIOS DE AGUA DISTRITO III 2DA. SECC. G. CHACO	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
19	356-11146-00000	12-0213-00	CONST. PRESA BERETY CHACO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
20	356-13049-00000	12-0215-00	IMPLEM. DE CENTROS EXPERIMENTAL SEDAG CARAPARI	3.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
21	356-14638-00000	12-0223-00	CONST. CENTRO FERIAL AGROPECUARIO Y ARTEZANAL CARAPARI	9.121.878,00	9.121.878,00	7.638.582,12	83,74%	90,00%	EN EJECUCION
22	906-00384-00000	12-0237-00	CONST. POZOS PROFUNDOS P/RIEGO POR ASP Y GOTEIO SAN MARTIN CARAPARI	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
23	906-00434-00000	12-0241-00	CONST. CENTRO DE CAPACITACION E INVEST. CON TRANSFORMACION DE TECNOL. PECUARIA 2DA. SECCION CARAPARI	149.280,00	1.729.230,00	747.636,01	43,24%	45,00%	EN EJECUCION
24	356-09137-00000	12-0289-00	CONST. PRESA EL COMUN CARAPARI	8.000.000,00	8.000.000,00	3.002.177,17	37,53%	40,00%	EN EJECUCION
25	356-13249-00000	12-0309-00	CONST. PRESA LOMA ALTA	5.000.000,00	4.000.000,00	2.885.265,68	72,13%	75,00%	EN EJECUCION
26	356-11145-00000	12-0386-00	CONST. PRESA SAN ANTONIO	500.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
27	906-00443-00000	12-0392-00	IMPLEM. MANEJO DE GERMOPLASMA DE FRUTALES 2DA. SECC. GRAN CHACO	4.066.307,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
28	906-00377-00000	12-0612-00	APOYO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA PAPA 2DA. SECC. CARAPARI	2.000.000,00	4.092.247,00	2.860.871,20	69,91%	72,00%	EN EJECUCION
29	906-00381-00000	13-0003	DESAR. TURISTICO COMUNITARIO EN LA 2DA. SECCION CARAPARI	1.000.000,00	846.566,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
30	906-00353-00000	14-0002-00	CONST. SALON AUDITORIO CARAPARI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
31	906-00437-00000	14-0014-00	CONST. PUESTO POLICIAL SAN ALBERTO 2DA. SECCION CARAPARI	1.000.000,00	1.500.000,00	983.104,89	65,54%	70,00%	EN EJECUCION
32	906-00440-00000	14-0036-00	CONST. Y EQUIPAM. ESTACION POLICIAL INTEGRAL COMANDO REGIONAL CARAPARI	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
33	906-00340-00000	14-0089-00	CONST. TERMINAL DE BUSES CARAPARI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
34	906-00348-00000	14-0102-00	CONST. OFICINA GOBERNACION CARAPARI FASE II	1.492.952,00	1.895.954,00	1.610.207,35	84,93%	85,00%	EN EJECUCION
35	356-13227-00000	15-0042-00	INVEST. AGUAS SUBTERRANEAS CARAPARI	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
36	906-00452-00000	16-0018-00	FORTAL. AL PUESTO POLICIAL-UNIDAD BOMBEROS CARAPARI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
37	906-17862-00000	18-0018-00	CONST. PUESTO POLICIAL LA CENTRAL 2º SECCION CARAPARI	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
38	906-00446-00000	19-0035-00	FORTAL. CON VEHICULOS LIVIANOS A LA POLICIA 2DA. SECCION CARAPARI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
39	906-00333-00000	24-0104-00	MEJ. GANADO GENETICO EQUINO 2DA. SECC. G. CHACO	2.000.000,00	225.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
40	906-17982-00000	24-0106-00	DESAR. Y ASISTENCIA TECNICA PARA PRODUC. DE ARROZ EN LOS DISTRITOS I Y VI CARAPARI	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
41	906-17984-00000	24-0107-00	DESAR. Y OPTIMIZACION DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL GANADO BOVINO 2DA. SECC. CARAPARI	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
42	906-17981-00000	24-0112-00	CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA PROCES. ALIM. BALANCEADO P/GANADO MAYO Y MENOR 2DA. SECC. CARAPAR	3.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
43	906-00439-00000	41-0031-00	CONST. CENTRO DE EDUCACION ALTERNATIVO CARAPARI	1.500.000,00	3.600.000,00	2.800.441,29	77,79%	80,00%	EN EJECUCION
44	906-00341-00000	41-0090-00	CONST. CENTRO MULTIFUN. PUEBLOS ORIGINARIOS. CARAPARI	100.000,00	729.847,00	0,00	0,00%	10,00%	EN EJECUCION
45	906-00441-00000	42-0007-00	CONST. Y EQUIPAMIENTO ALBERGUE PARA NIÑOS HUERFANOS Y ABANDONADOS 2DA SECCION CARAPARI	1.200.000,00	5.750.211,00	5.458.825,69	94,93%	95,00%	EN EJECUCION
46	906-01263-00000	41-0056-00	CONST. CENTRO ACOGIMIENTO TERCERA EDAD 2DA. SECC. G. CHACO	10.000.000,00	8.000.000,00	6.227.294,54	77,84%	80,00%	EN EJECUCION
47	906-17204-00000	43-0230-00	CONST. ASF. CARR. CAMPO PAJOSO-CARAPARI-P. BLANCOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
48	906-00356-00000	43-0008-00	MEJ. CAMINO SAN ALBERTO MANANTIAL	10.000.000,00	15.134.652,00	14.812.527,59	97,87%	98,00%	EN EJECUCION
49			MEJ. CAMINO CAMINO SANTA ROSA PUESTO VIEJO	0,00	25.387,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
50	906-00308-00000	43-0146-00	CONST. CAMINO LAS SIDRAS-SAN NICOLAS	28.542,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
51			CONST. CAMINO A. BLANCA CR. RIO NEGRO FASE II CARAPARI	0,00	73.987,00	57.290,62	77,43%	100,00%	CONCLUIDO
52	356-14251-00000	43-0066-00	CONST. TUNEL AGUARAGUE CARAPARI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
53	906-00326-00000	43-0094-00	CONST. CAMINO CAMPO LARGO-ARENALES 2DA. SECC. G. CHACO	900.000,00	3.150.000,00	3.126.345,00	99,25%	99,00%	EN EJECUCION
54	906-00385-00000	43-0107-00	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL YACUNDA-CARAPARI	800.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
55	906-00529-00000	43-0116-00	CONST. ACCESO A LA SECA 2º SECC. G. CHACO	500.000,00	3.100.000,00	2.106.891,44	67,96%	70,00%	EN EJECUCION
56	356-12266-00000	43-0134-00	CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO NEGRO	50.725,00	627.101,00	627.101,00	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
57	356-31500-00000	43-0143-00	CONST. PAVIMENTADO CAMINO CHOERE ITAU	11.737.678,00	14.579.160,00	8.906.379,12	61,09%	65,00%	EN EJECUCION
58	356-13261-00000	43-0045-00	CONST. CAMINO LA PLAQUETA - SIDRAS 2DA. SEC. CARAPARI	14.000.000,00	16.000.000,00	3.753.641,91	23,46%	25,00%	EN EJECUCION
59	906-00310-00000	43-0147-00	CONST. PAVIMENTO CARAPARI - SAN ALBERTO	7.000.000,00	9.000.000,00	8.920.508,89	99,12%	99,00%	EN EJECUCION

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
60	906-00312-00000	43-0148-00	CONST. PAVIMENTO CARAPARI SANTA ROSA	12.363.371,00	13.363.371,00	6.326.111,84	47,34%	50,00%	EN EJECUCION
61	906-00313-00000	43-0149-00	CONST. PAVIMENTO CARAPARI FASE II	12.000.000,00	8.865.348,00	7.624.925,52	86,01%	90,00%	EN EJECUCION
62	906-00412-00000	43-0158-00	CONST. CAMINO PAVIM. CR. CANTO DEL AGUA SALADILLO 2DA. SECC.	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
63	906-00329-00000	43-0168-00	CONST. PUENTES SAN ANTONIO - ARENALES 2DA. SECC. G. CHACO	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
64	906-00336-00000	43-0170-00	APERT. CAMINO SAUZALITO BUENA VISTA 2DA. SECC. G. CHACO	100.000,00	1.095.764,00	741.927,33	67,71%	70,00%	POR LICITAR
65	906-00339-00000	43-0171-00	CONST. PUENTES VEHI. TR. TAQUITO - BERETY CH. CARAPARI	100.000,00	1.244.254,00	1.052.949,67	84,62%	85,00%	EN EJECUCION
66	356-14525-00000	43-0172-00	MEJ. CAMINO BETERY CHACO CHINCHILA TIMBOY	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
67	906-00342-00000	43-0175-00	CONST. PUENTE VEHICULAR S/ QDA. YACUIBA 2DA. SECC. G. CHACO	50.000,00	19.997,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
68	906-00344-00000	43-0176-00	CONST. PUENTE VEHICULAR ITAPERENDA 2DA. SECC. G. CHACO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
69	906-00345-00000	43-0177-00	CONST. PUENTE VEHIC. QDA SEGOVIA, ROSAS 2DA. SECC. G. CHACO	10.000,00	111.222,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
70	906-00347-00000	43-0178-00	CONST. PUENTE COMUNIDAD EL COMUN 2DA. SECC. G. CHACO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
71	356-14494-00000	43-0179-00	CONST. PUENTE VEHICULAR HITO 22	184.697,00	184.697,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
72	906-00435-00000	43-0180-00	CONST. PUENTE VEHICULAR TRAMO SALADILLO-CANTO DEL AGUA 2DA. SECCION CARAPARI	2.083.468,00	2.083.468,00	433.733,68	20,82%	30,00%	EN EJECUCION
73	906-00421-00000	43-0182-00	CONST. DOS PUENTES TRAMO AGUA BLANCA - SAN MIGUEL - ÑACAGUAZU	3.283.428,00	2.638.519,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
74	906-00424-00000	43-0183-00	CONST. CAMINO RUTA F29 FUERTE VIEJO LA COSTA	7.140.015,00	3.297.670,00	3.235.889,56	98,13%	99,00%	EN EJECUCION
75	356-17507-00000	43-0606-00	CONST. PUENTE VEHICULAR CHIRIMOLLAR	50.000,00	72.838,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
76	906-17192-00000	43-0194-00	CONST. ASFALTADO CAMINO CARAPARI TRAMO AGUA BLANCA ITAU	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
77	906-17193-00000	43-0195-00	CONST. CAMINO LAS SIDRAS - LA PASTOSA 2DA. SECC. CARAPARI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	CONCLUIDO
78	906-17204-00000	43-0230	CONST. ASF. CARRET. CARAPARI PALOS BLANCOS TRAMO CARAPARI - ACHERAL	27.245.436,00	22.245.436,00	22.245.436,00	100,00%	100,00%	EN EJECUCION
79	906-00201-00000	43-0231-00	CONST. PUENTE VEHICULAR AGUAYRENDITA 2DA. SECCION CARAPARI	3.995.126,00	902.164,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
80	906-17205-00000	43-0232-00	CONST. PUENTE VEHICULAR QUEBRADA TATAI CARAPARI	4.006.112,00	3.338.491,00	1.769.819,97	53,01%	55,00%	EN EJECUCION
81	906-00205-00000	43-0233-00	CONST. PUENTE VEHICULAR SANTA ROSA - PUESTO VIEJO 2DA. SECCION CARAPARI	3.780.386,00	3.109.518,00	2.350.010,43	75,57%	80,00%	EN EJECUCION
82	356-13044-00000	43-0234-00	CONST. CAMINO ITAU ARROZALES AGUA BLANCA	1.050.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
83	906-17206-00000	43-0235-00	CONST. PUENTE VEHICULAR BUENA VISTA 2DA. SECCION	3.206.146,00	2.120.671,00	1.453.068,08	68,52%	70,00%	EN EJECUCION
84	906-00334-00000	43-0245-00	CONST. PUENTE VEHICULAR LAGUNITAS 2DA. SECC. G. CHACO	100.000,00	2.010.384,00	2.010.379,55	100,00%	100,00%	CONCLUIDO

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
85			MEJ. CAMINO BOYUY-CHIQERITOS-LLANADA 2º SECCION CARAPARI	0,00	530.631,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
86	906-00536-00000	43-0259-00	MEJ. CAMINO LOMA ALTA - EL CHORRO 2º SECC. CARAPARI	500.000,00	3.050.000,00	2.417.813,86	79,27%	80,00%	EN EJECUCION
87	356-13070-00000	44-0003-00	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO CARAPARI	1.315.670,00	715.670,00	700.000,00	97,81%	98,00%	EN EJECUCION
88	906-00331-00000	44-0052-00	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO CAMPO LARGO D-3 2DA. SECC.G. CHACO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
89	906-00548-00000	44-0053-00	CONST. ESTADIO OLIMPICO CARAPARI	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
90	906-00444-00000	12-0055-00	INVEST. DEL CULTIVO DE LA STEVIA 2DA. SECC. CARAPARI	0,00	488.453,00	79.751,08	16,33%	20,00%	EN EJECUCION
91	906-17996-00000	12-0080-00	EQUIP. CENTRO DE INCUBACION POLLOS BEBE 2DA. SECCION CARAPARI	998.399,00	152.199,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
92	906-17997-00000	12-0081-00	DESAR. DE LA PRODUCCION DE PATOS PEKIN EN LAS COM. GUARANIES 2DA. SECCION CARAPARI	998.400,00	112.460,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
93	906-00443-00000	12-0392-00	IMPLEM. MANEJO DE GERMOPLASMA DE FRUTALES 2DA. SECC. GRAN CHACO	0,00	3.519.943,00	162.687,12	4,62%	10,00%	EN EJECUCION
94			INVEST. Y PRODUCCION DE FRUTILLA EN LA 2DA. SECCION G. CHACO	0,00	837.440,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
95			FOREST. Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL ALGARROBO EN DISTRITOS III Y IV DE LA 2DA. SECC. CARAPARI	0,00	686.364,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
96			DESAR. Y ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION DE CAA DE AZUCAR EN LOS DISTRITO I Y VI CARAPARI	0,00	654.700,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
97	906-17181-00000	43-0260-00	CONST. DE OBRAS DE ARTE MENOR PARA LA RED VIAL DPTAL. 2DA. SECCION G. CHACO	2.348.793,00	2.348.793,00	200.839,39	8,55%	10,00%	EN EJECUCION

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
63			UNIDAD SECCIONAL DE BERMEJO	115.734.896,00	125.740.983,00	37.612.411,44	29,91%		
12			PREINVERSION	810.000,00	810.000,00	80.000,00	9,88%		
1	906-01262-00000	10-0240-00	CONST. OBRAS DE PROTEC. AREAS PRODUC. MARGENES RIO BJO. Y RIO GRANDE DE TARIJA	50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00%	80,00%	EN EJECUCIÓN
2	906-15374-00000	12-0035-00	CONST. SISTEMA DE RIEGO ZONAS ALTAS, COMUN.SAN LUIS EL ANTA,QDA CHICA, COSTA RICA, ALTO CALAMA-BJO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	20,00%	EN EJECUCIÓN
3	906-15372-00000	12-0036-00	INSTAL. SERVICIOS COMPLEMENT. PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS BERMEJO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	20,00%	EN EJECUCIÓN
4	906-17845-00000	12-0515-00	CONST. SISTEMA DE RIEGO CANTON ARROZALES PORCELANA Y CANDADITOS 2DA SECC. PROV. ARCE BERMEJO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	20,00%	EN EJECUCIÓN
5	906-17846-00000	12-0516-00	CONST. PRESA Y CONSERVACION QUEBRADA EL NUEVE 2DA SECC. PROV. ARCE BERMEJO.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%	PROCESO DE LICITACIÓN
6	906-17202-00000	14-0119-00	CONST. Y EQUIPAMIENTO ESTACION POLICIAL INTEGRAL PROV. ARCE - BERMEJO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	PROCESO DE LICITACIÓN
7	906-17054-00000	15-0261-00	CONST. PERFORACION Y OBRAS ADICIONALES POZOS PROFUNDOS PROV. ARCE - BERMEJO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
8	906-00801-00000	42-0028-00	CONST. VIVIENDAS SALUDABLES AREA RURAL BERMEJO CANTONES PORCELANA,ARROZALES Y CANDADITOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
9	906-19022-00000	43-0267-00	CONST. PUENTES PEATONALES ACCESO COM. ISLA EL PORVENIR E ISLA BARREDERO - BERMEJO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	PROCESO DE LICITACIÓN
10	906-17844-00000	43-0268-00	CONST. OBRAS DE ARTE CANTON PORCELANA Y ARROZALES 2DA SECC. PROV. ARCE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	20,00%	EN EJECUCIÓN
11	906-17843-00000	43-0269-00	CONST. VIAS DE ACCESO ZONA PRODUCTIVA CABECERA EL NUEVE Y QUEBRADA CHICA - BERMEJO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	PROCESO DE LICITACIÓN
12	906-17842-00000	43-0270-00	CONST. VIAS DE ACCESO ZONA PRODUCTIVA CAMPANARIO - VILLANUEVA 2DA SECC. PROV. ARCE BERMEJO	50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00%	80,00%	EN EJECUCIÓN
51			INVERSION	114.924.896,00	124.930.983,00	37.532.411,44	30,04%		
1	906-17851-00000	10-0010-00	CONST. EMBOVEDADO QUEBRADA EL CINCO BERMEJO	8.500.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00%	0,00%	EN EJECUCIÓN
2	906-19034-00000	10-0011-00	CONST. DEFENSIVOS RIO TARIJA FASE IV 2DA SECC. BERMEJO	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
3	906-19035-00000	10-0012-00	CONST. DEFENSIVOS RIO BERMEJO FASE IV 2DA SECC. BERMEJO	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
4	906-19042-00000	11-0011-00	AMPL. SISTEMA ELECTRICO POTENCIA DE MEDIA TENSION - BERMEJO	1.500.000,00	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
5	906-00001-00000	11-0063-00	AMPL. SIST. DE ELECT. RURA CANTONES ARROZALES FASE II	5.050.000,00	4.000.000,00	3.852.595,40	96,31%	100,00%	EN EJECUCIÓN
6	356-17131-00000	12-0026-00	APOYO FOM. A LA TRANSF Y COMERC DE CITRICOS BJO	16.030.000,00	10.530.000,00	476.158,34	4,52%	10,00%	EN EJECUCIÓN
7	906-00802-00000	12-0057-00	CONST. ATAJADOS Y ESTANQUES CANTONES ARROZALES, CANDADITOS Y PORCELANA	500.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
8	906-15296-00000	12-0099-00	APOYO PRODUC. DE MIEL Y POLEN PARA LOS CANTONES DE ARROZALES Y CANDADITOS MUNICIPIO BERMEJO	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	5,00%	EN EJECUCIÓN
9	906-15094-00000	12-0271-00	FORTAL. A LA PRODUCCION DE CITRICOS SECCION BERMEJO	327.499,00	327.499,00	137.123,19	41,87%	53,00%	EN EJECUCIÓN
10	906-00416-00000	12-0272-00	FORTAL. PROD. FRUTALES CAROZO PROV. ARCE BERMEJO	357.994,00	357.994,00	101.896,33	28,46%	30,00%	EN EJECUCIÓN
11	906-17220-00000	12-0422-00	CONST. GRANJA PISCICOLA BERMEJO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	5,00%	EN EJECUCIÓN
12	906-17858-00000	12-0517-00	APOYO A LA PRODUCCION DE CITRICOS 2DA SECC. BERMEJO	500.000,00	500.000,00	58.080,33	11,62%	15,00%	EN EJECUCIÓN

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
13	906-19059-00000	12-0519-00	APLIC. DE FERTILIZANTES EN CULTIVOS AGRICOLAS SECC. BERMEJO	200.000,00	999.800,00	14.455,00	1,45%	5,00%	EN EJECUCIÓN
14	906-19067-00000	12-0520-00	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA 2DA SECC. BERMEJO.	500.000,00	500.000,00	95.082,47	19,02%	22,00%	EN EJECUCIÓN
15	906-19068-00000	12-0521-00	DESAR. DE LOS CULTIVOS HORTICOLAS SECCION BERMEJO	200.000,00	999.774,00	2.000,00	0,20%	2,00%	EN EJECUCIÓN
16	906-19069-00000	12-0522-00	FORTAL. AL SECTOR FRUTICOLA 2DA SECC. BERMEJO	500.000,00	500.000,00	96.613,16	19,32%	25,00%	EN EJECUCIÓN
17	906-19070-00000	12-0523-00	FORTAL. AL CONTROL DE MALEZAS 2DA SECC. BERMEJO.	500.000,00	984.000,00	269.277,16	27,37%	30,00%	EN EJECUCIÓN
18	906-19071-00000	12-0524-00	FORTAL. AL CULTIVO UVA DE MESA SECCION BERMEJO	500.000,00	500.000,00	41.565,66	8,31%	10,00%	EN EJECUCIÓN
19	906-19072-00000	12-0525-00	PRESER. DE SUELOS P/FINES AGRICOLAS SECCION BERMEJO	500.000,00	500.000,00	116.184,49	23,24%	25,00%	EN EJECUCIÓN
20	906-19074-00000	12-0526-00	APOYO A LA PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR SECCION BERMEJO	500.000,00	500.000,00	276.828,05	55,37%	60,00%	EN EJECUCIÓN
21	906-19075-00000	12-0528-00	DESAR. AGRICOLA PARA LA PRODUCCION DE LA CAÑA DE AZUCAR BERMEJO	7.800.000,00	8.899.000,00	8.090.054,01	90,91%	92,00%	EN EJECUCIÓN
22	906-17993-00000	13-0010-00	REFAC. Y RESTAURACION IGLESIAS SAN SANTIAGO Y SAN ANTONIO BERMEJO	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	PROCESO DE LICITACIÓN
23	906-15302-00000	14-0003-00	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS GOBERNACION SECCION BERMEJO	50.000,00	511.030,00	487.493,89	95,39%	97,00%	EN EJECUCIÓN
24	906-15368-00000	14-0018-00	CONST. TRES CENTROS POLICIALES AREA RURAL MUNICIPIO DE BERMEJO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	100,00%	CONCLUIDO
25	906-19044-00000	14-0030-00	CONST. PISTA ATLETICA SINTETICA - ESTADIUM FABIAN TINTYLA BERMEJO	2.000.000,00	1.500.000,00	47.877,61	3,19%	6,00%	EN EJECUCIÓN
26	906-19073-00000	14-0040-00	CONST. DE CANALES QDAS. LA TALITA PORCELANA CAMPO GRANDE CANDADO GRANDE SECC. BERMEJ	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
27		14 0087 000	CONST. CORDONES Y ACERAS CIUDAD DE BERMEJO	0,00	1.400.000,00	1.200.000,00	85,71%	90,00%	EN EJECUCIÓN
28	906-15290-00000	15-0008-00	CONST. OBRAS DE SANIAMIENTO BASICO URBANIZACION EL PORVENIR	550.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
29	906-15304-00000	15-0014-00	CONST. OBRAS DE SANIAMIENTO BASICO COMUN. ARROZALES, CERCADO Y PORCELANA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.314.197,39	87,61%	90,00%	EN EJECUCIÓN
30		15 0037 000	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS INTERNADO COLONIA JOSE MARIA LINARES	0,00	165.720,00	165.719,55	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
31	906-00394-00000	15-0239-00	CONST. Y EQUIP. POZOS PROF. PROV. ARCE BERMEJO	200.000,00	324.700,00	324.690,23	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
32	356-17806-00000	40-0004-00	EQUIP. HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA BERMEJO	10.000.000,00	12.132.885,00	4.648.458,00	38,31%	40,00%	EN EJECUCIÓN
33	906-00409-00000	40-0037-00	ERRADIC. DEL DEMGUE MALARIA LESMANIASSES, ANTA VIRUS BERMEJO	542.000,00	542.000,00	86.095,00	15,88%	20,00%	EN EJECUCIÓN
34	906-00399-00000	40-0038-00	CONST. INFRAESTRUCTURA VIRGEN DE CHAGUAYA BERMEJO	5.200.000,00	6.447.000,00	3.623.269,49	56,20%	60,00%	EN EJECUCIÓN
35		41 0011 000	EQUIP. UNIDAD EDUCATIVA OCTAVIO CAMPERO ECHAZU	0,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
36		41 0015 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA OCTAVIO CAMPERO ECHAZU BERMEJO	0,00	1.918.395,00	1.769.052,02	92,22%	95,00%	EN EJECUCIÓN
37	906-15319-00000	41-0038-00	CONST. INTERNADO PARA ESTUDIANTES DEL AREA RURAL BERMEJO	2.050.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
38	906-15311-00000	41-0039-00	CONST. CAMPUS UNIVERSITARIO UNIV. JUAN MISAEL SARACHO CIUDAD DE BERMEJO	2.000.000,00	2.000.000,00	809.939,37	40,50%	45,00%	EN EJECUCIÓN

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
39	906-17849-00000	41-0040-00	CONST. CAMPUS UNIVERSITARIO U.A.J.M.S MODULO II - FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS - BERMEJO	4.914.411,00	4.614.411,00	0,00	0,00%	0,00%	PROCESO DE LICITACIÓN
40	906-01263-00000	41-0056-00	CONST. Y EQUIP.CENTRO DE ACOGIMIENTO TERCERA EDAD BJO FASE II	2.677.992,00	1.677.992,00	148.769,39	8,87%	10,00%	EN EJECUCIÓN
41	356-15114-00000	43-0006-00	CONST.CAM.Y OBRAS DE ARTE TR.COM. PERALITOS -COM. BARR	1.050.000,00	1.080.216,00	543.297,36	50,30%	53,00%	EN EJECUCIÓN
42	906-00800-00000	43-0007-00	MEJ. DE VIAS DE ACCESO ZONA PRODUC. COM. SAN LUIS EL ANTA BERMEJO	500.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
43	906-00005-00000	43-0095-00	REHAB. Y MANTENIMIENTO VIAL CAMINOS CAÑEROS BERMEJO	3.225.000,00	4.182.687,00	1.162.437,50	27,79%	30,00%	EN EJECUCIÓN
44	906-17850-00000	43-0128-00	CONST. TRAMO INTERCONEXIN RUTA TARIJA - BERMEJO - CARAPARI	9.900.000,00	9.900.000,00	932.906,82	9,42%	10,00%	EN EJECUCIÓN
45	906-00804-00000	43-0187-00	MEJ. ACCESO ZONA PRODUCTIVA CRUCE SANTA ROSA LA FLORIDA	500.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00%	2,00%	EN EJECUCIÓN
46	906-15397-00000	43-0218-00	CONST. PAVIMENTO AVENIDA CIRCUNVALACION CIUDAD DE BERMEJO	10.000.000,00	5.600.000,00	4.818.795,42	86,05%	90,00%	EN EJECUCIÓN
47	906-00803-00000	43-0228-00	CONST. DIEZ PUENTES VEHICULARES,ZONAS PRODUCTIVAS CANTON ARROZALES	1.000.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	EN EJECUCIÓN
48	906-17053-00000	43-0229-00	CONST. PAVIMENTO RIGIDO COLONIA LINARES PROV. ARCE - BERMEJO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	EN EJECUCIÓN
49	906-17854-00000	43-0266-00	CONST. PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA BERMEJO AEROPUERTO PROV. ARCE BERMEJO	8.000.000,00	5.400.000,00	1.321.498,81	24,47%	0,00%	EN EJECUCIÓN
50		43 0700 000	CONST. PAVIMENTO 180 CUADRAS - CIUDAD DE BERMEJO	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
51	906-00397-00000	44-0015-00	CONST. O. COMPL STADIUM F. TINTILAY P. ARCE BERME	500.000,00	685.880,00	500.000,00	72,90%	75,00%	EN EJECUCIÓN

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
21			UNIDAD SECCIONAL DE YUNCHARA	58.177.693,00	58.492.693,00	15.173.410,07	25,94%		
7			PREINVERSION	2.077.000,00	2.902.866,00	247.770,00	8,54%		
1		12 0073 000	MEJ. Y AMP. SISTEMAS DE RIEGO DISTRITO IV 2DA SECC. PROV. AVILES	0,00	69.611,00	55.770,00	80,12%	85,00%	EN EJECUCIÓN
2	906-19078-00000	43-0614-00	MEJ. Y CONSTRUCCION CAMINO ZURITA ASLOCA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
3		43 0615 000	CONST. PUENTES VEHICULARES QDA HONDA Y QDA ROSARIO	0,00	315.000,00	0,00	0,00%	0,00%	EN EJECUCIÓN
4	906-19079-00000	43-0616-00	MEJ. CAMINO YUNCHARA TOJO CARRETAS	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
5	906-19080-00000	43-0617-00	MEJ. Y AMP. CAMINO HUAYLLAJARA PULARIO	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
6	906-01527-00000	12-0618-00	MEJ. Y AMPLIAC. SIST. DE RIEGO DISTR.5 QUEBRADA HONDA	192.000,00	633.255,00	192.000,00	30,32%	35,00%	EN EJECUCIÓN
7	906-19080-00000	43-0617-00	MEJ. Y AMPLIACION CAMINO CRUCE COPACABANA- HUAYLLAJARA - LA FALDA	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
14			INVERSION	56.100.693,00	55.589.827,00	14.925.640,07	26,85%		
1	906-01521-00000	11-0045-00	AMPL. ELECTRIFICACION RURAL 2DA. SECCION PROV. AVILES	4.475.051,00	1.499.326,00	227.416,00	15,17%	20,00%	EN EJECUCIÓN
2		12 0152 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO CANTON SAN PEDRO	0,00	29.759,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
3	906-01530-00000	12-0040-00	CONST. Y EQUIP. INVERNADEROS COMUNALES 32 COM. 2DA SECC. PROV. AVILES	7.619.398,00	7.266.267,00	0,00	0,00%	0,00%	PROCESO DE LICITACIÓN
4	906-00652-00000	12-0297-00	APOYO A LA PRODUCCION APICOLA 13 COMUNIDADES 2DA SEC. PROV.AVILEZ	639.765,00	1.260.888,00	560.697,68	44,47%	47,00%	EN EJECUCIÓN
5	356-14415-00000	12-0603-00	CAPAC. Y TRANSF.TEC.FRUTICOLA ECOLOGICA 8 COM.2ª S. AVILES	2.080.446,00	1.564.768,00	128.020,86	8,18%	10,00%	EN EJECUCIÓN
6	906-19061-00000	14-0609-00	CONST. INFRAESTRUCTURA PARA RESGUARDO DE MAQUINARIA SECCION YUNCHARA	1.662.951,00	1.662.951,00	0,00	0,00%	0,00%	EN EJECUCIÓN
7	356-14414-00000	43-0074-00	MEJ. Y APERTURA CAMINO RUPASKA - TOJO	630.543,00	630.543,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
8	356-14795-00000	43-0174-00	MEJ. Y APERTURA CAMINO POZUELOS ABRA DE PULARIO	5.296.406,00	7.739.444,00	2.134.589,98	27,58%	30,00%	EN EJECUCIÓN
9	906-01528-00000	43-0192-00	MEJ. Y MEJORAM. OBRAS DE ARTE CAMINO TOJO - EL PARRAL	8.383.302,00	960.211,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
10	906-01532-00000	43-0604-00	CONST. Y MEJ. CAMINO SAN LUIS DE PALQUI-EL PARRAL-VERDIGUERA	9.763.859,00	14.743.912,00	8.470.160,12	57,45%	60,00%	EN EJECUCIÓN
11	906-01538-00000	43-0605-00	MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LA 2DA. SECC.PROV. AVILES	8.267.453,00	8.267.453,00	637.999,87	7,72%	10,00%	EN EJECUCIÓN
12	356-17507-00000	43-0606-00	CONST. PUENTE VEHICULAR CHIRIMAYO	3.879.149,00	3.879.149,00	1.715.124,84	44,21%	45,00%	EN EJECUCIÓN
13	906-01533-00000	44-0041-00	CONST. ESTADIO CELEDONIO FARFAN 2DA. SECCION PROV. AVILES	3.402.370,00	3.402.370,00	1.051.630,72	30,91%	35,00%	EN EJECUCIÓN
14		44 0266 000	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO ZONA ALTA DEPTO. DE TARIJA	0,00	2.682.786,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
33			UNIDAD SECCIONAL DE EL PUENTE	87.451.642,00	88.926.642,00	14.864.067,02	16,71%		
17			PREINVERSION	1.896.996,00	1.258.923,00	0,00	0,00%		
1	906-19092-00000	12-0239-00	CONST. Y EQUIP. CETHA PIRGUA PAMPA 2DA SECC. PROV. MENDEZ	86.761,00	86.761,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
2	906-00838-00000	12-0621-00	MEJ. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PAICHO	241.088,00	241.088,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
3	906-19082-00000	12-0622-00	CONST. DEFENSIVOS DISTRITO PAICHO	72.699,00	72.699,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
4	906-19083-00000	12-0623-00	CONST. DEFENSIVOS DISTRITO TOMAYAPO	72.699,00	72.699,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
5	906-19085-00000	12-0624-00	MEJ. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ISCAYACHI	167.365,00	167.365,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
6	906-19086-00000	12-0625-00	DESAR. Y MANEJO DE LA ACTIVIDAD LECHERA DISTRITO DE ISCAYACHI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
7	906-19087-00000	12-0626-00	MEJ. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA TRES CRUCES	54.588,00	42.615,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
8	906-19091-00000	12-0630-00	CONST. PISCIGRANJAS RIO SAN JUAN DEL ORO	78.099,00	78.099,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
9	906-19093-00000	12-0633-00	CONST. CENTRO EXPERIMENTAL AGROPECUARIO RIO SAN JUAN DEL ORO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
10	906-19088-00000	12-0635-00	MEJ. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA CURQUI	93.307,00	93.307,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
11	906-19090-00000	13-0037-00	IMPLEM. DE PARCELAS PILOTO DE OLIVO RIO SAN JUAN DEL ORO	318.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
13		13 0030 000	CONST. CABAÑAS TURISTICAS RIO SAN JUAN DEL ORO	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
14	906-19097-00000	41-0080-00	CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL ISCAYACHI	62.534,00	62.534,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
15	906-19098-00000	41-0640-00	CONST. Y EQUIPAMIENTO CASA DE LA MUJER 2DA SECC. PROV. MENDEZ	70.663,00	70.663,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
16	906-19076-00000	43-0615-00	CONST. Y EQUIPAMIENTO CETHA ISCAYACHI	74.093,00	74.093,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
17			CONST. PUENTES VEHICULARES QDA HONDA Y QDA ROSARIO	315.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
16			INVERSION	85.554.646,00	87.667.719,00	14.864.067,02	16,96%		
1	356-14766-00000	10-0038-00	CONST. GAVIONES ISCAYACHI- QUERBRADA GRANDE-SAMA- PAPACHACRA	5.600.000,00	8.500.000,00	5.562.980,43	65,45%	70,00%	EN EJECUCIÓN
2	906-00660-00000	10-0245-00	CONST. ATAJADOS CANTONES DE TOMAYAPO-PAICHO-ISCAYACHI	5.680.000,00	5.777.765,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
3	906-15109-00000	10-0256-00	CONST. Y MEJORAMIENTO ESTANQUES CANTON CURQUI	216.000,00	589.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
4	906-19077-00000	10-0613-00	CONST. DEFENSIVOS RIO SAN JUAN DEL ORO	5.000.000,00	4.922.073,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
5	906-00661-00000	11-0610-00	AMPL. Y MEJ. ELECTRIFICACION RURAL 2DA SECCION PROV. MENDEZ	4.400.000,00	8.268.903,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
6		12 0069 000	CONST. SIST.RIEGO S.LORENCITO-TRES CRUCES-V.NUEVA-EL MOLINO	0,00	174.151,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
7	906-15110-00000	12-0372-00	IMPLEM. DE CARPAS SOLARES EN EL CANTON DE ISCAYACHI	5.000.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
8		12 0375 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO HUARMACHI - CURQUI	0,00	81.382,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
9	906-01509-00000	12-0610-00	MEJ. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA OBISPO CHINCHILLA	3.925.000,00	4.320.799,00	2.479.893,12	57,39%	60,00%	EN EJECUCIÓN

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
10	356-15022-00000	12-0631-00	CONST. PRESA COMUNAL HUANCAR - PUCUPAMPA-S. FRANCISCO Y CHINCHILLA	4.330.000,00	2.780.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
11	906-19099-00000	12-0640-00	CONST. INFRAEST.CORREGIMIENTO MAYOR EL PUENTE E ISLAYACHI	2.110.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
12	356-14764-00000	14-0050-00	CONST. CAMINO ASFALTADO IRCALAYA - EL PUENTE - LA VERDIGUERA	20.000.000,00	20.000.000,00	3.586.504,97	17,93%	20,00%	EN EJECUCIÓN
13	356-15126-00000	43-0046-00	CONST. OBRAS DE ARTE MAYOR CAÑA CRUZ - CHILCAS	4.830.000,00	4.830.000,00	1.399.376,63	28,97%	30,00%	EN EJECUCIÓN
14	356-14125-00000	43-0047-00	CONST. PUENTE VEHIC.CHINCHILLA	1.339.000,00	1.339.000,00	776.162,50	57,97%	60,00%	EN EJECUCIÓN
15	356-15149-00000	43-0220-00	CONST. (APERT.) CAM.AGUA BUENA-PAMPARAYO	3.080.198,00	3.080.198,00	1.059.149,37	34,39%	35,00%	EN EJECUCIÓN
16	356-15148-00000	43-0223-00	MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL 2DA SECCION PROV. MENDEZ	20.044.448,00	22.954.448,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
94			UNIDAD SECCIONAL DE VILLA MONTES	206.944.029,00	204.708.010,00	28.645.252,20	13,99%		
41			PREINVERSION	10.590.677,00	9.574.197,00	635.543,80	6,64%		
1	906-15078-00000	10-0261-00	CONST. PRESA CAIGUAMI - CHIMEO	489.924,00	489.924,00	162.000,00	33,07%	15,00%	EN EJECUCION
2	906-00133-00000	10-0272-00	CONST. DEFENSIVOS R PILC. COM. CUTAIQUI VICTORIA ESMERALDA	65.251,00	163.127,00	0,00	0,00%	80,00%	EN EJECUCION
3	906-00137-00000	10-0273-00	CONST. DEFENSIVOS PUESTO UNO KM UNO CAPIRENDITA	41.663,00	104.156,00	0,00	0,00%	80,00%	EN EJECUCION
4	906-17905-00000	10-0300-00	CONST. DEFENSIVOS COM. IPA-PIRITI-LA CENTRAL QDA.YATEBUTE - CORTADERAL	396.618,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
5	906-17910-00000	10-0291-00	CONST. DEFENSIVOS COMUNIDAD DE IPA-PIRITI-CENTRAL-QUEBRADA YATEBUTE -CORTADERAL-V.M	396.618,00	396.618,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
6	906-01513-00000	11-0073-00	AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA RURAL VILLA MONTES	520.000,00	214.270,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
7	906-17801-00000	11-0081-00	CONST. ELECTRIFICACION CON SIST. ALTERNATIVOS P/BOMBEO DE AGUA ZONA RURAL VILLA MONTES	95.354,00	95.354,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
8	906-17944-00000	11-0091-00	CONST. ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES LA CENTRAL Y TUCAINTY VILLA MONTES	288.421,00	288.421,00	0,00	0,00%	0,00%	EN EJECUCION
9	906-17800-00000	11-0131-00	CONST. ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES LA COSTA, LA TRICOLOR Y LIMITAS	256.373,00	256.373,00	0,00	0,00%	0,00%	EN EJECUCION
10	906-15084-00000	12-0008-00	CONST. PRESA TENTAIHUATI-PIRITI	466.042,00	466.042,00	0,00	0,00%	50,00%	EN EJECUCION
11	906-15182-00000	12-0277-00	CONST. PRESA IPA	94.743,00	350.484,00	94.743,00	27,03%	100,00%	CONCLUIDO
12	906-00913-00000	12-0278-00	CONST. DE EMBALSES EN CAÑADAS DE LA LLANURA CHAQUEÑA VILLA MONTES	318.509,00	528.198,00	163.701,80	30,99%	100,00%	CONCLUIDO
13			MEJ. OVINO DE PELO COMUNIDADES GUARANIES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
14			HABIL. DE LAGUNAS AREA RURAL VILLA MONTES	0,00	119.209,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
15			CONST. PRESA TAMPINTA	0,00	81.983,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
16			CONST. PRESA IGUEMBE	0,00	165.507,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
17			CONST. PRESA LAGUNITAS	0,00	168.587,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
18	906-17955-00000	12-0431-00	CONST. DE EMBALSES DISTRITO - 11 AREA RURAL VILLA MONTES	210.102,00	210.102,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
19	906-15155-00000	13-0015-00	CONST. COMPLEJO TURISTICO AREA DE INFLUENCIA PRESA CAIGUA	187.458,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
20	906-17902-00000	13-0096-00	CONST. CIRCUITO TURISTICO RIO PILCOMAYO- BOLIVAR-PEA COLORADA-SAN ANTONIO - VILLA MONTES	405.927,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
21	906-17901-00000	13-0097-00	CONST. CIRCUITO TURISTICO DEFENSORES DEL CHACO VILLA MONTES	368.290,00	368.290,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
22			CONST. Y EQUIPAMIENTO CIRCUITO TURISTICO RIO PILCOMAYO ,PEA COLORADA-SAN ANTONIO VILLA MONTES	0,00	405.927,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
23			CONST. PARQUE TEMATICO INTERACTIVO TURISTICO CULTURAL VILLA MONTES	0,00	236.249,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
24	906-17839-00000	14-0071-00	CONST. INFRAESTRUCTURA SEDECA VILLA MONTES	301.962,00	72.750,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
25	906-18007-00000	14-0123-00	CONST. PARQUE INDUSTRIAL MODELO VILLA MONTES	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
26			DIAGN. Y ANLISIS DE LOS RECURSOS HDRICOS SUPERFICIALES Y SUBTERRNEOS 3RA SECCIN VILLA MONTES	0,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
27	906-17995-00000	40-0045-00	CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES PREVALENTES VILLA MONTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
28			CONST. POLITECNICO TIGUIPA VILLA MONTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
29			CONST. CENTRO CULTURAL DISTRITO IV VILLA MONTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
30	906-15160-00000	43-0165-00	AMPL. AEROPUERTO RAFAEL PAVON VILLA MONTES	300.091,00	300.091,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
31	906-17893-00000	43-0281-00	CONST. PUENTE VEHICULAR ESMERALDA - VILLA MONTES	189.558,00	189.558,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
32	906-17907-00000	12-0216-00	DESAR. TECNOLOGICO PRODUCTIVO DE LECHE Y SUS DERIVADOS VILLA MONTES	225.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
33	906-17903-00000	12-0217-00	DESAR. TECNOLOGICO PRODUCTIVO DE LA CAA DE AZUCAR VILLA MONTES	1.275.000,00	667.535,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
34	906-00926-00000	12-0281-00	CONST. DE BAÑADOS PARA LA REPRODUCCION NATURAL DEL SABALO EN VILLA MONTES	796.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
35	906-00918-00000	12-0284-00	MEJ. OVINO DE PELO COMUNIDADES GUARANIES	67.774,00	153.000,00	45.747,00	29,90%	50,00%	EN EJECUCION
36	906-15223-00000	12-0287-00	DIAGN. TRATAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL CUERO VACUNO VILLA MONTES	36.129,00	90.323,00	27.096,90	30,00%	50,00%	EN EJECUCION
37	906-17802-00000	12-0299-00	HABIL. DE LAGUNAS AREA RURAL VILLA MONTES	119.209,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
38	906-17865-00000	12-0399-00	IMPLEM. DE SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES EN LA 3RA SECCION VILLA MONTES	184.000,00	230.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
39			CONST. COMPLEJO TURISTICO AREA DE INFLUENCIA PRESA CAIGUA	0,00	187.458,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
40	906-00925-00000	13-0020-00	CONST. Y EQUIP. DE ACUARIO Y MUSEO ICTICOLA VILLA MONTES	293.309,00	293.309,00	142.255,10	48,50%	50,00%	EN EJECUCION
41	906-00917-00000	41-0023-00	CONST. Y EQUIP. CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL WEENHAYEK V.M.	101.352,00	101.352,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
53			INVERSION	196.353.352,00	195.133.813,00	28.009.708,40	14,35%		
1	356-14467-00000	10-0014-00	CONST. INUNDACIONES VILLA MONTES BARRIO BOLIVAR FASE II	14.686.398,00	14.686.398,00	5.779.716,19	39,35%	42,00%	EN EJECUCION
2	906-17915-00000	10-0015-00	CONST. INUNDACIONES VILLA MONTES BARRIO BOLIVAR FASE III	3.736.510,00	2.236.510,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
3			CONST. OBRAS DE PROTECCION DE EROSIONES CUENCA CAIGUA	0,00	556.000,00	0,00	0,00%	100,00%	CONCLUIDO
4	906-01275-00000	10-0092-00	RECUP. DEL CAUCE DEL RIO PILCOMAYO PROVINCIA GRAN CHACO	2.236.019,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
5	356-16983-00000	11-0023-00	CONST. ELECTRIFICACION TRIFASICA VILLAMONTES- IBIBOBO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	100,00%	CONCLUIDO
6	906-15292-00000	11-0047-00	AMPL. ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUNIDADES DEL DISTRITO 6 Y 9 VILLA MONTES	589.593,00	589.593,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
7	906-00100-00000	11-0050-00	CONST. ELECT.TRIFASICA IBIBO ESMERALDA HT BR 94	7.473.975,00	7.473.975,00	2.780.573,97	37,20%	33,00%	EN EJECUCION
8	906-15289-00000	11-0051-00	MEJ. DEL TENDIDO ELCTRICO VILLA MONTES TIGUIPA	8.970.808,00	7.420.499,00	4.657.154,88	62,76%	30,00%	EN EJECUCION
9	906-00915-00000	11-0066-00	IMPLEM. DE PANELES SOLARES AREA RURAL VILLAMONTES FASE II	578.509,00	578.509,00	328.326,89	56,75%	40,00%	EN EJECUCION

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
10	906-17046-00000	11-0120-00	CONST. CENTRAL TERMoeLECTRICA DEFENSORES DEL CHACO VILLA MONTES	33.829.977,00	34.621.457,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
11	906-17840-00000	11-0150-00	AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA CAMPO FERIAL VILLA MONTES	799.378,00	799.378,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
12	906-00931-00000	12-0248-00	CONST. POZOS PROFUNDOS PARA PRODUCCION AGROPECUARIA VILLA MONTES	7.533.750,00	7.533.750,00	0,00	0,00%	30,00%	EN EJECUCION
13			RESTAU. REMODELACION Y AMPLIACION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO SOLANO VILLA MONTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
14	906-17047-00000	14-0020-00	CONST. OFICINAS SECRETARIA DE HACIENDA GARVM	336.224,00	336.224,00	336.224,00	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
15	906-17890-00000	14-0035-00	EQUIP. COMANDO FRONTERA POLICIAL UNID. RADIO PATRULLA 110-TRANSITO VILLA MONTES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
16			CONST. AMBIENTES PARA LA SECRETARA DEL AGUA Y ENERGA DEL GOBIERNO AUTNOMO REGIONAL VILLA MONTES	0,00	107.309,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
17			CONST. CENTRO DE CAPACITACION TECNICA DISTRITO IV VILLA MONTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
18			CONST. CENTRO DE CAPACITACION TECNICA SAN ANTONIO VILLA MONTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
19			CONST. CENTRO DE CAPACITACION TECNICA TARAIRI VILLA MONTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
20			CONST. CENTRO DE CAPACITACION TECNICA CAIGUA VILLA MONTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
21			CONST. CENTRO DE CAPACITACION TECNICA PALMAR GRANDE VILLA MONTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
22	906-15150-00000	14-0081-00	FORTAL. COMANDO POLICIAL - UNIDAD BOMBEROS VILLA MONTES	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
23	906-17048-00000	14-0480-00	MEJ. DE INFRAESTRUCTURA Y AREAS EXTERIORES PREDIOS GOBERNACION AUTONOMA REGIONAL VILLA MONTES	199.171,00	995.854,20	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
24			CONST. CASA DEL ADULTO MAYOR VILLA MONTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
25			CONST. E INFRAESTRUCTURA -CAMPAMENTOS SEDECA VILLA MONTES	0,00	850.920,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
26	356-17043-00000	15-0009-00	REUBIC. OBRA DE TOMA ADUCCION Y TANQUE ALMAC. CAIGUA- TAHIGU	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
27	906-15090-00000	15-0011-00	CONST. 40 POZOS PROFUNDOS 3ª SEC. PROV. GRAN CHACO	6.612.689,00	6.612.689,00	1.222.119,12	18,48%	94,00%	EN EJECUCION
28			CONST. PERFORACION POZOS PROFUNDOS POR EMERGENCIA EN V. M. 3ª SEC. PROV. G. CH.	0,00	567.000,00	566.894,56	99,98%	100,00%	CONCLUIDO
29			EQUIP. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRFICA VILLA MONTES	0,00	320.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
30	906-19007-00000	40-0032-00	CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO INTEGRAL NIOS,NIAS Y ADOLESCENTES VILLA MONTES	3.200.000,00	2.349.080,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
31	356-15215-00000	41-0018-00	CONST. DE UN CENTRO CULTURAL INDIGENA GUARANI	1.455.504,00	1.455.504,00	915.054,57	62,87%	100,00%	CONCLUIDO
32			CONST. CASA DE LA MUJER VILLA MONTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
33	906-17841-00000	43-0277-00	CONST. PAVIMENTADO CAMINO VILLA MONTES -ISIRI	54.924.617,00	54.924.617,00	339.497,81	0,62%	1,00%	EN EJECUCION
34	906-00134-00000	44-0014-00	AMPL. ESTADIO DEFENSORES VILLAMONTES	7.000.000,00	6.203.316,80	5.134.313,88	82,77%	100,00%	CONCLUIDO
35			CONST. POLIGIMNASIO DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO VILLA MONTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
36			CONST. CENTRO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL VILLA MONTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
37	906-00116-00000	10-0013-00	CONST. EQUIP. Y MANEJO EST. PISCICOLA 3RA SEC. VILLAMONTE	3.845.516,00	3.845.516,00	154.073,18	4,01%	5,00%	EN EJECUCION
38	906-00923-00000	10-0275-00	IMPLEM. DE VIVEROS FORESTALES EN LA 3RA SEC. VILLA MONTES	1.028.934,00	1.228.934,00	232.923,08	18,95%	20,00%	EN EJECUCION
39	356-17557-00000	12-0007-00	IMPLEM. Y TRANSF.D/FORRAJES P/GANADO BOVINO 3RA SEC.G.CHACO	539.864,00	1.519.864,00	824.149,20	54,23%	55,00%	EN EJECUCION
40	906-15087-00000	12-0011-00	FORTAL. A LA PRODUCCION LECHERA COM. PTO. GARCIA 3RA. SEC. G. CH.	362.824,00	5.324,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
41	906-00118-00000	12-0016-00	IMPLEM. Y CAPACITACION DE PROD. HORTICOLA VILLAMONTES	1.234.122,00	1.234.122,00	284.998,52	23,09%	25,00%	EN EJECUCION
42			APOYO SECTOR PRODUCTIVO OLEAGINOSO COM- CAIGUA - TAHIGUATY FASE I	0,00	450.450,00	0,00	0,00%	0,00%	NUEVO
43	906-00138-00000	12-0083-00	IMPLEM. PRESA CAIGUA FASE II VILLA MONTES	279.224,00	529.224,00	75.529,65	14,27%	15,00%	EN EJECUCION
44	906-15310-00000	12-0091-00	FORTAL. AL DESARROLLO DE LA PRODUCCION APICOLA VILLA MONTES	2.198.990,00	2.114.990,00	201.495,86	9,53%	10,00%	EN EJECUCION
45	906-17866-00000	12-0098-00	EQUIP. CON GEOMEMBRANA P/OBTIMIZACION ALMACENAMIENTO DE AGUA VILLA MONTES FASE 2	2.374.359,00	836.733,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
46	906-00117-00000	12-0233-00	IMPLEM. NUEVAS TEC. P/LA PRODUC. CITRICOLA DIST. 6 V.MONTE	659.106,00	939.106,00	106.837,75	11,38%	15,00%	EN EJECUCION
47	906-00127-00000	12-0234-00	FORTAL. MECANIZACION AGROPECUARIO VILLAMONTES	5.303.401,00	5.303.401,00	549.845,99	10,37%	12,00%	EN EJECUCION
48	906-00135-00000	12-0235-00	APOYO SECTOR PECUARIO REGION AUTONOMA VILLAMONTES	2.901.447,00	3.609.847,00	470.926,40	13,05%	15,00%	EN EJECUCION
49	356-15020-00000	12-0285-00	CONST. E IMPLEMENT. DE UN CENTRO PARA LA TRANSF. MADERA	6.017.750,00	7.517.750,00	1.765.296,38	23,48%	25,00%	EN EJECUCION
50	356-15040-00000	12-0291-00	IMPLEM. PROGRAMA DE MAIZ C/ENFOQUE CADENA DE VALOR VILL	1.023.658,00	1.023.658,00	175.811,74	17,17%	20,00%	EN EJECUCION
51	906-15284-00000	12-0404-00	IMPLEM. TECNOLOGIA PARA PRODCCION CAÑA DE AZUCAR ZONA PIE DE MONTE Y TRANSICIÓN VILLA MONTES	1.921.061,00	1.499.737,00	569.036,09	37,94%	40,00%	EN EJECUCION
52	906-15300-00000	12-0405-00	IMPLEM. ESTRATEGIAS REDUCC. DE PERDIDAS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS VILLA MONTES	3.213.983,00	2.970.583,00	117.698,17	3,96%	5,00%	EN EJECUCION
53	906-17201-00000	12-0425-00	INVEST. Y TRANSF. TECNOLOGICA PECUARIA VILLA MONTES	1.885.991,00	1.885.991,00	421.210,52	22,33%	25,00%	EN EJECUCION

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
4			PROVISA	14.736.568,00	16.972.587,00	1.269.764,06	7,48%		
0			PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4			INVERSION	14.736.568,00	16.972.587,00	1.269.764,06	7,48%		
1			RECUP. DEL CAUCE DEL RIO PILCOMAYO PROVINCIA GRAN CHACO	0,00	4.824.019,00	174.562,37	3,62%	38,00%	EN EJECUCION
2	906-00936-00000	12 0390 000	CONST. MODULO INICIAL RIEGO MARGEN DERECHA RIO PILCOMAYO	2.000.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
3	906-17825-00000	12 0461 000	DESAR. AGROP. INTEG. AREA DE IFLUENCIA MOD. INIC. PROVISA MARG. DER. RIO PILCOMAYO	6.531.480,00	7.653.480,00	359.791,30	4,70%	12,00%	EN EJECUCION
4	906-17826-00000	12 0462 000	IMPLEM. DE TEC. P/ALMACENAM. AGUA DE LLUVIA P/CONSUMO ANIMAL Y PROD. DE FORRAJE LLANURA CHAQUEA	6.205.088,00	4.475.088,00	735.410,39	16,43%	13,00%	EN EJECUCION
18			SERVICIO DPTAL DE CAMINOS SEDECA VILLA MONTES	67.075.319,00	88.189.075,73	21.399.894,96	24,27%		
11			PREINVERSION	2.995.425,00	7.565.027,90	239.200,00	3,16%		
1	906-00922-00000	43 161 000	CONST. PAVIMENTADO RUTA F011 - ESMERALDA	384.846,00	478.400,00	239.200,00	50,00%	80,00%	EN EJECUCION
2	906-01512-00000	43 162 000	MEJ. CAMINO RUTA F011 - AEROPUERTO RAFAEL PAVON	65.218,00	65.218,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
3	906-15184-00000	43 167 000	CONST. CAMINO RUTA FO11-TARINGUITY	60.317,00	60.317,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
4	906-15185-00000	43 167 000	CONST. CAMINO RUTA F009-PALMAR ESTACION	90.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
5	906-00910-00000	43 119 000	CONST. CAMINO CRUCE LAS MORAS QUINTIN ORITIZ	200.915,00	251.144,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
6	906-17891-00000	43-0271-00	CONST. CAMINO ASFALTADO LA VERTIENTE-ALAMBRADO V.M	380.540,00	380.540,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
7	906-17871-00000	43-0272-00	CONST. CAMINO RUTA F 09 YATEBUTE-TIMBOY-CORTADERAL V.M	355.426,00	355.426,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
8	906-17832-00000	43-0283-00	CONST. CAMINO CRUCE RUTA F11-QUEBRADA LOS MONOS-CRUCE RUTA F9 (SAN ANTONIO)	508.673,00	2.085.057,00	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
9	906-17831-00000	43-0285-00	CONST. CAMINO TENTAGUAZU - KUMANDAROTI -SABALO -LA CENTRAL	949.490,00	745.707,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
10			CONST. CAMINO RUTA D658 CRUCE RUTA F11 LA CENTRAL -CRUCE RUTA D631 TIMBOY (TRAMO LA CENTRAL - YUMBIA)	0,00	2.841.169,82	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
11			CONST. PUENTE VEHICULAR LA VERTIENTE VILLA MONTES	0,00	152.049,08	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
7			INVERSION	64.079.894,00	80.624.047,83	21.160.694,96	26,25%		
1	906-15080-00000	43 0001 000	CONST. PUENTES S/QDAS. IMBOCHE Y CAMATINDI - TRAMO LAGUNITAS-IPA-PIRITI	3.908.172,00	3.908.172,00	2.929.225,10	74,95%	90,00%	EN EJECUCION
2	906-15079-00000	43 0004 000	CONST. PUENTE S/QDA. CAMATINDI-TR. RUTA 9 - TIGUIPA	2.033.591,00	2.033.591,00	1.612.523,27	79,29%	99,00%	EN EJECUCION
3	906-00126-00000	43 0014 000	CONST. MEJ. CAMINO TIGUIPA CAPIRENDIA	22.274.923,00	22.274.923,00	919.091,92	4,13%	3,00%	EN EJECUCION
4	906-00128-00000	43 0105 000	MEJ. CAMINO RUTA 9 CHIMEO-CAIGUA-TAHIGUATI	200.002,00	200.002,00	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
5	906-15095-00000	43 0163 000	CONST. CAMINO V.M. - JOSELINO VISCACHERAL (CAPIRENDITA-VISCACHERAL)	18.145.405,00	18.145.405,00	7.253.567,88	39,97%	41,00%	EN EJECUCION
6			CONST. ASF.CAMINO VECINAL RUTA 9 TAHIGUATY	0,00	16.544.153,83	0,00	0,00%	22,00%	POR LICITAR
7	356-14650-00000	43 0140 000	MEJ. CAMINO CAPIRENDIA - GALPONES - LAS CARPAS	17.517.801,00	17.517.801,00	8.446.286,79	48,22%	37,00%	EN EJECUCION

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
			B.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	945.498.521,00	967.609.951,00	291.347.867,69	30,11%		
			a.- TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	430.568.962,00	430.568.962,00	184.181.691,20	0,43		
		7,7,5,30	PROYECTOS CONCURRENTES	103.449.276	103.449.276	53.269.104	51,5%		
		7.7.5.30	MUNICIPIO TARIJA	14.260.091	79.271.699	40.769.104,39	51,43%		
		7.7.5.30	MUNICIPIO PADCAYA	8.133.130	0	0,00	0,00%		
		7.7.5.30	MUNICIPIO BERMEJO	10.073.157	0	0,00	0,00%		
		7.7.5.30	MUNICIPIO URIONDO	10.576.188	0	0,00	0,00%		
		7.7.5.30	MUNICIPIO YUNCHARA	9.465.618	0	0,00	0,00%		
		7.7.5.30	MUNICIPIO SAN LORENZO	728.302	728.302	0,00	0,00%		
		7.7.5.30	MUNICIPIO EL PUENTE	9.252.595	0	0,00	0,00%		
		7.7.5.30	MUNICIPIO ENTRE RIOS	17.510.920,00	0,00	0,00	0,00%		
		7.7.5.30	MUNICIPIO YACUIBA	4.949.275	4.949.275	0,00	0,00%		
		7.7.5.30	MUNICIPIO CARAPARI	12.500.000	12.500.000	12.500.000,00	100,00%		
		7.7.5.30	MUNICIPIO VILLA MONTES	6.000.000	6.000.000	0,00	0,00%		
			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEYES DEL CHACO	327.119.686	327.119.686	130.912.587	40,0%		
			-MUNICIPIO PROVINCIA G.CHACO (YACUIBA) 1RA.SECC.	107.680.697	107.680.697	69.091.376	64,2%		
		7.7.5.30	TRANSF.MUNICIPIO YACUIBA 20% SALUD Y EDUC.(Ley 3038)	54.000.000	54.000.000	39.091.375,00	72,39%		
		7.7.5.31	TRANSF.MUNIC.YACUIBA 10% DES.PRODUC. AGROP..(Ley 3861)	35.500.000	35.500.000	20.000.000,62	56,34%		
		7.7.5.32	-PROGRAMA SOCIAL DE VIVIENDA YACUIBA (LEY 3385)	18.180.697	18.180.697	10.000.000,00	55,00%		
			-MUNICIPIO PROVINCIA G.CHACO (CARAPARI)2DA.SECC.	109.480.697	109.480.697	45.697.297	41,7%		
		7.7.5.30	TRANSF.MUNICIPIO CARAPARI 20% SALUD Y EDUC.(Ley 3038)	54.500.000	54.500.000	25.697.296,89	47,2%		
		7.7.5.31	TRANSF.MUNIC.CARAPARI 10% DES.PRODUC. AGROP..(Ley 3861)	40.000.000	40.000.000	12.000.000,00	30,0%		
		7.7.5.32	-PROGRAMA SOCIAL DE VIVIENDA CARAPARI (LEY 3385)	14.980.697	14.980.697	8.000.000,00	53,4%		
			-MUNICIPIO PROVINCIA G.CHACO (VILLAMONTES) 3RA.SECC.	109.958.292	109.958.292	16.123.914	14,7%		
		7.7.5.30	TRANSF.MUNICIPIO VILLAMONTES 20% SALUD Y EDUC.(Ley 3038)	54.500.000	54.500.000	8.123.914,30	14,91%		
		7.7.5.31	TRANSF.MUNIC.VILLAMONTES 10% DES.PRODUC. AGROP..(Ley 3861)	35.000.000	35.000.000	6.000.000,00	17,14%		
		7.7.5.32	-PROGRAMA SOCIAL DE VIVIENDA VILLAMONTES (LEY 3385)	20.458.292	20.458.292	2.000.000,00	9,78%		
			b.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	514.929.559,00	537.040.989,00	107.166.176,49	19,95%		
		7,3,1	EDUCACION CIVICO PATRIOTICA DS 859	411.245	477.012	178.378	37,4%		
		98 0000 010	EDUCACION CIVICO PATRIOTICA DS 859	411.245,00	477.012,00	178.377,84	37,39%		
		7.1.6.30	FESTIVIDAD DE SAN ROQUE LEY 3132	441.310,00	441.310,00	0,00	0,0%		
		98 0000 011	FESTIVIDAD DE SAN ROQUE LEY 3132	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00%		
		98 0000 012	FESTIVIDAD DE CANTO CUECA Y BAILECITO NILO SORUCO LEY 3383	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%		
		98 0000 013	COMPLEJO CONVENTUAL SAN FRANCISCO LEY 3463	199.510,00	199.510,00	0,00	0,00%		
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.829.533,00	100.139.196,00	46.717.580,52	46,7%		
		7,3,1	73100. Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones	74.132.015,00	83.996.413,00	41.605.259,15	49,5%		
		98 0000 021	TRANF. CTES UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO (IEHD 41-117)	6.892.611,00	6.892.611,00	3.345.171,73	48,53%		
			TRANSF. CTES.p/Subs.y Subv. (Masa Salarial) 731	134.629,00	134.629,00	0,00	0,00%		
		98 0000 022	BONO DE VACUNACION-ESCALAFON AL MERITO	3.689.239,00	3.689.239,00	0,00	0,00%		
		98 0000 026	PREDIARIOS	1.729.325,00	1.729.325,00	36.255,99	2,10%		
		98 0000 032	RENTA DIGNIDAD	61.686.211,00	71.550.609,00	38.223.831,43	53,42%		

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
		7,3,2	73200. Transf.Corr a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. Púb Desc.,Ent. d/Ctrol. Def y Uni p/ Sub. Subv	6.565.832,00	9.011.097,00	3.787.706,00	42,0%		
		98 0000 031	281 1 OFICINA TECNICA DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO	2.756.252,00	2.756.252,00	1.378.126,00	50,00%		
		98.0000.31	Transf.Ctes. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst.	3.609.580,00	0,00	0,00	0,00%		
		98 0000 049	ENTIDAD EJECUTORA MEDIO AMBIENTE Y AGUA EMAGUA	200.000,00	2.001.265,00	200.000,00	9,99%		
		98.0000.31	145 10 TRANSF.-UAJMS BECAS UNIVERSITARIAS YACUIBA	0,00	853.600,00	853.600,00	100,00%		
		98.0000.31	145 11 TRANSF.-UAJMS BECAS UNIVERSITARIAS CARAPARI	0,00	1.999.980,00	1.355.980,00	67,80%		
		98.0000.31	TRANSF.-UAJMS BECAS UNIVERSITARIAS VILLA MONTES	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00%		
		7,1,6,30	71630. Otros de Carácter Social Establecidos por Norma Legal	7.131.686,00	7.131.686,00	1.324.615,37	18,6%		
		98 0000 034	1 5 CASA DE LA CULTURA Y CASA DORADA	1.150.000,00	1.150.000,00	626.868,00	54,51%		
		98 0000 035	0 1 OBSERVATORIO SANTA ANA	412.281,00	412.281,00	0,00	0,00%		
		98 0000 036	0 1 COMITE DE VIGILANCIA DE PERSONAS DISCAPACITADAS	2.000.000,00	2.000.000,00	694.047,37	34,70%		
		98 0000 037	0 1 CENTRO DE REHABILITACION Y CAPAC. P/CIEGOS-CERECI	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00%		
		98 0000 038	0 1 MUSEO NACIONAL PALEONTOLOGICO ARQUEOLOGICO	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00%		
			FEXPOCHACO	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		98 0000 017	FESTIVAL DE LA FRONTERA FESTIFRONT	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%		
		98 0000 015	HOMENAJE A ALA OBRA POETICA OSCAR ALFARO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%		
			1 5 TRANSFERENCIAS POR LEY (ADM. CENTRAL)	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		98 0000 039	12 22 TRANSFERENCIAS POR LEY BERMEJO	508.405,00	508.405,00	0,00	0,00%		
		98 0000 039	15 25 TRANSFERENCIAS POR LEY VILLA MONTES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%		
		98 0000 039	7 17 TRANSFERENCIAS POR LEY MENDEZ	200.000,00	200.000,00	3.700,00	1,85%		
		98 0000 039	9 19 TRANSFERENCIAS POR LEY O'CONNOR	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%		
			73420. Transf.Corr a ,Inst. Púb Desc.,Ent. d/Munic. Villa Montes p/ Sub. Subv Emergencia Rio Pilcomayo	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			TRANF. MUNICIPIO VILLA MOTES P/EMERGENCIA RIO PILCOMAYO	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	426.247.471,00	435.983.471,00	60.270.218,13	13,8%		
			Otras Transf.de Cap..p/Subs.y Subv. Municipios	0	0	0	0,0%		
			Otras	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Transf.de Cap.Org.Ejec.del Est.Plurinac.p/Subs.y Subv.	2.473.748	2.473.748	0	0,00%		
		7,7,1	47 1 SENASAG	2.473.748	2.473.748	0,00	0,00%		
			Transf.de Cap.Org.Leg.Jud.y Elect.del Est.Plurinac.Inst.Pub.Descent.p/Subs.y Subv.	2.500.000	12.236.000	7.700.000	62,93%		
		7,7,2	INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (INRA) DPTAL	2.500.000	500.000	0,00	0,00%		
		7,7,2	INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (INRA) VILLA MONTES	0	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%		
		7,7,2	INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (INRA) YAC	0	10.536.000,00	6.500.000,00	61,69%		
			ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (ABC)	0	200.000,00	200.000,00	100,00%		
		7,7,1	UNIVERSIDAD A.J.M.S. LEY Nº 3686	0	0,00	0,00	0,00%		
			Otras Transf.de Cap..p/Subs.y Subv. Municipios	0	0	0	0,0%		
			Otras	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			TRANSF. DE CAPITAL A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (carácter económico – productivo)	413.273.723	413.273.723	49.128.826	11,89%		
		98 0000 042	PROGRAMA SOLIDARIO DE APOYO A LA PRODUCCION PROSOL LEY 3741	229.546.329	229.546.329	0,00	0,00%		
		98 0000 042	- PROG.SOLIDARIO DE APOYO PRODUCT. PROSOL YACUIBA LEY 3741	31.941.000	31.941.000	0,00	0,00%		

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
		98 0000 042	- PROG.SOLIDARIO DE APOYO PRODUCT. PROSOL CARAPARI LEY 3741	18.000.000	18.000.000	0,00	0,00%		
		98 0000 042	- PROG.SOLIDARIO DE APOYO PRODUCT. PROSOL VILLA MONTES LEY 3741	23.000.000	23.000.000	0,00	0,00%		
		98 0000 044	-FONDO ROTATORIO FOMENTO PRODUC.REG.YACUIBA LEY-3384	36.928.798	36.928.798	15.232.432,30	41,25%		
		98 0000 044	-FONDO ROTATORIO FOMENTO PRODUC.REG.CARAPARI LEY-3384	36.928.798	36.928.798	12.119.421,77	32,82%		
		98 0000 044	-FONDO ROTATORIO FOMENTO PRODUC.REG.VILLAMONTES LEY-3384	36.928.798	36.928.798	21.776.971,76	58,97%		
		7.5.2.20	TRANSF. DE CAPITAL A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (cA Instituciones Privadas sin Fines de Lucro)	8.000.000	8.000.000	3.441.392	43,02%		
		98 0000 047	FONDO INTEGRAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD LEY 3691	8.000.000	8.000.000,00	3.441.392,30	43,02%		

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
			C.- GASTO CORRIENTE	481.569.697,00	525.097.004,36	171.910.857,43	32,74%		
		00.00.01	a. GASTO DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL	185.225.366	231.482.469	76.977.613	33,25%		
		00 0000 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	68.474.970	110.610.475	35.209.968,24	31,83%		
			REPRESENTACION LA PAZ	1.483.802	1.508.038	494.745,08	32,81%		
		00 0000 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL YACUIBA	26.353.825	28.011.487	11.610.749,07	41,45%		
		00 0000 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL CARAPARI	29.241.655	29.288.125	7.927.689,08	27,07%		
		00 0000 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL BERMEJO	6.633.726	9.372.239	2.926.901,12	31,23%		
		00 0000 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL YUNCHARA	3.195.187	3.265.187	1.064.664,52	32,61%		
		00 0000 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL EL PUENTE	4.295.007	4.295.007	1.473.337,21	34,30%		
		00 0000 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL VILLA MONTES	23.834.358	22.960.101	8.074.587,39	35,17%		
		5 15	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL CERCADO	5.482.642	5.667.748	2.015.937,09	35,57%		
		6 16	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL PADCAYA	4.266.104	4.224.472	1.388.913,19	32,88%		
		7 17	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SAN LORENZO	2.959.025	3.059.025	1.121.127,11	36,65%		
		00 0000 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL URIONDO	3.990.526	4.106.026	1.927.252,88	46,94%		
		00 0000 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL O'CONNOR	5.014.539	5.114.539	1.741.740,87	34,05%		
			b. GASTO DE FUNCIONAMIENTO UNIDADES DESCONCENTRADAS	157.943.711	155.213.915	46.281.312	29,82%		
		01.0000.01	FUNCIONAMIENTO ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL	30.954.025	31.252.375	10.999.289,72	35,20%		
		02.0000.01	FUNCIONAMIENTO ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO	13.538.771	13.538.771	3.984.201,64	29,43%		
		12 0000 002	PROVISA	7.746.647	7.746.647	1.377.867,24	17,79%		
		12 0000 003	CEVITA	4.670.911	4.560.911	938.381,07	20,57%		
		10 0000 001	PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT	2.675.087	2.709.087	1.314.229,54	48,51%		
		12 0000 005	SAN JACINTO	9.279.137	9.829.137	1.500.903,52	15,27%		
		12 0000 006	FODEPRO	1.384.300	919.063	178.660,20	19,44%		
		12 0000 007	GNV	3.333.077	3.333.077	1.258.128,62	37,75%		
		12 0000 010	PLAN DE EMPLEO URGENTE YACUIBA	1.093.107	727.107	231.126,03	31,79%		
		12 0000 010	PLAN DE EMPLEO URGENTE VILLA MONTES	0	1.057.900	351.264,49	33,20%		
		16 0000 001	COORDINACION CON AUTONOMIAS MUNICIPALES	1.241.245	1.241.245	424.793,73	34,22%		
		40 0000 001	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	3.298.568	3.498.568	1.132.190,70	32,36%		
		41 0000 001	INSTITUTO CONTABILIDAD SUPERIOR TARIJA (INCOS)	90.000	90.000	13.998,20	15,55%		
		41 0000 002	TECNOLOGICO TARIJA	120.000	120.000	33.991,18	28,33%		
			BANCO DE SANGRE DPTAL	0	117.030	23.450	20,04%		
		96 0000 001	PREVISIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.801.265	0	0	0,00%		
		96 0000 001	PREVISIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.801.265	0	0,00	0,00%		
			PROGRMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	14.842.585	11.683.308	2.744.789	23,49%		
		95 0000 001	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SRIA. DEPTAL. DE JUSTICIA Y SEGURIDAD)	8.796.671	8.896.671	2.064.762,04	23,21%		
		95 0000 001	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (YACUIBA)	8.000	8.000	0,00	0,00%		
		95 0000 001	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CARAPARI)	102.000	102.000	0,00	0,00%		
		95 0000 001	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (BERMEJO)	292.000	792.000	190.168,40	24,01%		
		95 0000 001	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (YUNCHARA)	300.000	300.000	85.185,71	28,40%		
		95 0000 001	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (EL PUENTE)	447.709	447.709	77.897,20	17,40%		
		95 0000 001	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CERCADO)	86.750	86.750	0,00	0,00%		
		95 0000 001	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (PADCAYA)	225.800	225.800	32.748,01	14,50%		
		95 0000 001	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SAN LORENZO)	292.000	353.775	128.632,78	36,36%		
		95 0000 001	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (AVILES)	4.091.052	270.000	65.864,50	24,39%		
		95 0000 001	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (O'CONNOR)	200.603	200.603	99.530,03	49,62%		

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
			CODEFAUNA	4.175.972	4.055.761	1.033.894	25,49%		
		12.00.01	CODEFAUNA TARIJA	1.465.250	1.465.250	448.758,39	30,63%		
		12 0000 001	CODEFAUNA YACUIBA	521.979	521.979	92.552,81	17,73%		
		12 0000 001	CODEFAUNA VILLA MONTES	1.561.602	1.441.391	382.820,02	26,56%		
		12.00.01	CODEFAUNA PADCAYA	419.036	419.036	62.418,81	14,90%		
		12.00.01	CODEFAUNA O'CONNOR	100.195	100.195	13.680,00	13,65%		
		12 0000 001	CODEFAUNA BERMEJO	107.910	107.910	33.663,74	31,20%		
			SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO - SEDAG	18.483.789	18.808.235	4.518.677	24,02%		
		12 0000 004	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO - SEDAG VILLA MONTES	2.789.751	3.044.427	1.008.989,02	33,14%		
		12 0000 004	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO - SEDAG CARAPARI	4.085.837	4.085.837	818.576,73	20,03%		
		12 0000 004	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO - SEDAG YACUIBA	4.045.738	4.015.508	905.857,63	22,56%		
		12.00.04	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG O'CONNOR	151.543	251.543	55.896,83	22,22%		
		12 0000 004	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG CENTRAL	7.410.920	7.410.920	1.729.356,65	23,34%		
			UNIDAD DEL PROSOL	5.968.199	6.135.370	951.715	15,51%		
		12 0000 008	UNIDAD DEL PROSOL YACUIBA	1.470.442	1.390.442	208.903,65	15,02%		
		12.00.08	UNIDAD DEL PROSOL VILLAMONTES	0	647.171	103.424,02	15,98%		
		12 0000 008	UNIDAD DEL PROSOL DPTAL	4.497.757	4.097.757	639.387,44	15,60%		
			COMITÉ DE DESARROLLO	1.400.725	1.392.025	179.370	12,89%		
		12.00.09	COMITÉ DE DESARROLLO O'CONNOR	187.324	178.624	34.580,23	19,36%		
		12.00.09	COMITÉ DE DESARROLLO CERCADO	182.697	182.697	16.171,85	8,85%		
		12.00.09	COMITÉ DE DESARROLLO PADCAYA	81.118	81.118	9.455,43	11,66%		
		12.00.09	COMITÉ DE DESARROLLO AVILES	159.267	159.267	10.639,06	6,68%		
		12 0000 009	COMITÉ DE DESARROLLO BJO	229.930	229.930	59.838,40	26,02%		
		12 0000 009	COMITÉ DE DESARROLLO YUNCHARA	148.941	148.941	4.125,00	2,77%		
		12.00.09	COMITÉ DE DESARROLLO EL PUENTE	182.740	182.740	27.290,14	14,93%		
		12.00.09	COMITÉ DE DESARROLLO SAN LORENZO	228.708	228.708	17.269,92	7,55%		
			GOBERNABILIDAD CIUDADANA	1.739.497	1.602.497	308.005	19,22%		
		16.00.03	GOBERNABILIDAD CIUDADANA CENTRAL	524.897	524.897	116.067,36	22,11%		
		16 0000 003	GOBERNABILIDAD CIUDADANA YACUIBA	530.700	393.700	39.711,47	10,09%		
		16.00.03	GOBERNABILIDAD CIUDADANA VILLA MONTES	683.900	683.900	152.225,72	22,26%		
			APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	4.593.728	4.544.123	1.466.212	32,27%		
		42 0000 001	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL YACUIBA	1.054.533	816.733	254.196,83	31,12%		
		42.00.01	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL VILLA MONTES	1.193.971	1.382.166	443.963,65	32,12%		
		42.00.01	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	2.345.224	2.345.224	768.051,29	32,75%		
			SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINO SEDECA	19.147.791	20.078.281	10.118.402	50,39%		
		43 0000 001	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINO SEDECA CARAPARI	2.388.456	2.388.456	771.752,23	32,31%		
		43 0000 001	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINO SEDECA YACUIBA	2.645.016	2.875.246	626.331,34	21,78%		
		43 0000 001	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINO SEDECA VILLA MONTES	3.814.367	4.514.627	1.529.857,69	33,89%		
		43 0000 001	SERV. DPTAL. CAMINOS 15%	10.299.952	10.299.952	7.190.460,58	69,81%		
			SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE	6.365.285	6.173.397	1.197.774	19,40%		
		44 0000 002	SERVICIO DEPARTAMENTAL DEPORTE CERCADO 15% (YACUIBA)	1.129.738	1.067.876	253.932,05	23,78%		

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
		44 0000 016	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES (CARAPARI)	308.563	308.563	0,00	0,00%		
		44 0000 004	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DEPORTE 15% VILLA MONTES	1.607.205	1.537.179	223.160,01	14,52%		
		44 0000 004	PROG DPTAL DEPORTE 15% CENTRAL	3.100.579	2.862.479	668.277,72	23,35%		
		44 0000 004	PROG DPTAL DEPORTE 15% BERMEJO	0	178.100	52.403,95	29,42%		
		44 0000 016	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	219.200	219.200	0,00	0,00%		
			c.- TRANSFERENCIAS DEL TGN	138.400.620	138.400.620	48.651.932	35,15%		
			SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	135.134.345	135.134.345	47.660.373	35,27%		
			APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	132.075.947	132.075.947	46.734.408,13	35,38%		
			SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - TGN	3.058.398	3.058.398	925.965,07	30,28%		
		42002	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	3.266.275	3.266.275	991.559,17	30,36%		
		41111	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL - TGN	3.266.275	3.266.275	991.559,17	30,36%		

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
			D.- PROGRAMAS	423.313.653,00	457.444.620,64	110.840.338,89	24,23%		
3			SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	1.711.350,00	1.711.350,00	42.771,37	2,50%		
1		10 0000 071	SENSIBILIZACION SOBRE GESTION DE RIESGOS DEPTO DE TARIJA	253.350,00	253.350,00	37.271,37	14,71%		
2		10 0000 084	PREVENSION DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	464.897,00	464.897,00	5.500,00	1,18%		
3		10 0000 085	PREVENSION RIADAS ESTACIONALES EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	993.103,00	993.103,00	0,00	0,00%		
11			SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMPESINO	4.122.625,00	3.456.625,00	612.841,98	17,73%		
1		10 0000 090	PROGRAMA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1.301.483,00	1.301.483,00	206.951,72	15,90%		
2		12 0000 080	EXPORTAR	747.000,00	477.000,00	101.145,49	21,20%		
3		13 0000 070	FOMENTO AL DESARROLLO TURISTICO DEPARTAMENTO DE TARIJA	360.000,00	360.000,00	34.300,00	9,53%		
4		13 0000 074	USOS Y COSTUMBRES DEL SUR DE BOLIVIA- DPTO. DE TARIJA	180.000,00	176.000,00	0,00	0,00%		
5		13 0000 076	PROMOCION DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL DPTO. TARIJA	180.000,00	80.000,00	24.180,00	30,23%		
6		13 0000 082	FORTALECIMIENTO A LA CADEMA PRODUCTIVA DE TURISMO	90.000,00	94.000,00	57.000,00	60,64%		
7		23 0000 070	FERIAS ESPECIALIZADAS	558.142,00	558.142,00	86.033,75	15,41%		
8		23 0000 073	MISIONES EMPRESARIALES	315.000,00	315.000,00	103.231,02	32,77%		
9		23 0000 076	PROGRAMA FERIA DEPARTAMENTA CAMPESINA AGRICOLA GANADERA ARTESANAL Y CULTURAL DE TARIJA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%		
10		24 0000 070	PROGR. FORTALECIMIENTO MECANIZACION AGRICOLA	171.000,00	0,00	0,00	0,00%		
11		41 0000 081	PROG DPTAL APOYO COMUNIDADES PRODUCTIVAS	180.000,00	55.000,00	0,00	0,00%		
1			DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS	445.050,00	445.050,00	41.621,76	9,35%		
1		24 0000 073	PLAN ACCESO Y MANEJO DEL AGUA EN COMUNIDADES INDIGENAS	445.050,00	445.050,00	41.621,76	9,35%		
1			SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	0,00	2.301.692,00	0,00	0,00%		
1		95 0000 090	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADAMA (ADICIONALES)	0,00	2.301.692,00	0,00	0,00%		
1			SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTUR	2.156.679,00	1.987.435,00	603.104,00	30,35%		
1		13 0000 071	FORTALEC. Y PROMOCION A LA CULTURA EN EL DPTO. DE TARIJA	1.526.679,00	1.526.679,00	479.616,00	31,42%		
2		13 0000 076	PROMOCION DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL DPTO. TARIJA	180.000,00	10.756,00	0,00	0,00%		
3		13 0000 083	PROTECCION Y CONSERVACION AL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL DPTO.TARIJA	450.000,00	450.000,00	123.488,00	27,44%		
2			SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL	829.679,00	1.215.574,00	192.892,44	15,87%		
1		19 0000 090	PROG DEPTAL DE FORMACION DE LIDERES COMUNITARIOS POR TARIJA	487.679,00	775.574,00	130.928,46	16,88%		
2		41 0000 070	ESCUELA DE GESTION PUBLICA DE TARIJA	342.000,00	440.000,00	61.963,98	14,08%		
			ADMINISTRACION CENTRAL	9.265.383,00	11.117.726,00	1.493.231,55	13,43%		
27			GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION GRAN CHACO YACUIBA	43.381.301,00	66.714.294,00	11.453.154,30	17,17%		
1		10 0000 072	PLAN DE PREVENCION Y MITIG.DESASTRES NAT.1RA SECC.PROV.G.CHACO	4.583.000,00	4.583.000,00	1.543.302,56	33,67%		
2		10 0000 073	PLAN DE PREVENCION Y MITIG INCENDIOS FORESTALES 1RA SECC.PROV.G.CHACO	383.000,00	383.000,00	40.195,00	10,49%		
3		12 0000 073	ACCESO A FERIAS PRODUCTIVAS 1RA. SECCION PROV. G. CHACO	1.000.000,00	1.000.000,00	33.865,00	3,39%		
4		12 0000 074	FOM.INICIATIV.PRODUC.PUEBLOS GUARANI 1RA SECC.PROV.G.CHACO	950.000,00	950.000,00	220.446,00	23,20%		
5		12 0000 075	FOM.INICIATIV.PRODUC.PUEBLOS WHENHAYEK 1RA SECC.PROV.G.CHACO	950.000,00	950.000,00	261.593,29	27,54%		
6		12 0000 076	FEICHACO	3.329.711,00	3.329.711,00	3.518,55	0,11%		
7		13 0000 073	CONSOLIDACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES DE LA 1RA. SECCION PROV. G. CHACO	1.700.000,00	2.537.400,00	1.115.973,00	43,98%		
8		13 0000 075	FOMENTO AL DESTINO TURISTICO-YACUIBA	1.000.000,00	1.000.000,00	291.487,50	29,15%		
9		13 0000 089	CAPACITACION TECNICA Y GERENCIAL PARA UNIDADES PRODUCTIVAS 1RA. SECCION G. CHACO	1.216.490,00	1.216.490,00	170.921,90	14,05%		
10		16 0000 080	CAPACITACION EN DEMOCRACIA DESCENTRALIZACION Y AUTONOMIAS-YACUIBA	550.000,00	550.000,00	127.545,50	23,19%		
11		18 0000 092	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA YACUIBA	4.316.651,00	3.903.247,00	943.685,76	24,18%		
12		19 0000 082	MUJERES EJERCENDO EL LIDERAZAGO	565.995,00	565.995,00	69.426,00	12,27%		
13		19 0000 083	MUJERES Y EMPODERAMIENTO ECONOMICO PRODUCTIVO 1º SECCION GRAN CHACO	250.000,00	250.000,00	28.058,65	11,22%		

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
14		19 0000 084	PROMOCION LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA MUJER 1RA SECC.G.CHACO	446.683,00	446.683,00	115.833,00	25,93%		
15		20 0000 080	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00%		
16		24 0000 072	FORTALECIMIENTO AL MANEJO SANITARIO DE ANIMALES MAYORES Y MENORES DE LA 1ª SECCION G. CHACO	1.400.000,00	1.400.000,00	201.470,00	14,39%		
17		24 0000 082	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO AGROPECUARIO EN COMUNIDADES 1ª SECC. GRAN CHACO	1.400.000,00	1.400.000,00	150.825,00	10,77%		
18		40 0000 041	PROGRAMA FORTALECIMIENTO HUMANO EN LAS REDES DE SALUD	0,00	5.963.640,00	2.099.272,73	35,20%		
19		40 0000 042	PRO.PROM.Y PREVENION DE ENFERMEDADES BUCODENTALES 1RA SECC.G.CHACO	743.620,00	722.620,00	177.409,13	24,55%		
20		40 0000 043	PRO.PROM.Y PREVENION DE ENFERMEDADES PREVALENTES 1RA SECC.G.CHACO	2.440.082,00	2.288.582,00	505.133,72	22,07%		
21		40 0000 044	PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD MATERNO INFANTIL-YACUIBA	1.159.754,00	999.754,00	201.210,44	20,13%		
22		40 0000 080	PROGRAMA NUTRICIONAL INTEGRAL- YACUIBA	4.654.486,00	4.596.836,00	144.507,00	3,14%		
23		40 0000 093	SEGURO UNIVERSAL DE SALUD - SUSAT	4.997.505,00	4.997.505,00	414.314,48	8,29%		
24		41 0000 071	PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACION DISTRITO YACUIBA	258.800,00	258.800,00	52.421,00	20,26%		
25		42 0000 080	PROGRAMA SERVICIO DE GESTION SOCIAL CARAPARI	5.085.524,00	4.685.524,00	1.359.948,59	29,02%		
26		42 0000 085	PROGRAMA INTEGRAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 1ª SECCION GRAN CHACO YACUIBA	0,00	8.820.000,00	0,00	0,00%		
27		44 0000 041	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	0,00	6.415.507,00	1.180.790,50	18,41%		
1			UNIDAD PLAN EMPLEO URGENTE PEU	6.575.000,00	7.844.000,00	6.448.800,00	82,21%		
1		12 0000 084	PLAN EMPLEO URGENTE DEPARTAMENTAL	6.575.000,00	7.844.000,00	6.448.800,00	82,21%		
1			SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	5.654.167,00	5.654.167,00	372.185,05	6,58%		
1		43 0000 041	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA	5.654.167,00	5.654.167,00	372.185,05	6,58%		
			TOTAL - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION GRAN CHACO - YACUIBA	55.610.468,00	80.212.461,00	18.274.139,35	22,78%		
24			GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PROVINCIA GRAN CHACO - CARAPARI	36.096.454,00	45.041.776,00	8.534.191,71	18,95%		
1		10.00.75	EDUCACION Y CAPAC.AMBIENTAL EN LA 2DA SECC. PROV. G.CHACO	1.800.000,00	1.595.000,00	86.926,05	5,45%		
2		10.00.77	PREVENION Y ATENCION PRO FENOMENOS NAT.2DA.SECC.G.CHACO	1.000.000,00	9.076.523,00	168.425,60	1,86%		
3		10.00.80	PROGRAMA PISCICOLA DISTRITO N°5 2DA SECC. GRAN CHACO	1.000.000,00	655.000,00	154.088,05	23,52%		
4		12.00.82	APOYO Y CAPAC. A LOS AGRICULTORES 2DA SECC. CARAPARI	2.500.000,00	2.988.000,00	1.364.251,86	45,66%		
5		12.00.85	MANEJO DE SISTEMA DE CRIANZA DE GANADO PORCINO EN 6 DISTRITOS	2.000.000,00	1.719.465,00	566.405,61	32,94%		
6		12.00.86	SANIDAD ANIMAL GANADO MAYOR-MENOR 2DA SECC. G.CHACO	2.000.000,00	1.845.000,00	589.072,14	31,93%		
7		12.00.87	MEJ.SIST.DE CRIANZA GANADO BOVINO 2DA SECCION	2.300.000,00	2.124.677,00	149.869,23	7,05%		
8		12.00.89	IMPL.Y CONSERVACION DE FORRAJES EN LA 2DA SECCION CARAPARI	1.000.000,00	1.068.535,00	273.303,46	25,58%		
9		13.00.77	PROG. REGIONAL PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE LA 2DA SECCION G. CH.	1.000.000,00	1.000.000,00	173.614,84	17,36%		
10		13.00.78	REVALORIZ.CULTURAL EN COMUNIDAD AREA RURAL Y P.INDIGE.CARAPARI	1.100.000,00	986.000,00	100.300,60	10,17%		
11		13.00.84	PRESERVACION Y DIFUSION DE LA PRODUCCION Y CULTURA GUARANI EN CARAPARI	1.100.000,00	1.037.750,00	271.395,10	26,15%		
12		16.00.81	GOBERNABILIDAD 2DA SECCION PROV. GRAN CHACO	1.000.000,00	800.000,00	326.025,00	40,75%		
13		18.00.94	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA CARAPARI	2.296.454,00	2.296.454,00	470.898,18	20,51%		
14		19.00.81	PROGRAMA DE ASISTENCIA Y CAPACITACION ACTIVA PARA PERSONAS CON INVALIDEZ EN CARPARI	1.000.000,00	876.000,00	124.190,12	14,18%		
15		23.00.72	APOYO A LOS FESTIVALES Y FERIAS AGROPECUARIAS 2DA SECC.G.CHACO	1.500.000,00	571.000,00	75.011,11	13,14%		
16		23.00.80	FORTALEC.Y PROMOCION A LA CULTURA 2DA SECC.PROV.G.CHACO	2.000.000,00	1.900.000,00	286.769,96	15,09%		
17		24.00.76	FORTALECIMIENTO A LA MECANIZACION DEL AGRO 2DA SECCION CARAPARI	2.000.000,00	242.002,00	216.562,00	89,49%		
18		40.00.41	PROGRAMA FORTALECIMIENTO HUMANO EN LAS REDES DE SALUD	0,00	2.794.529,00	954.854,02	34,17%		
		40 0000 081	PROG. DE APOYO INTEGRAL Y NUTRICIONAL	0,00	800.000,00	34.100,00	4,26%		
19		40.00.82	PLAN NUTRICIONAL NIÑOS EDAD 4- 13 AÑOS	800.000,00	0,00	0,00	0,00%		
20		40.00.93	SEGURO UNIVERSAL DE SALUD - SUSAT	1.500.000,00	1.500.000,00	291.539,32	19,44%		
21		40.00.96	PROGRAMA DE LA REDUCCION DE LA MORTALIDAD MATERNO INFANTIL CARAPARI	1.100.000,00	961.700,00	194.936,70	20,27%		

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
22		42.00.80	PROGRAMA SERVICIO DE GESTION SOCIAL CARAPARI	2.500.000,00	4.763.891,00	796.453,94	16,72%		
23		42.00.81	PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO	1.100.000,00	985.250,00	265.241,28	26,92%		
24		44.00.42	PROGRAMA DE APOYO Y MASIFICACION AL DEPORTE EN 2DA SECCION CARAPARI	2.500.000,00	2.455.000,00	599.957,54	24,44%		
1			UNIDAD PLAN EMPLEO URGENTE PEU	12.013.159,00	7.259.806,00	2.993.066,89	41,23%		
1		12.00.84	PLAN EMPLEO URGENTE DEPARTAMENTAL	12.013.159,00	7.259.806,00	2.993.066,89	41,23%		
			SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG CARAPARI	0,00	1.757.998,00	150.212,41	8,54%		
1		24 0000 076	FORTALECIMIENTO A LA MECANIZACION DEL AGRO 2DA SECCION CARAPARI	0,00	1.757.998,00	150.212,41	8,54%		
1			SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS CARAPARI	5.053.080,00	5.053.080,00	1.373.086,57	27,17%		
1		43.00.41	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA	5.053.080,00	5.053.080,00	1.373.086,57	27,17%		
			TOTAL - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION GRAN CHACO CARAPARI	53.162.693,00	59.112.660,00	13.050.557,58	22,08%		
13			GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL 2º SECCION PROVINCIA ARCE BERMEJO	3.898.154,00	11.298.070,00	2.375.428,56	21,03%		
1		10.00.74	PROTECCION Y CONSERVACION DE RR.NN. Y MEDIO AMBIENTE BERMEJO	223.463,00	366.827,00	76.478,36	20,85%		
2		12.00 .71	APOYO A FERIAS ARTEZANALES Y AGROPECUARIAS 2º SECCION PROVINCIA ARCE	549.000,00	549.000,00	39.867,95	7,26%		
3		12.00.81	PLAN DE EMPLEO URGENTE (MATERIALES)	270.000,00	270.000,00	104.510,00	38,71%		
4		13.00.71	FORTALEC. Y PROMOCION A LA CULTURA EN EL DPTO. DE TARIJA	250.000,00	297.278,00	132.835,13	44,68%		
5		13.00.86	FORTALECIMIENTO A LA CULTURA 2DA SECCION BERMEJO	210.154,00	210.154,00	74.191,07	35,30%		
6		23.00.75	FORTALECIMIENTO A PEQUEÑAS UNIDADES PRODUCTIVAS 2º SECCION PROVINCIA ARCE	769.950,00	769.950,00	22.057,27	2,86%		
7		24.00.74	CONSERVACION Y PRESERVACION DE RR NN BERMEJO	365.587,00	365.587,00	160.425,00	43,88%		
8		24.00.84	PROGRAMA PREVENSION Y ATENCION POR FENOMENOS NATURALES 2 DA SECCION PROV ARCE BERMEJO	360.000,00	580.000,00	177.744,00	30,65%		
9		40 0000 072	PROGRAMA PREVENCION DE ENFERMEDADES OCASIONADAS POR EL CONSUMO DE AGUA NO POTABLE EN LA POBLACION RURAL DE	0,00	1.463.500,00	0,00	0,00%		
10		40 0000 073	PREVENCION Y SALUD BUCAL AREAS URBANA Y RURAL BERMEJO	0,00	590.000,00	167.000,00	28,31%		
11		40.00.85	PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTRAL DEL HANTA VIRUS	270.000,00	2.235.000,00	199.950,00	8,95%		
12		44.00.41	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	0,00	2.600.774,00	604.267,47	23,23%		
13		44.00.44	FORTALECIMIENTO AL DEPORTE 2º SECCION PROV. ARCE BERMEJO	630.000,00	1.000.000,00	616.102,31	61,61%		
6			GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PROVINCIA AVILES YUNCHARA	895.912,00	2.833.337,00	252.703,18	8,92%		
1		10 0000 086	PLAN DE PREVENSION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES YUNCHARA	180.000,00	2.060.000,00	70.571,49	3,43%		
2		12 0000 081	PLAN DE EMPLEO URGENTE (MATERIALES)	270.000,00	270.000,00	13.125,00	4,86%		
3		13 0000 071	FORTALEC. Y PROMOCION A LA CULTURA EN EL DPTO. DE TARIJA	31.500,00	31.500,00	3.550,00	11,27%		
4		13 0000 072	APOYO Y PROMOCION DE LA CULTURA SECCION YUNCHARA	129.262,00	129.262,00	35.839,50	27,73%		
5		23 0000 077	APOYO Y PROMOCION A FERIAS PRODUCTIVAS 2º SECCION PROVINCIA MENDEZ EL PUENTE	285.150,00	142.575,00	46.325,19	32,49%		
6		44 0000 041	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	0,00	200.000,00	83.292,00	41,65%		
5			GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PROVINCIA MENDEZ EL PUENTE	1.721.291,00	2.447.943,00	718.174,80	29,34%		
1		10 0000 081	PREVENSION Y ATENCION DE DESASTRES NATURALES EL PUENTE	885.291,00	1.266.968,00	348.950,00	27,54%		
2		12 0000 081	PLAN DE EMPLEO URGENTE (MATERIALES)	626.000,00	626.000,00	124.806,80	19,94%		
3		13 0000 071	FORTALEC. Y PROMOCION A LA CULTURA EN EL DPTO. DE TARIJA	210.000,00	210.000,00	99.102,00	47,19%		
4		23 0000 077	APOYO Y PROMOCION A FERIAS PRODUCTIVAS 2º SECCION PROVINCIA MENDEZ EL PUENTE	0,00	142.575,00	73.190,00	51,33%		
5		44 0000 041	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	0,00	202.400,00	72.126,00	35,64%		
20			GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL 3º SECCION GRAN CHACO VILLAMONTES	75.876.055,00	45.631.765,00	8.963.732,06	19,64%		
1		10 0000 070	PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DESASTRES NATURALES 3RA. SECCION GRAN CHACO	3.261.400,00	2.778.900,00	118.675,53	4,27%		
2		10 0000 087	EDUCACION AMBIENTAL EN LA 3RA SECCION PROV. GRAN CHACO	613.058,00	715.558,00	125.179,50	17,49%		
3		10 0000 088	APOYO Y PROMOCION A FERIAS PROD. Y AGROPECUARIAS 3RA SECCION PROV. GRAN CHACO	707.472,00	782.472,00	90.500,00	11,57%		

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
4		12 0000 077	APOYO A LA PRODUCCION Y COMERCOALIZ.DE ARTEZANIAS WEENHA	718.180,00	648.180,00	32.000,00	4,94%		
5		12 0000 084	PLAN EMPLEO URGENTE DEPARTAMENTAL - CARAPARI	6.268.340,00	9.818.340,00	2.666.195,00	27,16%		
6		13 0000 079	FORTALECIMIENTO Y PROMOCION A LA CULTURA VILLAMONTES	2.198.160,00	2.198.160,00	604.675,16	27,51%		
7		16 0000 082	PROMOCION DE LA COHESION SOCIAL E INSTITUCIONAL Y CONSTITUCION DE LA AUTONOMIA	637.400,00	637.400,00	119.192,00	18,70%		
8		18 0000 093	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA VILLA MONTES	4.587.203,00	4.637.203,00	1.135.125,19	24,48%		
9		19 0000 085	FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL VILLAMONTES	938.874,00	938.874,00	180.684,26	19,24%		
10		19 0000 088	POR UNA SONRISA SALUDABLE	495.794,00	495.794,00	0,00	0,00%		
11		19 0000 089	FOTALECIMIENTO A PUEBLOS INDIGENAS DE LA 3RA SECCION PROVINCIA GRAN CHACO	856.952,00	856.952,00	140.480,67	16,39%		
12		20 0000 080	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%		
13		23 0000 083	FOMENTO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES ECONOMICAS PRODUCTIVAS Y PYMES DEL AJURISDICCION GEG DE VILLAMONTES	850.472,00	810.472,00	17.800,00	2,20%		
14		40 0000 041	PROGRAMA FORTALECIMIENTO HUMANO EN LAS REDES DE SALUD	38.593.319,00	4.164.029,00	1.489.290,26	35,77%		
15		40 0000 081	PROG. DE APOYO INTEGRAL Y NUTRICIONAL	1.958.530,00	1.958.530,00	38.271,00	1,95%		
16		40 0000 093	SEGURO UNIVERSAL DE SALUD - SUSAT	2.733.150,00	2.733.150,00	526.148,47	19,25%		
17		40 0000 095	PROG. DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD MATERNO E INFANTIL VILLAMONTES	911.963,00	911.963,00	199.696,00	21,90%		
18		42 0000 080	PROGRAMA SERVICIO DE GESTION SOCIAL	2.004.788,00	2.004.788,00	618.441,82	30,85%		
19		42 0000 090	POR UNA MIRADA SALUDABLE	574.000,00	574.000,00	13.616,67	2,37%		
20		44 0000 070	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	6.967.000,00	6.967.000,00	847.760,53	12,17%		
1			UNIDAD DE PLAN EMPLEO URGENTE PEU	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1		12 0000 084	PLAN EMPLEO URGENTE DEPARTAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1			SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG VILLAMONTES	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1		10 0000 088	APOYO Y PROMOCION A FERIAS PROD. Y AGROPECUARIAS 3RA SECCION PROV. GRAN CHACO	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			TOTAL - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION GRAN CHACO VILLAMONTES	75.876.055,00	45.631.765,00	8.963.732,06	19,64%		
1			UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	26.144.000,00	22.644.000,00	822.045,60	3,63%		
1		20 0000 080	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	26.144.000,00	22.644.000,00	822.045,60	3,63%		
10			SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	71.334.135,00	73.644.200,76	20.568.615,29	27,93%		
1		40 0000 041	PROGRAMA FORTALECIMIENTO HUMANO EN LAS REDES DE SALUD	0,00	25.543.180,00	9.347.500,55	36,59%		
2		40 0000 051	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	32.951.732,00	5.600.682,76	2.784.161,99	49,71%		
3		40 0000 052	BANCO DE SANGRE DEPARTAMENTAL DE TARIJA	676.825,00	0,00	0,00	0,00%		
4		40 0000 074	PROG DE LA SALUD Y SALUD FAMILIAR COMUNITARIA E INTERCULTURAL	1.800.000,00	2.048.130,00	346.657,52	16,93%		
5		40 0000 076	PROGRAMA DEPTAL DE PREVISION Y CONTROL DEL CANCER	346.367,00	433.794,00	86.513,50	19,94%		
6		40 0000 081	PROG. DE APOYO INTEGRAL Y NUTRICIONAL	2.656.284,00	2.956.240,00	86.428,78	2,92%		
7		40 0000 093	SEGURO UNIVERSAL DE SALUD - SUSAT	22.032.927,00	25.823.586,00	3.628.720,19	14,05%		
8		40 0000 094	FORTALECIMIENTO HUMANO PARA ESTABLECIMIENTOS DE TERCER NIVEL DEPTO DE TARIJA	10.000.000,00	10.000.000,00	3.866.442,17	38,66%		
9		40 0000 097	PROGRAMA HAMBRE OCULTA CERO	150.000,00	150.000,00	23.638,33	15,76%		
10		42 0000 082	FORTALECIENTO A MEDICINA TRADICIONAL EN EL DEPTO DE TARIJA	720.000,00	1.088.588,00	398.552,26	36,61%		
1			SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	21.061.356,00	21.256.356,00	9.670.226,94	45,49%		
1		42 0000 080	PROGRAMA SERVICIO DE GESTION SOCIAL CARAPARI	21.061.356,00	21.256.356,00	9.670.226,94	45,49%		
1			SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA	23.240.912,00	22.003.022,00	7.720.372,09	35,09%		
1		43 0000 041	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA	23.240.912,00	22.003.022,00	7.720.372,09	35,09%		
1			SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	23.855.760,00	11.901.679,00	3.190.962,43	26,81%		
1		44 0000 041	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	23.855.760,00	11.901.679,00	3.190.962,43	26,81%		
1			SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA VILLAMONTES	13.409.000,00	13.409.000,00	1.935.408,68	14,43%		
1		43 0000 041	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA	13.409.000,00	13.409.000,00	1.935.408,68	14,43%		
1			PLAN EMPLEO URGENTE DEPARTAMENTAL	29.724.008,00	30.131.448,00	14.048.135,08	46,62%		
1		12 0000 084	PLAN DE EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO DEPARTAMENTAL	29.724.008,00	30.131.448,00	14.048.135,08	46,62%		
1			BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	0,00	676.825,00	252.009,32	37,23%		

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
1		40 0000 052	BANCO DE SANGRE DEPARTAMENTAL DE TARIJA	0,00	676.825,00	252.009,32	37,23%		
1			EXPOSUR	3.521.320,00	3.309.643,00	0,00	0,00%		
1		12 0000 090	EXPOSUR	3.521.320,00	3.309.643,00	0,00	0,00%		
1			HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	0,00	32.378.711,88	4.676.875,26	14,44%		
		40 0000 051	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	0,00	32.378.711,88	4.676.875,26	14,44%		
9			GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION CERCADO	5.555.003,00	5.991.003,00	842.060,01	14,06%		
1		10 0000 083	PREVENSION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES CERCADO	900.000,00	900.000,00	71.220,26	7,91%		
2		12 0000 078	APOYO Y PROMOCION DE FERIAS AGROPECUARIAS PRODUCTIVAS PROVINCIA CERCADO	396.900,00	396.900,00	44.771,61	11,28%		
3		12 0000 081	PLAN DE EMPLEO URGENTE (MATERIALES)	360.000,00	360.000,00	175.322,76	48,70%		
4		13 0000 085	PLATAFORMA DE SERVICIOS EMPRESARIALES CERCADO	749.758,00	849.758,00	110.473,30	13,00%		
5		18 0000 085	COMUNIDAD SEGURA CERCADO	643.500,00	643.500,00	145.200,12	22,56%		
6		19 0000 080	SEMBRANDO VALORES CERCADO	478.422,00	495.422,00	49.455,40	9,98%		
7		23 0000 082	FOMENTO Y PROMOCION AL TURISMO Y CULTURA PROV CERCADO	750.420,00	892.420,00	72.962,00	8,18%		
8		40 0000 070	POR UNA SONRISA CERCADO	776.003,00	946.003,00	104.759,58	11,07%		
9		44 0000 043	APOYO Y MASIFICACION AL DEPORTE CERCADO	500.000,00	507.000,00	67.894,98	13,39%		
9			GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PADCAYA	1.902.917,00	2.646.549,00	330.529,98	12,49%		
1		10 0000 082	PLAN DE PREVENSION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES PADCAYA	139.277,00	139.277,00	20.038,00	14,39%		
2		12 0000 070	APOYO Y PROMOCION A LA PRODUCCION Y CULTURA 1ª SECCION PROVINCIA ARCE	331.594,00	331.594,00	162.478,98	49,00%		
3		12 0000 081	PLAN DE EMPLEO URGENTE (MATERIALES)	200.000,00	200.000,00	60.917,00	30,46%		
4		13 0000 071	FORTALEC. Y PROMOCION A LA CULTURA EN EL DPTO. DE TARIJA	31.500,00	31.500,00	9.500,00	30,16%		
5		13 0000 090	PROMOCION A LA CULTURA ARTISTICA 1ª SECCION PROVINCIA ARCE	391.786,00	465.018,00	19.827,00	4,26%		
6		40 0000 090	PROGRAMA BOCA SANITA	391.405,00	493.405,00	28.519,00	5,78%		
7		42 0000 084	FORTALECIMIENTO A LA EQUIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	417.355,00	485.755,00	3.915,00	0,81%		
8		44 0000 041	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	0,00	250.000,00	0,00	0,00%		
9		44 0000 071	FORTALECIMIENTO AL DEPORTE 1RA SECCION PADCAYA	0,00	250.000,00	25.335,00	10,13%		
10			GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION MENDEZ	1.499.411,00	2.229.846,00	682.749,98	30,62%		
1		10 0000 078	PREVENSION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES SAN LORENZO	180.000,00	180.000,00	62.551,91	34,75%		
2		12 0000 081	PLAN DE EMPLEO URGENTE (MATERIALES)	180.000,00	180.000,00	6.420,90	3,57%		
3		13 0000 071	FORTALEC. Y PROMOCION A LA CULTURA EN EL DPTO. DE TARIJA	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00%		
4		23 0000 074	APOYO Y PROMOCION A FERAS PRODUCTIVAS 1 SECCION MENDEZ	177.300,00	177.300,00	70.489,80	39,76%		
5		23 0000 081	PROGRAMA CULTURAL DE SAN LORENZO	429.111,00	452.711,00	153.357,36	33,88%		
6		24 0000 077	PROGRAMA CAPACITACION A INICIATIVAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO EN SAN LORENZO	90.000,00	90.000,00	25.200,00	28,00%		
7		24 0000 078	FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO SECC. SAN LORENZO	90.000,00	90.000,00	23.173,00	25,75%		
8		24 0000 079	PROGRAMA NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y JOVENES EN ACCION PARA MEJORAR NUESTRO DESARROLLO PERSONAL	121.500,00	123.900,00	17.900,00	14,45%		
9		42 0000 083	PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO SAN LORENZO	200.000,00	226.085,00	53.112,34	23,49%		
10		44 0000 041	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	0,00	678.350,00	270.544,67	39,88%		
6			GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PROVINCIA AVILES	1.030.225,00	1.414.725,00	608.600,00	43,02%		
1		12 0000 079	APOYO Y PROMOCION A LAS FERIAS AGROPECUARIAS PROVINCIA AVILES	158.225,00	168.225,00	138.885,00	82,56%		
2		12 0000 081	PLAN DE EMPLEO URGENTE (MATERIALES)	270.000,00	270.000,00	117.321,00	43,45%		
3		13 0000 071	FORTALEC. Y PROMOCION A LA CULTURA EN EL DPTO. DE TARIJA	162.000,00	152.000,00	55.067,00	36,23%		
4		13 0000 087	PROGRAMA DE FESTIVIDAD DE LA VENDIMIA	260.000,00	244.500,00	222.295,00	90,92%		
5		24 0000 080	CONTROL Y PREV. DE DESASTRES NATURALES 1ª SECC. PROV. AVILES	180.000,00	180.000,00	18.580,00	10,32%		
6		44 0000 041	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	0,00	400.000,00	56.452,00	14,11%		
5			GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION O'CONNOR	605.650,00	1.153.650,00	363.781,15	31,53%		
1		10.00.76	PLAN DE PREVENSION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES PROVINCIA O'CONNOR	88.150,00	88.150,00	19.800,00	22,46%		
2		12.00.81	PLAN DE EMPLEO URGENTE (MATERIALES)	270.000,00	270.000,00	61.250,00	22,69%		

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
3		13.00.71	FORTALEC. Y PROMOCION A LA CULTURA EN EL DPTO. DE TARIJA	211.500,00	211.500,00	56.847,00	26,88%		
4		13.00.88	APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%		
5		44.00.41	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	0,00	548.000,00	189.884,15	34,65%		

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
			E.- PREVISIONES FINANCIERAS	176.556.555,00	217.206.174,27	17.274.921,77	7,95%		
			SECRETARIA EJECUTIVA DEPARTAMENTAL	132.556.555,00	181.102.765,27	11.500.000,00	6,35%		
		5,1,1	PREVISIONES FINANCIERAS (Acciones y Participaciones de Capital en Empresas) SETAR	14.798.735,00	14.798.735,00	0,00	0,00%		
		5,1,3,10	PREVISIONES FINANCIERAS (Del Gobierno Autónomo Departamental) EMTAGAS	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00%		
			PREVISIONES FINANCIERAS (Incremento de Caja y Bancos)	90.627.503,00	7.756.331,27	0,00	0,00%		
			PREVISIONES FINANCIERAS (Provisiones para Gastos de Capital)	0,00	98.039.607,00	0,00	0,00%		
			TITULO DE BACHILLER MIN EDUCACION	804.531,00	804.531,00	0,00	0,00%		
			PREVISIONES TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES	13.644.020,00	6.500.020,00	0,00	0,00%		
			PREVISIONES SEDER TARIJA	1.181.766,00	0,00	0,00	0,00%		
			PROVISIONES PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	0,00	41.703.541,00	0,00	0,00%		
			GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION GRAN CHACO YACUIBA	13.000.000,00	13.000.000,00	4.777.975,77	36,75%		
		5,1,1	PREVISIONES FINANCIERAS (Acciones y Participaciones de Capital en Empresas) SETAR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%		
		5,1,3,10	PREVISIONES FINANCIERAS (Del Gobierno Autónomo Departamental) EMTAGAS	10.000.000,00	10.000.000,00	4.777.975,77	47,78%		
			GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PROVINCIA GRAN CHACO CARAPARI	15.000.000,00	7.103.409,00	0,00	0,00%		
		5,1,3,10	PREVISIONES FINANCIERAS (Del Gobierno Autónomo Departamental) EMTAGAS	15.000.000,00	7.103.409,00	0,00	0,00%		
			GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL 3ª SECCION GRAN CHACO VILLAMONTES	16.000.000,00	16.000.000,00	996.946,00	6,23%		
		5,1,1,	PREVISIONES FINANCIERAS (Acciones y Participaciones de Capital en Empresas) SETAR	6.000.000,00	6.000.000,00	996.946,00	16,62%		
		5,1,3,10	PREVISIONES FINANCIERAS (Del Gobierno Autónomo Departamental) EMTAGAS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%		

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
			F.- SERVICIO DE DEUDA	45.139.214,00	45.215.214,00	18.311.710,93	40,50%		
			ADMINISTRACION CENTRAL	45.139.214,00	43.731.578,00	17.999.991,66	41,16%		
			DEUDA RECURRENTE Y COMERCIAL (ADM CENTRAL)	3.139.000,00	2.288.530,00	1.119.153,29	48,90%		
		6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios personales (ADM CENTRAL)	299.000,00	275.000,00	53.543,96	19,47%		
		6.6.2	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers. (ADM CENTRAL)	2.135.000,00	1.738.530,00	965.641,54	55,54%		
		6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones (ADM CENTRAL)	530.000,00	100.000,00	99.967,79	99,97%		
		6.6.9	Otros Gastos No Pagados (ADM CENTRAL)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%		
		6.6.2	Gastos Devengados No Pagados por Servicios personales (ADM CENTRAL)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%		
			Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers. (ADM CENTRAL)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%		
			DEUDA INTERNA (ADM CENTRAL)	5.775.799,00	5.775.799,00	885.180,68	15,33%		
		6.1.2	Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	532.883,00	1.226.398,00	350.608,89	28,59%		
		6.1.6	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo plazo	1.032.339,00	1.032.339,00	0,00	0,00%		
		6.1.7	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	693.515,00	0,00	0,00	0,00%		
		6.7.1	Obligaciones por Afectaciones al Tesoro General	3.517.062,00	3.517.062,00	19.760,91	0,56%		
			DEUDA EXTERNA (ADM CENTRAL)	28.263.115,00	28.263.115,00	13.484.915,36	47,71%		
		6.2.1	Amortización de la Deuda Pública Externa a Corto plazo	24.527.828,00	24.527.828,00	11.517.307,92	46,96%		
		6.2.2	Intereses de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	3.732.046,00	3.732.046,00	1.967.607,44	52,72%		
		6.2.3	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	3.241,00	3.241,00	0,00	0,00%		
			DEUDA DE CAPITAL (ADM CENTRAL)	7.961.300,00	7.404.134,00	2.510.742,33	33,91%		
			Gastos Devengados No Pagados por Servicios	170.000,00	110.000,00	2.000,00	1,82%		
		6.6.2	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.	1.814.397,00	2.448.734,00	2.448.674,72	100,00%		
		6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	675.000,00	50.000,00	46.219,41	92,44%		
		6.6.9	Otros Gastos No Pagados	548.903,00	42.400,00	0,00	0,00%		
		6.6.2	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%		
		6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	20.000,00	20.000,00	12.728,21	63,64%		
		6.6.2	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%		
		6.6.9	Gastos Devengados No Pagados por Servicios	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%		
		6.6.2	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.	4.049.000,00	4.049.000,00	0,00	0,00%		
		6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	124.000,00	124.000,00	1.119,99	0,90%		
		6.6.9	Otros Gastos No Pagados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%		
			GOBIERNO AUTONOMO DPTAL. SECCION GRAN CHACO YACUIBA	0,00	359.500,00	0,00	0,00%		
			DEUDA RECURRENTE Y COMERCIAL (YACUIBA)	0,00	54.500,00	0,00	0,00%		
		6.6.2	Gastos Devengados No Pagados por Servicios personales	0,00	12.000,00	0,00	0,00%		
		6.6.2	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.	0,00	25.000,00	0,00	0,00%		
		6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	17.500,00	0,00	0,00%		
			DEUDA DE CAPITAL (YACUIBA)	0,00	305.000,00	0,00	0,00%		
		6.6.9	Gastos Devengados No Pagados por Servicios	0,00	25.000,00	0,00	0,00%		
		6.6.9	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.	0,00	75.000,00	0,00	0,00%		
		6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	205.000,00	0,00	0,00%		
			GOBIERNO AUTONOMO DPTAL. 2° SEC. GRAN CHACO CARAPARI	0,00	431.666,00	0,00	0,00%		
			DEUDA RECURRENTE Y COMERCIAL (CARAPARI)	0,00	105.000,00	0,00	0,00%		
		6.6.2	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.	0,00	105.000,00	0,00	0,00%		
			DEUDA DE CAPITAL (CARAPARI)	0,00	326.666,00	0,00	0,00%		
		6.6.2	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.	0,00	27.763,00	0,00	0,00%		
		6.6.9	Otros Gastos No Pagados	0,00	298.903,00	0,00	0,00%		
			GOBIERNO AUTONOMO DPTAL. 2° SEC. PROVINCIA ARCE BERMEJO	0,00	110.000,00	108.000,00	98,18%		

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

N° DE PROY.	COD SISIN	CAT PROG.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)	PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (30/06/13) (Bs.)	EJECUCION FINANCIERA (30/06/13) (Bs.)	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA	ESTADO
			DEUDA DE CAPITAL	0,00	110.000,00	108.000,00	98,18%		
			Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.	0,00	110.000,00	108.000,00	98,18%		
			GOBIERNO AUTONOMO DPTAL. 3º SEC. GRAN CHACO VILLAMONTES	0,00	479.500,00	168.521,50	35,15%		
			DEUDA RECURRENTE Y COMERCIAL (VILLAMONTES)	0,00	79.500,00	833,00	1,05%		
		6.6.9	Gastos Devengados No Pagados por Servicios personales	0,00	12.000,00	0,00	0,00%		
		6.6.9	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.	0,00	55.000,00	0,00	0,00%		
		6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	12.500,00	833,00	6,66%		
			DEUDA DE CAPITAL (VILLAMONTES)	0,00	400.000,00	167.688,50	41,92%		
		6.6.9	Gastos Devengados No Pagados por Servicios	0,00	35.000,00	0,00	0,00%		
		6.6.9	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.	0,00	345.000,00	164.455,41	47,67%		
		6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	20.000,00	3.233,09	16,17%		
			PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT.	0,00	16.000,00	10.701,46	66,88%		
			DEUDA RECURRENTE Y COMERCIAL (PERTT)	0,00	16.000,00	10.701,46	66,88%		
		6.6.9	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No	0,00	16.000,00	10.701,46	66,88%		
			SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	0,00	60.000,00	0,00	0,00%		
			DEUDA RECURRENTE Y COMERCIAL (SEDEDE)	0,00	60.000,00	0,00	0,00%		
			Gastos Devengados No Pagados por Servicios No	0,00	60.000,00	0,00	0,00%		
			GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION CERCADO	0,00	26.970,00	24.496,31	90,83%		
			DEUDA RECURRENTE Y COMERCIAL (CERCADO)	0,00	26.970,00	24.496,31	90,83%		
			Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.	0,00	26.857,00	24.383,31	90,79%		
			Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	113,00	113,00	100,00%		
TOTAL				4.129.915.381,00	4.362.433.094,00	1.126.769.488,42	25,83%		
